

AGENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE  
PROTECCIÓN AL MEDIOAMBIENTE DEL  
SECTOR HIDROCARBUROS  
UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS  
INDUSTRIALES

06030 5/03/21

ASUNTO: PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO  
INFORME SEMESTRAL DE ACUERDO CON EL  
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL  
PROYECTO IGASAMEX SAN JOSE ITURBIDE  
(OXICA)




CURR: ASEA-IAS17096C

TÍTULO DE PERMISO: G/21297/TRA/2018

AUTORIZACION: ASEA-IAS17096C/BDO218

José Eduardo Estrada Ibarra, en mi carácter de apoderado legal de la empresa IGASAMEX SAN JOSE ITURBIDE (OXICA), S.A. DE C.V. Personalidad que tengo debidamente acreditada, en términos del instrumento notarial 94,531, de fecha 12 de marzo del 2020, otorgada ante la fe del Licenciado Marco Antonio Ruiz Aguirre, titular de la notaria 229 de la Ciudad de México, señalando como

Domicilio, teléfono, correo electrónico del representante legal. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP



respetuosamente comparezco y expongo:

Por medio del presente escrito, con fundamento en los artículos 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican, Artículo 29 fracción I. Fecha de publicación en Diario Oficial de la Federación (DOF): 2016-05-13. Fecha de entrada en vigor: 2016-05-14; así como lo establecido en los artículos 15, 15-A, 17-A, 49, 50 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en este acto vengo a hacer las siguientes manifestaciones:

## I. ANTECEDENTES.

**PRIMERO.** – Que en fecha 13 de mayo de 2016, esta H. Agencia publicó en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican (DACG). La citada DACG establece que:

“... ”

**Artículo 27.** *A partir del inicio de las actividades propias del Proyecto, el Regulado quedará obligado a la Implementación de su Sistema de Administración, con base en el Programa de Implementación presentado a la Agencia y a entregar los documentos a los que se refiere el Apartado B del Anexo IV de los presentes lineamientos, en los tiempos señalados.*

**Artículo 28.** *El Regulado deberá cumplir de manera permanente, durante todas las Etapas de Desarrollo del Proyecto, incluyendo*

*desmantelamiento y abandono, con las acciones definidas en el Anexo III, de los presentes lineamientos.*

**Artículo 29.** *A partir del inicio de operaciones de cada Proyecto, el Regulado deberá presentar a la Agencia los siguientes documentos:*

- I. Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación. (...)*

**SEGUNDO.** - El **15 de mayo del 2017**, esta H. Agencia asignó a mi mandante la Clave Única de Registro de Regulado (CURR) **ASEA-IAS17096C** y, el **18** del mismo mes y anualidad, entregó la Constancia de Registro de la Conformación de su Sistema de Administración.

**TERCERO.** – En escrito de fecha 29 de noviembre del 2018 esta H. Agencia, notifico a mi mandante el oficio de la referencia, a través del cual fue autorizado su

Domicilio, teléfono, correo electrónico del representante legal. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

**Término Quinto**, parte conducente, que:

***“... A partir de notificado el presente resolutivo del PROYECTO, y de conformidad con el artículo 29 de los LINEAMIENTOS, el REGULADO deberá presentar a la AGENCIA los siguientes documentos:***

- I. Informes semestrales de cumplimiento del programa de implementación autorizado (...)***

La presentación de los informes de y/o reportes de seguimiento señalados en las fracciones que anteceden, deberán sujetarse por lo previsto por los Trámites: **ASEA-00-026 Informes semestrales de cumplimiento al Programa de implementación del Sistema de Administración, ...”**


Por lo anteriormente expuesto y fundado mi mandante en este acto presenta:


**II. INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN AUTORIZADO.**


En atención a las obligaciones señaladas anteriormente, se acude ante esa H. Agencia a presentar el **SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN AUTORIZADO (Anexo A)**, el cual se exhibe en carpeta física y, electrónica contenida en CD o USB, en términos de lo siguiente:

Actividad	Información relacionada	Ruta de ubicación de la información que se presenta para el informe semestral	Entregable
<b>ANEXO IV APARTADO B</b>			
Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP			


Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP







Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

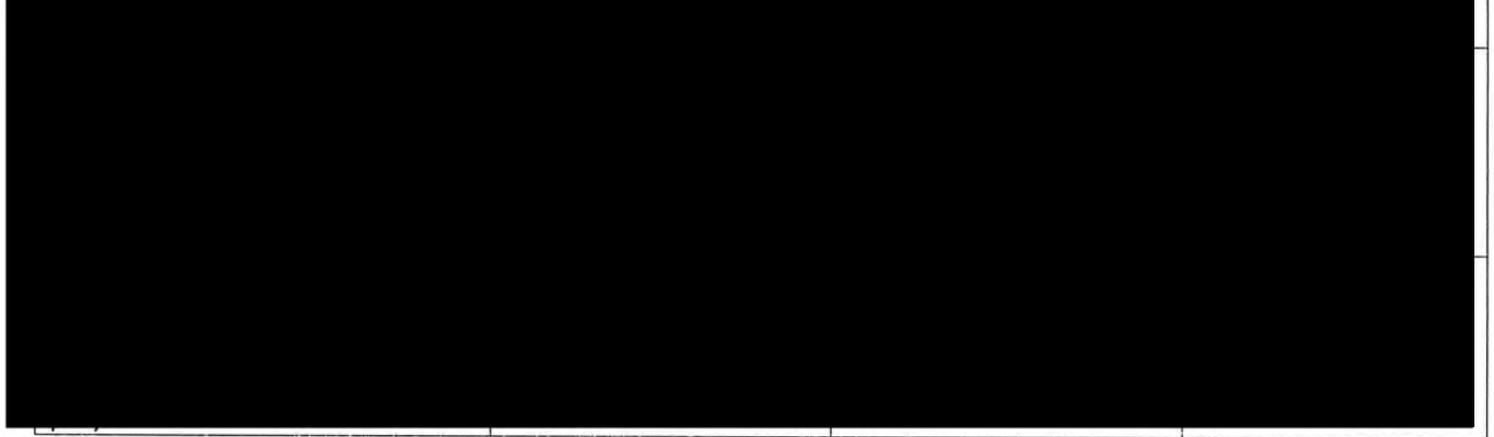


Actividades	Información relacionada	Ruta de ubicación de la información que se presenta para el informe semestral	Entregable
-------------	-------------------------	---	------------


**ANEXO IV APARTADO B**

**2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS**


Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

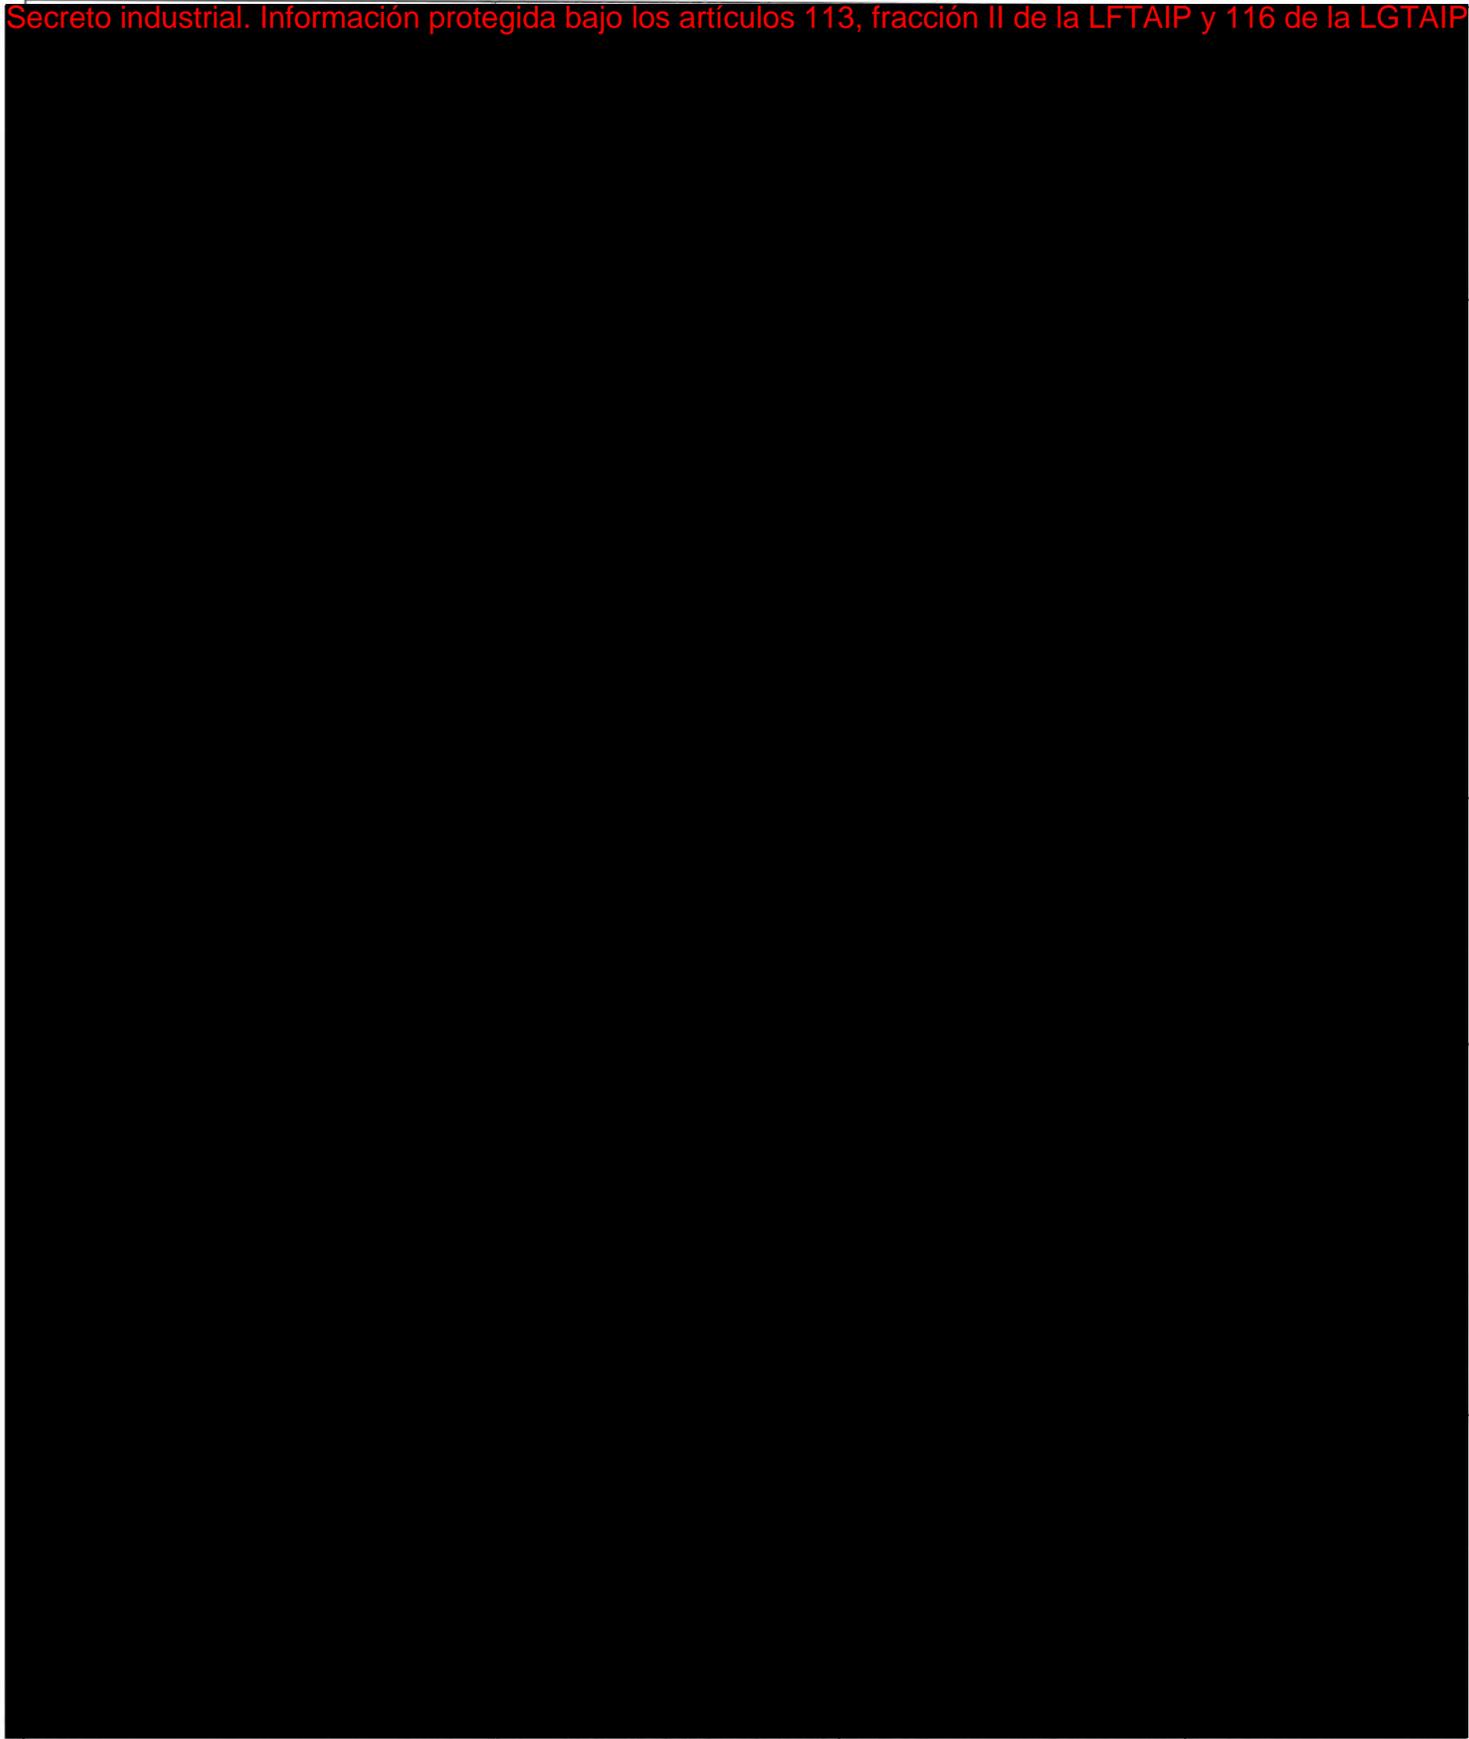


Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

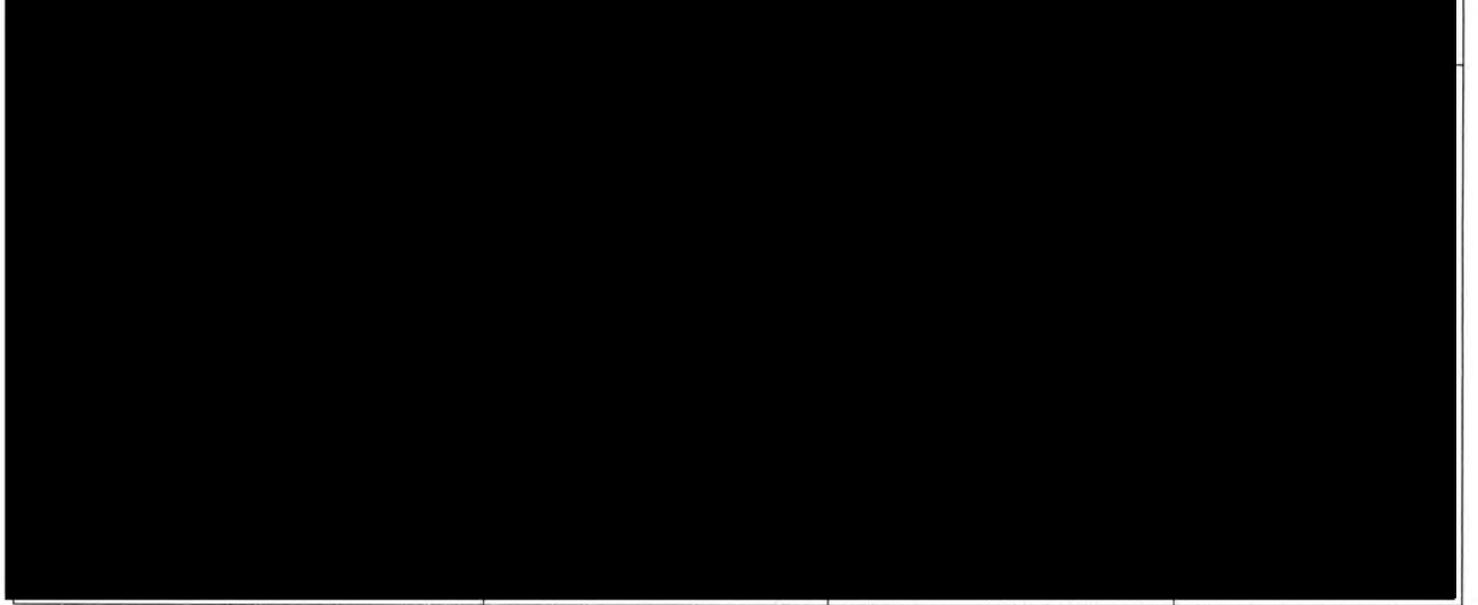


Actividades	Información relacionada	Ruta de ubicación de la información que se presenta para el informe semestral	Entregable
<b>ANEXO IV APARTADO B</b>			
<b>3. REQUISITOS LEGALES</b>			


Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




Actividades	Información relacionada	Ruta de ubicación de la información que se presenta para el informe semestral:	Entregable
-------------	-------------------------	--	------------


**ANEXO IV APARTADO B**

**4. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES**

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




Actividades	Información relacionada	Ruta de ubicación de la información que se presenta para el informe semestral:	Entregable
-------------	-------------------------	--	------------

**ANEXO IV APARTADO B**

**5. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD**

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




Requisito	Información relacionada	Ruta de ubicación de la información que se presenta para el informe semestral	Entregable
-----------	-------------------------	---	------------

**ANEXO IV APARTADO B**

**6. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO**

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




**6. PROGRAMAS DE IMPLEMENTACIÓN/ COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO /ANEXO III**

Actividades	Información relacionada	Ruta de ubicación de la información que se presenta para el informe semestral	Entregable
-------------	-------------------------	---	------------

**ANEXO IV APARTADO B**

**7. COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA**

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S de R.L de C.V.

Proveído: Crea

Nombre de persona física: Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIIP y 116 de la LGTAIP



Clave del documento: FSIG-PI-01- Programas de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de Julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de Julio de 2020

**Nota:** Éste Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño												Construcción												Operación y Mantenimiento																																																																															
Período de Implementación	1																								2																																																																															
Año	2018												2019												2020																																																																															
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																																																																							
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	Duración de la actividad (Semanas)	% Avance
I. POLITICA	1					
	2					
	3					
Implementar la política del Sistema en materia de SISOPA.	4					
	5					
	6					
	7					

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIIP y 116 de la LGTAIP

Handwritten signatures and initials.

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S de R.L de C.V.

Proyecto: **OCIA**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Clave del documento: FSIG-IP1-01-Programas de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de Julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de Julio de 2020

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																																																				
Periodo de Implementación	1												2																																																																						
Año	2018												2019												2020																																																										
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																																																			
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	Duración de la actividad (Semanas)	% Avance
I. POLITICA						
	8					
Asegurar que los contratistas, subcontratistas y proveedores cumplan con su política de Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio ambiente, siempre que la ejecución de sus actividades implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente.	9					
	10					
	11					
	12					
Asegurar que la política del Regulado se encuentre disponible a las partes interesadas.	13					
	14					
	15					

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S de R.L de C.V.

Proyecto: **Orde**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: FSIG-PI-01- Programas de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de Julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de Julio de 2020

**Nota:** Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																	
Período de Implementación	1												2																																							
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	Duración de la actividad (Semanas)	% Avance
I. POLITICA						

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: FSIG-IP1-01- Programas de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de Julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de Julio de 2020

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																																																																									
	1												2																																																																																											
Periodo de Implementación	2018												2019												2020																																																																															
Año	2018												2019												2020																																																																															
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																																																																															
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGO	1	Realizar el análisis de riesgo de la etapa del diseño conceptual:			
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

*[Handwritten signature]*

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Ova

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: FSIG-IPI-01- Programas de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de Julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de Julio de 2020

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de Implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño												Construcción												Operación y Mantenimiento																											
	1												2																																							
Periodo de Implementación	2018												2019												2020																											
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
<b>II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGO</b>					
afectadas. d) Incidentes pasados, accidentes, daños a la salud y al ambiente, daños a la infraestructura, equipo y condiciones físicas del lugar de trabajo	18	Realizar			
	19				
	20				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: FSIG-IPI-01- Programas de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de Julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de Julio de 2020

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																	
Periodo de Implementación	1												2																																							
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																											
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
<b>II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGO</b>  Realizar el análisis de riesgo de la Etapa de Operación y Mantenimiento.	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: FSIQ-IP1-01- Programas de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de Julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de Julio de 2020

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Éste Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de Inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																					
Periodo de Implementación	1																												2																											
Año	2018														2019														2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																			
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				

REQUISITOS	No.
II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGO	

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

[Redacted Content]																											
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oxia

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: FSIG-IP1-01- Programas de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de Julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de Julio de 2020

Secretos industriales. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño												Construcción												Operación y Mantenimiento																											
	1												2																																							
Periodo de implementación	2018												2019												2020																											
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																											
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
III. REQUISITOS LEGALES					
	1				
	2				
Implementar el mecanismo PSI-IGA-12 Identificación y acceso a requisitos legales, para la identificación, acceso y actualización de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables, asociados a los riesgos, aspectos e impactos ambientales aplicables a las actividades del proyecto.	3				
	4				
	5				
	6				

Secretos industriales. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

*[Handwritten signatures and initials]*

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oxica

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: FSTG-IPP-01-Programas de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de Julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de Julio de 2020

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de Inicio y término del programa de Implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño																	Construcción																	Operación y Mantenimiento																																																																					
	1																	2																																																																																						
	2018																	2019																	2020																																																																					
	Año																																																																																																							
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																																																																															
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance	[Redacted]																																																			
III. REQUISITOS LEGALES	7					[Redacted]																																																			
	8					[Redacted]																																																			
	9					[Redacted]																																																			
	10					[Redacted]																																																			
	11					[Redacted]																																																			
	12					[Redacted]																																																			
	13					[Redacted]																																																			
	14					[Redacted]																																																			
	15					[Redacted]																																																			
	16					[Redacted]																																																			
	17					[Redacted]																																																			
	18					[Redacted]																																																			

Considerar los permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites que correspondan a las actividades reguladas y otros requisitos a los que se encuentren suscritos, corporativos, de asociaciones y clientes y las que apliquen en las diferentes etapas del proyecto.

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oxica

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIS-PP-01-Programas de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de Julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de Julio de 2020

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de Implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño																	Construcción																	Operación y Mantenimiento																											
	Periodo de Implementación																																																													
	1																	2																																												
	2018																	2019																	2020																											
Año	2018																	2019																	2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																																					
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29										

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
III. REQUISITOS LEGALES	19	Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oxica

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: P-018-18-1-Programas de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de Julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de Julio de 2020

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño																	Construcción																	Operación y Mantenimiento																																																																					
	1																	2																																																																																						
Año	2018																	2019																	2020																																																																					
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																																																																															
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
III. REQUISITOS LEGALES	20				
	21				
	22				
	23				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oxica

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PP-01-Programas de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de Julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de Julio de 2020

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

**Nota:** Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																				
	1												2																																						
Periodo de Implementación	2018												2019														2020																								
Año	2018												2019														2020																								
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																										
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
III. REQUISITOS LEGALES					

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S de R.L de C.V.

Proyecto: Oxián

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Fecha de inicio de implementación: 23 de Julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de Julio de 2020

Nota: Éste Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASE-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño												Construcción												Operación y Mantenimiento																																																																				
	1												2												3																																																																				
Periodo de Implementación	2018												2019												2020																																																																				
Año	2018												2019												2020																																																																				
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																																								
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance	[Grid for weekly progress tracking]																																			
<b>IV. METAS, OBJETIVOS E INDICACIONES</b>  Establecer metas, objetivos e indicadores consistentes con la política Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, conforme a los requerimientos legales aplicables y otros requerimientos suscritos por la organización, así como los resultados de la evaluación de los Aspectos Ambientales y riesgos.	1	[Redacted]																																							
	2	[Redacted]																																							
	3	[Redacted]																																							
	4	[Redacted]																																							
	5	[Redacted]																																							

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S de R.L de C.V.

Proyecto: Oxicla

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: FSIQ-IP1-01- Programas de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de Julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de Julio de 2020

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Éste Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																							
Periodo de implementación	1												2																									
Año	2018												2019												2020													
Mes	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul							
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7							

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance	[Grid for weekly progress tracking]																																			
IV. METAS, OBJETIVOS E INDICACIONES	6	[Redacted content]																																							
	7	[Redacted content]																																							

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																															
Periodo de Implementación	1												2																																																	
Año	2018												2019												2020																																					
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																																					
Semana	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
<b>V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD</b>  Establecer las funciones, responsabilidades y el ámbito de autoridad y ámbito de competencia para la implementación, evaluación, mejora y operación del Sistema de Administración, del cumplimiento de su política y objetivos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente y de sus resultados en cada uno de los puestos de trabajo y niveles jerárquicos de su organización, incluyendo contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																																																																											
Periodo de Implementación	1												2																																																																																													
Año	2018												2019												2020																																																																																	
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																																																																																	
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD	10				
	11				
Promover que el personal de la organización, así como el personal de los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio, cumpla con los aspectos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente considerados en los códigos de comportamiento y ética de la organización.	12				
	13				
	14				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

*[Handwritten signature]*

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Note: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-1AS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de Implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																	
Periodo de Implementación	1												2																																							
Año	2018						2019						2020																																							
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																											
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.
V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD	

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de las DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																	
Periodo de Implementación	1												2																																							
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
VI. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	1				
	2				
	3				
	4				

Asegurar la competencia del personal propio, así como la del personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, siempre que la ejecución de sus actividades implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente, en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto, con base en el puesto y sus necesidades de conocimiento, capacitación, certificación y experiencia necesarias.

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de las DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.  
 Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																	
Periodo de Implementación	1												2																																							
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
VI. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	5				
	6				
	7				
	8				
	9				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
Periodo de Implementación	1												2																																							
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																											
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
<b>VII. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA</b>					
Comunicar y difundir en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, considerando los diferentes niveles y funciones de la organización y a contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores los resultados de la operación del Sistema de Administración.					
Comunicar al interior de la organización: a) La política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente; b) Las funciones, responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas a todo el personal de la organización, de contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio. c) Los riesgos propios del Proyecto; d) Los Aspectos Ambientales significativos; e) Los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables al Proyecto; f) El cumplimiento de objetivos y metas; g) Los resultados de las auditorías Internas y externas; h) Los resultados de la evaluación del desempeño sobre la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente. i) La revisión de resultados y las acciones que se deriven de ésta.	1				
Fomentar la participación y consulta de los trabajadores en el Sistema de Administración en todos sus niveles y funciones, incluyendo contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio. Promover la participación y consulta del personal, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores: a) En el reporte efectivo de los actos y condiciones inseguras de trabajo. b) En la identificación y evaluación de riesgos y Aspectos Ambientales. c) En la Investigación de incidentes y accidentes. d) En la Comisión de seguridad e higiene. e) En la selección y uso de equipo de protección personal (EPP). f) En otras actividades y decisiones.	2				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

*[Handwritten signatures and initials]*

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño												Construcción												Operación y Mantenimiento																																																										
	1												2																																																																						
Periodo de Implementación	2018												2019												2020																																																										
Año	2018												2019												2020																																																										
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																																																										
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
VII. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA					
Dar atención, respuesta y seguimiento a inquietudes, necesidades de información, quejas y sugerencias, tanto internas como externas, relacionadas con el Sistema de Administración a su cargo.	3				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
1														2																																					
2018												2019												2020																											
Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																											
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
VIII. Control de documentos y registros	1				
Gestionar los documentos del Sistema de Administración, así como aquellos documentos para actividades de riesgo para controlarlos y protegerlos desde su emisión hasta su distribución, incluyendo el acceso, control de cambios y prevención del uso no intencionado. Asimismo, debe considerar los registros como documentos y asegurar su permanencia en México.	2				
	3				
	4				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de Inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Diseño												Construcción												Operación y Mantenimiento																																																																															
												1												2																																																																															
2018												2019												2020																																																																															
Diciembre			Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio																															
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
VIII. Control de documentos y registros					

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de Implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
Periodo de Implementación	1												2																																							
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES	1				
	2				
	3				
	4				
	5				

Diseñar, construir, operar, mantener e inspeccionar las instalaciones, procesos, sistemas de seguridad y todo aquello relativo al proyecto, utilizando normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y generalmente aceptadas a nivel internacional; incluyendo regulación o buenas prácticas de Ingeniería escritas y aplicadas, provenientes de otros países, institutos, asociaciones o empresas.

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de Implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
	Período de Implementación												1												2																											
	2018												2019												2020																											
	Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																			
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES	6				
Asegurar que el equipo y los instrumentos, así como las refacciones y partes de repuesto que se utilizarán durante la ejecución del proyecto serán diseñados, fabricados, mantenidos, probados e inspeccionados, cuando se requiera, con base en normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y aceptadas a nivel internacional. Lo anterior, puede incluir regulación o buenas prácticas escritas y aplicadas provenientes de otros países, institutos, asociaciones o empresas.	7				
	8				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
	Periodo de Implementación												2																																							
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
<b>IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES</b>					
Integrar, conservar y mantener actualizado un paquete de información de la tecnología y la seguridad relativa al Proyecto. Este debe contener, sin ser limitativo:	9				
a) La información de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente de los materiales peligrosos manejados en el Proyecto en todas sus Etapas de Desarrollo (materia prima, productos, subproductos, residuos, materiales auxiliares en la operación, materiales del mantenimiento y la inspección, catalizadores u otros).					
b) La información relativa al proceso y su filosofía de operación como son, de manera enunciativa, mas no limitativa: diagramas de flujo de proceso, diagramas de tubería e instrumentación, química del proceso, inventarios máximos previstos, variables del proceso y sus límites seguros de operación y balances de materia y energía.	10				
c) La información relacionada con el equipo como son, de manera enunciativa, mas no limitativa: materiales de construcción, diagramas de tubería e instrumentación, diagramas de flujo de proceso, la ingeniería de detalle del sistema contra incendio, planos de clasificación eléctrica, planos estructurales, bases de diseño de los equipos, bases de diseño de equipos de relevo de presión, bases de diseño de sistemas de desfogue y quemadores, bases de diseño de sistemas instrumentados de seguridad, entre otros.	11				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
	Período de Implementación 1												2																																							
	2018												2019												2020																											
	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
------------	-----	----------------	------------	--------------	----------

**Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP**

IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción																								Operación y Mantenimiento																									
Período de Implementación	1																								2																											
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS	1				
	2	Ejecutar las actividades de Seguridad Industrial, Operativa y de protección al medio ambiente en la construcción, situaciones de arranque inicial, operaciones normales, temporales, paros programados y no programados, arranques, mantenimiento, inspecciones y pruebas, entre otras propias del proyecto con base en documentos escritos y prácticas seguras de trabajo documentadas, considerando los resultados del proceso de evaluación de impactos y riesgos y tomando en consideración los requisitos legales aplicables.			
	3				
	4				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
	Período de Implementación 1												Período de Implementación 2																																							
	2018												2019												2020																											
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				

Los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores que participan o ejecutan actividades de alto riesgo, conocerán y ejecutarán los procedimientos de la organización u homoiogarán los suyos con los de la misma para practicarios de la igual manera, cuando la ejecución de sus actividades impliquen un riesgo para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente.



# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
	Período de Implementación 1												Período de Implementación 2																																							
	2018												2019												2020																											
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
------------	-----	----------------	------------	--------------	----------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

<p><b>X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS</b></p>					
	12				
Ejecutar los análisis de seguridad de los trabajos. El análisis debe ejecutarse tanto por el personal interno como por los contratistas subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en la planeación, programación y ejecución de los trabajos, utilizando un proceso homologado.					
	13				
	14				
	15				
Administrar, documentar y comunicar cambios temporales o definitivos, exceptuando reemplazos equivalentes, en las sustancias peligrosas, variables del proceso, tecnología, instalaciones y equipo, procedimientos organizacionales y de personal (incluyendo contratistas) considerando el fundamento técnico del cambio, los impactos en Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio ambiente, modificaciones a procedimientos, periodo de tiempo necesario para el cambio y requisitos para su autorización, considerando actualizaciones necesarias en la documentación de la información del proceso y la capacitación del personal.					
	16				



# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																	
Periodo de Implementación	1												2																																							
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS	18				
	19				
	20	Ejecutar la verificación de SISOPA, previo al arranque de instalaciones nuevas o de instalaciones con reparaciones o modificaciones mayores, considerando la verificación del cumplimiento de las especificaciones de diseño, la actualización de y comunicación de los procedimientos de seguridad, operación, mantenimiento y emergencia, la capacitación necesaria del personal, el cierre de recomendaciones del análisis de riesgos de proceso así como el cierre de la administración de cambios.			
	21				
	22				
	23	Establecer en función de los riesgos de las actividades de construcción, operación, mantenimiento o inspección, la periodicidad con la que se requiere revisar los documentos para garantizar su actualización y correspondencia con la ejecución de las actividades, tecnología, equipos, instrumentación, herramientas, riesgos y controles.			
	24				
	25				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción																								Operación y Mantenimiento																											
Período de Implementación	1																								2																													
Año	2018												2019												2020																													
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																						
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
<b>X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS</b>					
Motivar y promover que el personal, incluyendo contratistas, subcontratistas, proveedores de servicios y proveedores reporten actos y condiciones inseguras y detengan trabajos u operaciones, cuando sean testigos o involucrados en riesgos inminentes de accidentes o incidentes.	26				
Registrar, atender y cerrar recomendaciones por actos y condiciones inseguras reportadas, trabajos u operaciones detenidas por riesgos de incidentes o accidentes	27				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

*[Handwritten signatures and initials]*

# Programa de Implementación

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Note: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de Implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																	
Periodo de Implementación	1												2																																							
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
------------	-----	----------------	------------	--------------	----------

**Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP**

X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																				
	Periodo de Implementación 1												2																																						
	2018												2019												2020																										
Año	2018												2019												2020																										
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																			
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
------------	-----	----------------	------------	--------------	----------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.  Mantener la integridad mecánica de los activos y el aseguramiento de la calidad de equipos de proceso, instalados o nuevos, sus relaciones y partes de repuesto, en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto y desde sus especificaciones de diseño, compra, fabricación, transporte, almacenamiento e instalación.	1				
	2				
	3				
	4				
	5				

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																				
	Período de Implementación 1												2																																						
	2018												2019												2020																										
	Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																		
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.	6				
	7				
Establecer mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñados, construidos, transportados, almacenados e instalados, de acuerdo al servicio para el cual serán usados.	8				
	9				
Ejecutar el mantenimiento, inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingeniería aplicables y aplicando el método de aceptación de trabajo.	10				
	11				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapas	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																																																																																															
	1												2																																																																																																																	
	2018												2019												2020																																																																																																					
	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																																																																																														
Año												Año												Año																																																																																																						
Mes												Mes												Mes																																																																																																						
Semana												Semana												Semana																																																																																																						
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.					
	12				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																																																																								
	1												2																																																																																										
	2018												2019												2020																																																																														
	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																																																																							
Año		Mes		Semana		Semana		Semana		Semana		Semana		Semana		Semana		Semana		Semana		Semana		Semana		Semana		Semana		Semana																																																																									
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.					
	13				
	14				
Establecer un programa de auditorías de la integridad mecánica.	15				
	16				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
	1												2																																							
	2018												2019												2020																											
	Año												Año												Año																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.					
	Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP				

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de Implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
Periodo de Implementación	1												2																																							
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
XII. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS					
<p>1. Ser responsable por el desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección del medio ambiente de sus contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio en todas las Etapas de Desarrollo del Proyecto.</p> <p>2. Establecer en los contratos o en cualquier acuerdo de voluntad que celebre con sus contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente, que éstos deben contar con un Sistema de Administración que cumpla con los requisitos establecidos por la Agencia en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente o apearse al Sistema de Administración.</p> <p>3. Seleccionar a contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio considerando su desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección del medio ambiente, evaluando entre otros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) El histórico de incidentes y accidentes.</li> <li>b) Los indicadores de desempeño de Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente.</li> <li>c) La competencia del personal propuesto para desarrollar las actividades y administrar la Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente.</li> <li>d) Su experiencia en la materia, así como de su capacidad técnica.</li> <li>e) Que la infraestructura propuesta cumpla con la normatividad aplicable.</li> <li>f) Los criterios de Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente para la aceptación de los contratistas, subcontratistas, proveedores de servicios y proveedores, para ser susceptibles de contrato.</li> </ul> <p>4. Incluir en el contrato o cualquier otro acuerdo de voluntades que celebren, las funciones y responsabilidades del personal de la empresa contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios para la administración de la Seguridad Industrial, Operativa y protección del medio ambiente, el desempeño en la materia y control de los riesgos al proceso, al personal, a las comunidades y al medio ambiente.</p> <p>5. Autorizar el programa de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, de acuerdo con la naturaleza de las actividades propias del contrato y asegurar su ejecución.</p> <p>6. Mantener las competencias necesarias del personal contratista, del subcontratista, de los proveedores y prestadores de servicios, de acuerdo con las actividades que desarrollará.</p>	1				
	2				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de Inicio y término del programa de Implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
Periodo de Implementación	1												2																																							
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
Entiéndase por:					
XII. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS					
<p>con los riesgos existentes en su entorno y con los mecanismos de respuesta a emergencia, ya sea proporcionada de manera interna o externa.</p> <p>El personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios en los procesos participará en la planeación y programación de actividades de construcción, operación, mantenimiento, inspección, reparación u otras, asociadas con riesgos críticos y aspectos ambientales significativos.</p> <p>Durante la ejecución de las actividades propias del contrato o cualquier acuerdo de voluntad celebrado con la empresa, el personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios cumplirá con los procedimientos y condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente, así como con las prácticas seguras que corresponden a su actividad.</p> <p>Los trabajos que ejecuten los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, contarán con los permisos de trabajo y los controles de las autorizaciones correspondientes, según la naturaleza de las actividades propias del Proyecto.</p> <p>Durante la ejecución de los trabajos propios de la obra o el servicio realizado por los contratistas, subcontratistas, proveedores o prestadores de servicios, se utilizarán mecanismos para identificar, corregir y prevenir actos y condiciones inseguras que pudieran afectar el desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente, así como el seguimiento y cierre de las recomendaciones derivadas de la aplicación de dichos mecanismos.</p> <p>Durante el tiempo en que se ejecuten los alcances del contrato o cualquier otro acuerdo de voluntades que celebren, se reportará, registrará e investigará los incidentes y accidentes relacionados con el personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, así como el seguimiento y cierre de recomendaciones derivadas de las investigaciones.</p> <p>Evaluar y mejorar el desempeño en Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente de los contratistas, subcontratista, proveedores y prestadores de servicio, según su impacto en el Sistema de Administración.</p> <p>Los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios deben cumplir con las iniciativas de mejora para el desempeño en la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.</p>	3				
	4				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP


Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de Implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño			Construcción												Operación y Mantenimiento																																																																																								
	1												2																																																																																											
	2018												2019												2020																																																																															
	Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																																																																								
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
XII. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS					

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

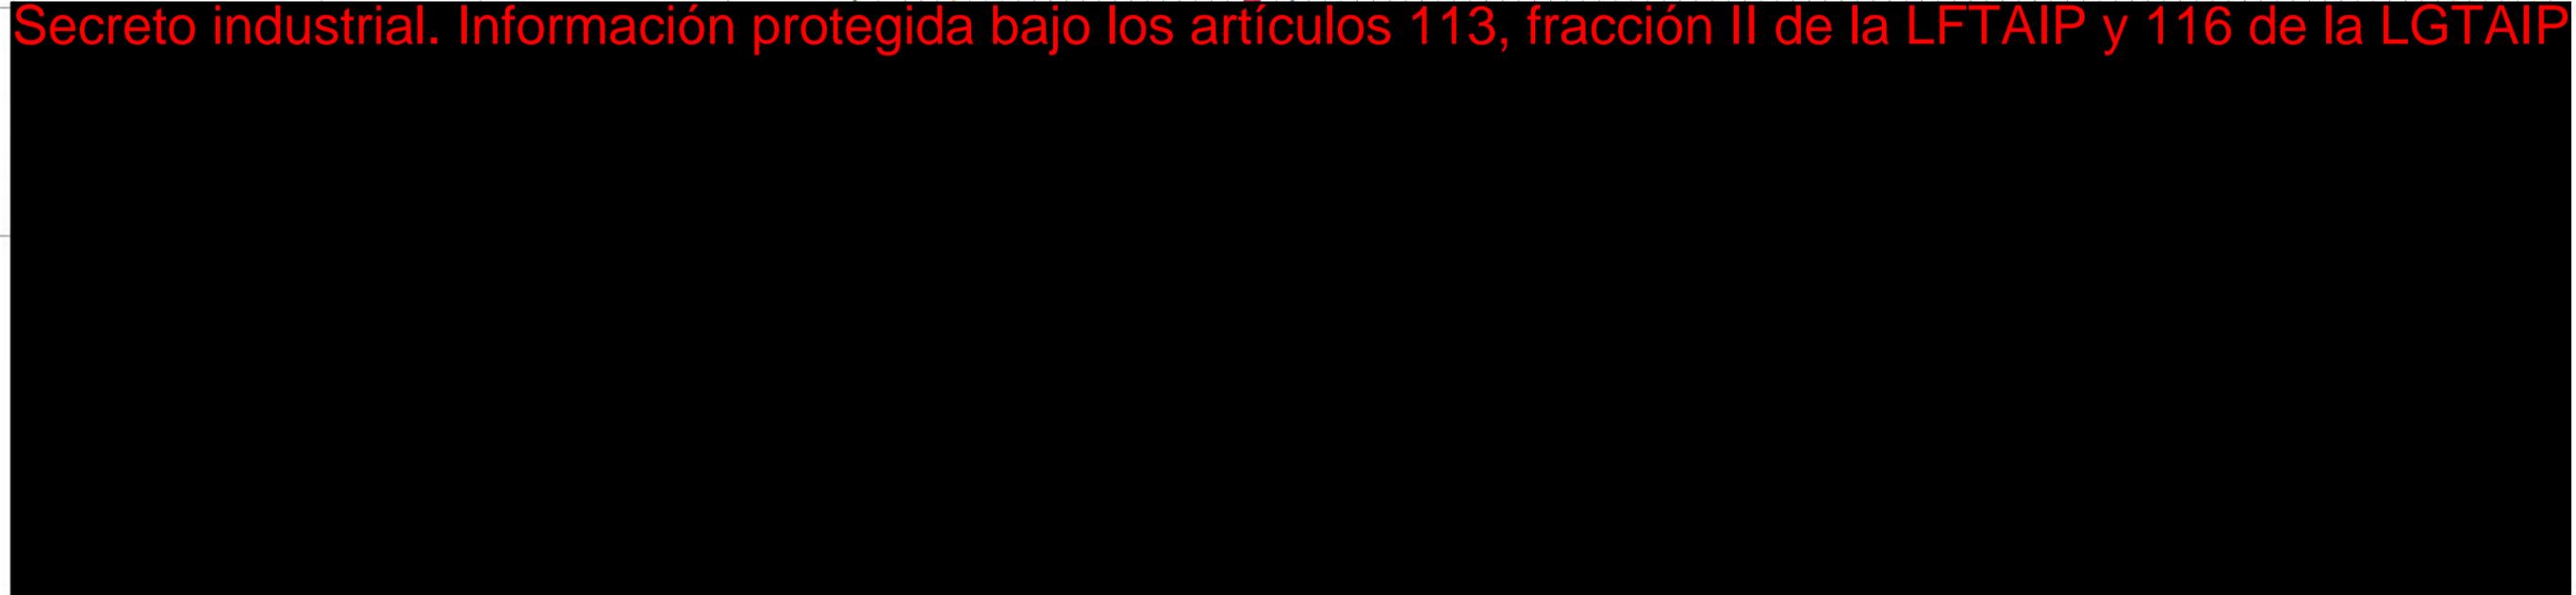

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:


Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASE-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
Periodo de Implementación	1												2																																							
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
<b>XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS</b>  Preparar y ejecutar los mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente que se presenten durante las diferentes Etapas de Desarrollo del proyecto.  Planificar las situaciones potenciales de emergencia identificadas considerando la siguiente información: a) Los resultados de la evaluación de riesgos y la evaluación de los Aspectos Ambientales. b) Los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables. c) Los procesos, las actividades, los equipos, los lugares de trabajo y los materiales empleados. d) Las condiciones normales.	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
8					

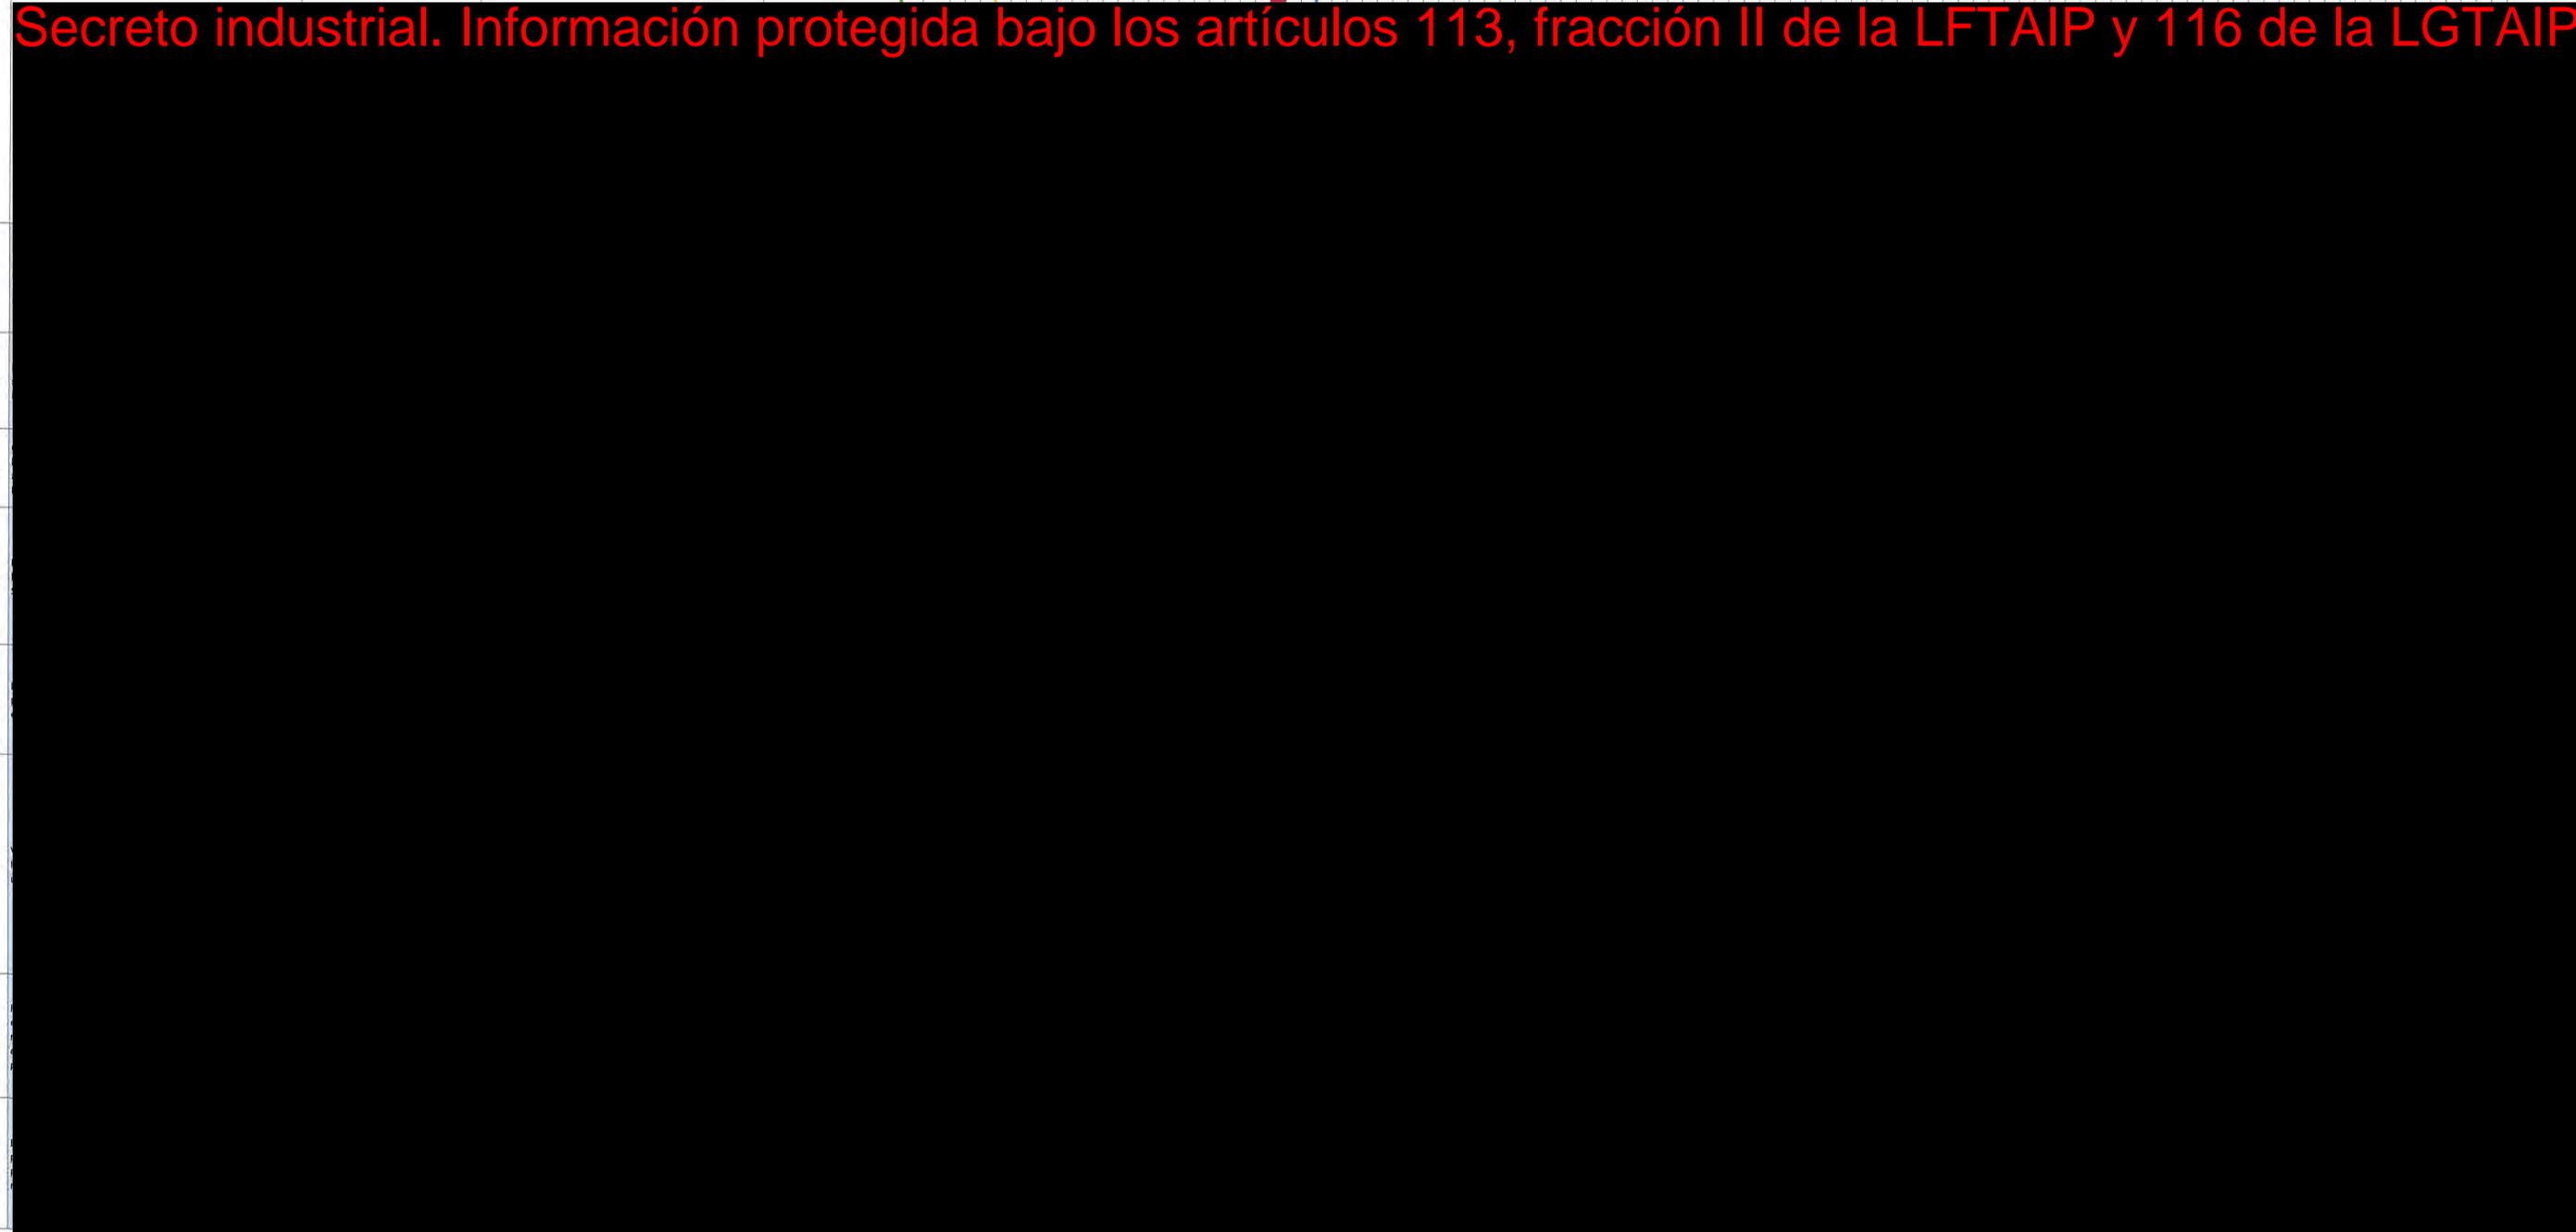

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
	1												2																																							
	2018												2019												2020																											
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
<b>XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS</b>					
anormales y potenciales situaciones de emergencia.					
e) La periodicidad para la revisión de los planes de atención y respuesta a emergencias.	9				
f) El impacto que una situación de emergencia puede ocasionar en las personas, instalaciones y áreas de influencia del Proyecto.					
g) Personas con necesidades especiales.					
h) Los posibles impactos sobre los servicios de emergencia.					
i) Experiencias previas, propias y de otras organizaciones similares.					
j) Información de incidentes o accidentes propios del Proyecto a realizar.	10				

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Note: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASE-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																	
Periodo de implementación	1												2																																							
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
<b>XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS</b>	11				
	12	Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor escenario y el más probable			
	13				
	14	Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto			
	15				
	16	Contar con un centro de operación a emergencias donde la organización realice sus actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta y control de una posible emergencia			
	17				
	18	Ejecutar y evaluar simulacros y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergencia posibles, incluyendo el peor de ellos y el más frecuente, dando seguimiento y cumplimiento a las acciones de mejora necesarias.			
	19				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción																												Operación y Mantenimiento																																																																																																				
	Periodo de Implementación																												1																												2																																																																										
	Año																												2018														2019														2020																																																																										
	Mes																												Diciembre							Enero							Febrero							Marzo							Abril							Mayo							Junio							Julio							Agosto							Septiembre							Octubre							Noviembre							Diciembre																		
Semana																												30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS					
Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuesta a emergencias y evacuación certificados, cuando aplique para tal fin y tenerlos disponibles y listos para ser utilizados en cualquier momento.	20				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
Periodo de Implementación	1												2																																							
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS					
Diseñar, construir, Seleccionar, probar y operar los equipos de respuesta a emergencias y contingencias ambientales con base en estándares de aplicación y reconocimiento nacional e internacional	21				
	22				
Realizar pruebas periódicas de los equipos y sistemas de emergencia.	23				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.  
 Proyecto: Emerging América  
 Responsable del Sistema de Administración: Guillermo Hernández Morales  
 Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación  
 Fecha de inicio de implementación: 23 de julio de 2018  
 Fecha de cierre de implementación: 17 de julio de 2020

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DAGG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se concluyó en dicha CURR.  
 La fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Período de Implementación		Diseño																								Construcción												Operación y Mantenimiento																							
	Año	Mes	1												2																																															
			2018												2019												2020																																			
			Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																							
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29										

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad (Semanas)	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance
XIV. Monitoreo, Verificación y Evaluación.	1									
	2									
	3	Documentar y medir el cumplimiento del Sistema de Administración y el desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente durante la ejecución del Proyecto.								
	4	Establecer los criterios para evaluar el desempeño del Sistema de Administración y su efectividad considerando, entre otros, los siguientes aspectos: a) El cumplimiento de la política. b) La consecución de objetivos y metas. c) La consecución de la mejora continua. d) El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. e) Los incidentes de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y ambientales. f) Los controles operacionales existentes. g) La necesidad de modificar o introducir nuevos controles. h) La calibración y verificación de los equipos empleados en el de seguimiento y medición.								
	5	Monitorear lo necesario para poder cumplir con los requisitos del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección ambiental, así como con los requisitos legales y otros que la empresa suscriba en la materia, considerando, entre otras, las siguientes: a) Los resultados de las auditorías e inspecciones. b) La evaluación de la eficacia de la formación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente. c) La cultura de la satisfacción de los trabajadores en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente. d) El uso eficaz de los resultados de las auditorías internas y externas. e) La eficacia de los procesos de participación de los empleados.								
	6									
	7									

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Emergencia América

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de julio de 2020

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASIOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa  
Periodo de Implementación  
Año  
Mes  
Semana

Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																							
		1												2																																							
		2018						2019						2020																																							
		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																											
		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad (Semanas)	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance
XIV. Monitoreo, Verificación y Evaluación.										

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.  
 Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
Periodo de Implementación	1												2																																							
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																											
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
<b>XV. AUDITORÍAS</b>					
	1	Documentar, planificar, establecer, ejecutar y mantener un programa de auditorías internas y externas para el Sistema de Administración.			
	2				
	3	Mantener en ejecución un programa de auditorías operativas orientado a identificar y corregir actos inseguros y condiciones de riesgo en instalaciones y equipos, dispositivos y sistema de seguridad, así como equipos de respuesta a emergencias y contingencias ambientales.			
	4				
	5	Identificar los hallazgos, investigar las causas y establecer y cumplir las acciones correctivas y preventivas.			
	6				
	7				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
Periodo de Implementación	1												2																																							
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																											
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
XV. AUDITORÍAS					

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																															
Período de Implementación	1												2																																																	
Año	2018												2019												2020																																					
Mes	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul																											
Semana	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
<b>XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES:</b>					
Registrar, investigar, analizar, identificar las causas, dar seguimiento hasta el cumplimiento de las recomendaciones y comunicar los incidentes y accidentes que ocurran durante cualquiera de las etapas de su Proyecto, considerando las actividades del propio Regulado, así como la de sus contratistas o subcontratistas.	1				
Asignar personal competente para realizar la investigación de los incidentes y accidentes. Integrar grupos de investigación de incidentes y accidentes que incluyan al personal relacionado con el evento, así como contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio cuando sea necesario. Aplicar metodologías de uso y reconocimiento nacional o internacional para realizar la investigación de incidentes o accidentes, hasta la identificación de las causas que son origen del evento.	2				
Identificar en cada investigación de incidente o accidente que realice, las causas que dieron origen al evento.	3				
Establecer las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes para favorecer que éstos no se repitan. Cumplir las recomendaciones, acciones correctivas y acciones preventivas que se deriven de la investigación del incidente o accidentes.	4				
Comunicar los resultados de la investigación y del cumplimiento de recomendaciones, acciones correctivas y preventivas, al personal que participa en el Proyecto, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, que por sus actividades pudieran tener relación con el evento. Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio al cumplimiento de la totalidad de acciones y recomendaciones emitidas.	5				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																															
Período de Implementación	1												2																																																	
Año	2018												2019												2020																																					
Mes	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																											
Semana	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES:					
	6				
Implementar y ejecutar un mecanismo para favorecer la apertura y cultura de reporte de incidentes y accidentes	7				
	8				
Comunicar a la Agencia, los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución del proyecto.	9				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de Implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
Periodo de Implementación	1												2																																							
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES:					

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Note: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517095C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.  
 Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																															
	1												2																																																	
	2018												2019												2020																																					
Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio							
Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
XVII. REVISIÓN DE RESULTADOS	1	Revisar los resultados de la ejecución de su Sistema de Administración, el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeño de manera continua y permanente; la revisión debe tener una periodicidad definida.			
	2				
	3				
	4				
	5				

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

*[Handwritten signatures]*

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																						
	1		2												3																																						
	2018		2019												2020																																						
	Sept	Oct	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Responsables	% Avance
XVII. REVISIÓN DE RESULTADOS					

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																																																																											
	1												2																																																																																													
	2018												2019												2020																																																																																	
	Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																																																																									
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	% Avance
XVIII. INFORME DE DESEMPEÑO				
	1			
Elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes de la organización.	2			
	3			
Informar los resultados de la evaluación de desempeño a las autoridades competentes.	4			
Determinar los criterios de periodicidad para realizar la evaluación del desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.	5			
	6			
Establecer las acciones a tomar para mejorar la adecuación y efectividad del Sistema de Administración	7			
	8			
	9			
	10			

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado:  
 Proyecto:  
 Responsable del Sistema de Administración:  
 Clave del documento:  
 Fecha de inicio de implementación:  
 Fecha de cierre de implementación:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																																																																											
	Periodo de Implementación 1												Periodo de Implementación 2																																																																																													
	Año 2018												Año 2019												Año 2020																																																																																	
	Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																																																																									
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	% Avance
Etapa de Seguimiento del Sistema de Administración	11			
	12			

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

**Igasamex San Jose Iturbide, S. de R.L. de C.V. (Oxica)**

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Fecha de Elaboración: 27/02/2019


Revisión: 0

Fecha de revisión: N/A

Página: 1 de 1

**Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y  
Protección al Medio Ambiente**

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



**Jose Eduardo Estrada Ibarra**  
**Representante Legal**

Número de Procedimiento:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

	12
	Revisión:
	13

**TABLA DE CONTENIDO**

- 1.0 Propósito
- 2.0 Alcance
- 3.0 Referencia
- 4.0 Responsabilidades
- 5.0 Procedimiento
- 6.0 Definiciones
- 7.0 Registros de Calidad
- 8.0 Anexos

**DISTRIBUCIÓN**

Electrónicamente mediante el Qdoc

**HISTORIA DE REVISIÓN**

Cuando este documento sea modificado o editado, llenar la columna de revisión siguiente y brevemente Describir los cambios hechos en un párrafo corto debajo de la tabla


Nombres y firmas de las personas físicas. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP			
	14	15	16

---

---

Revisión:	Fecha de elaboracion	Página:	No. de Procedimiento
-----------	----------------------	---------	----------------------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

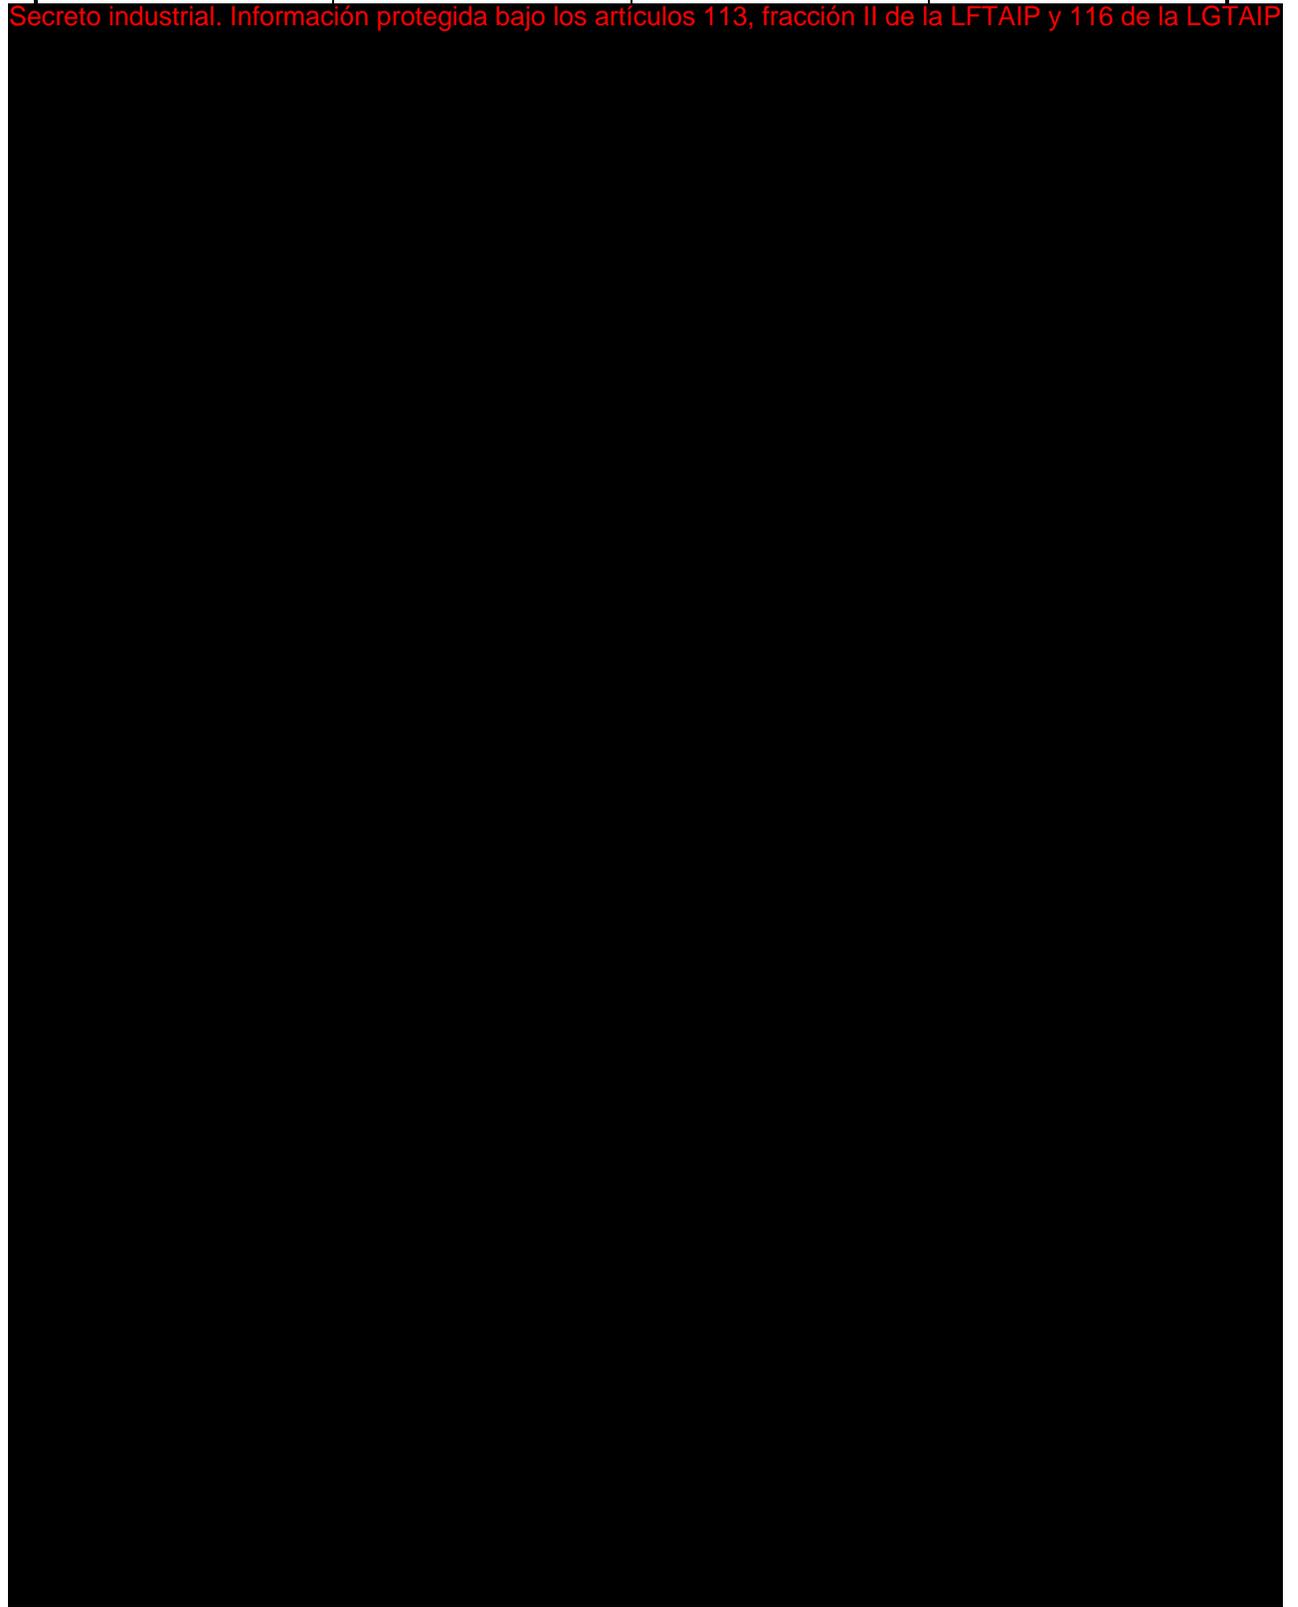


---

---

Revisión:	Fecha de elaboracion	Página:	No. de Procedimiento
-----------	----------------------	---------	----------------------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

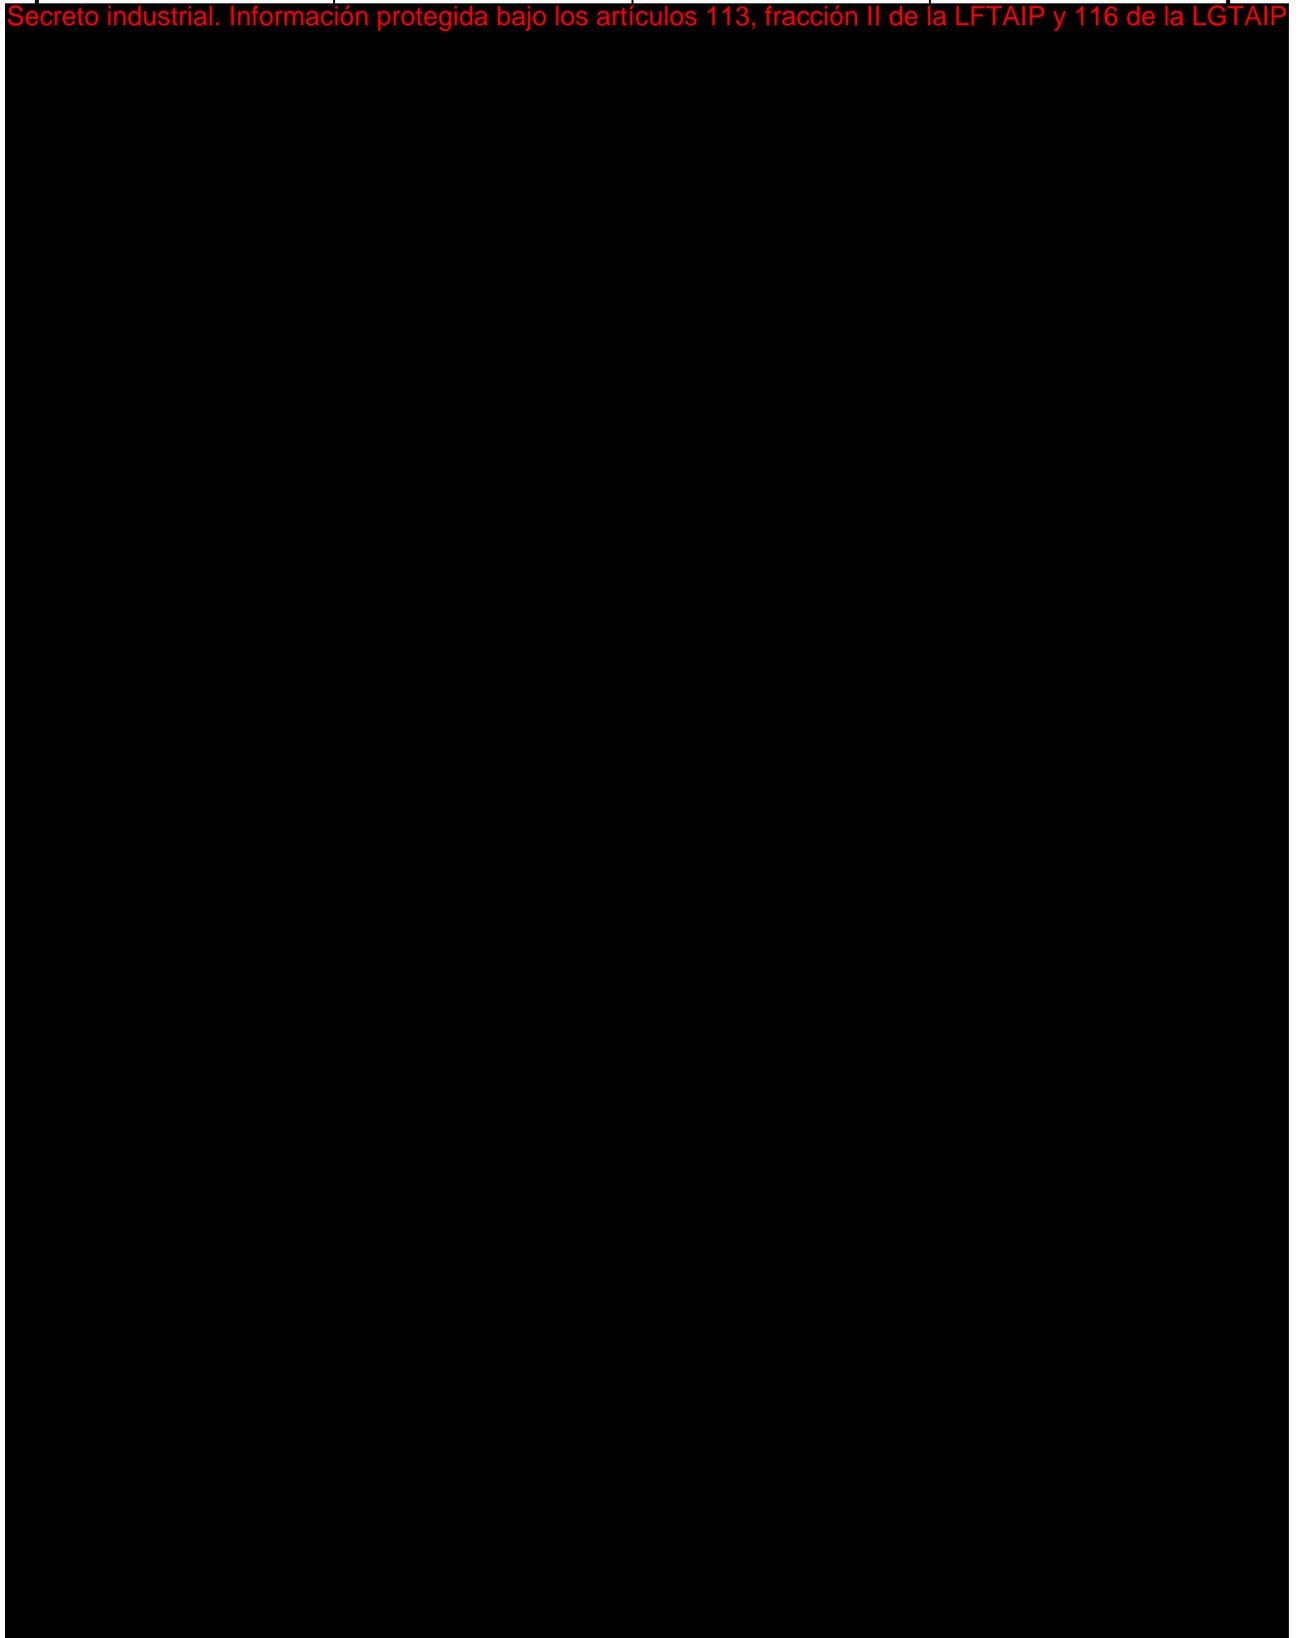


---

---

Revisión:	Fecha de elaboracion	Página:	No. de Procedimiento
-----------	----------------------	---------	----------------------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

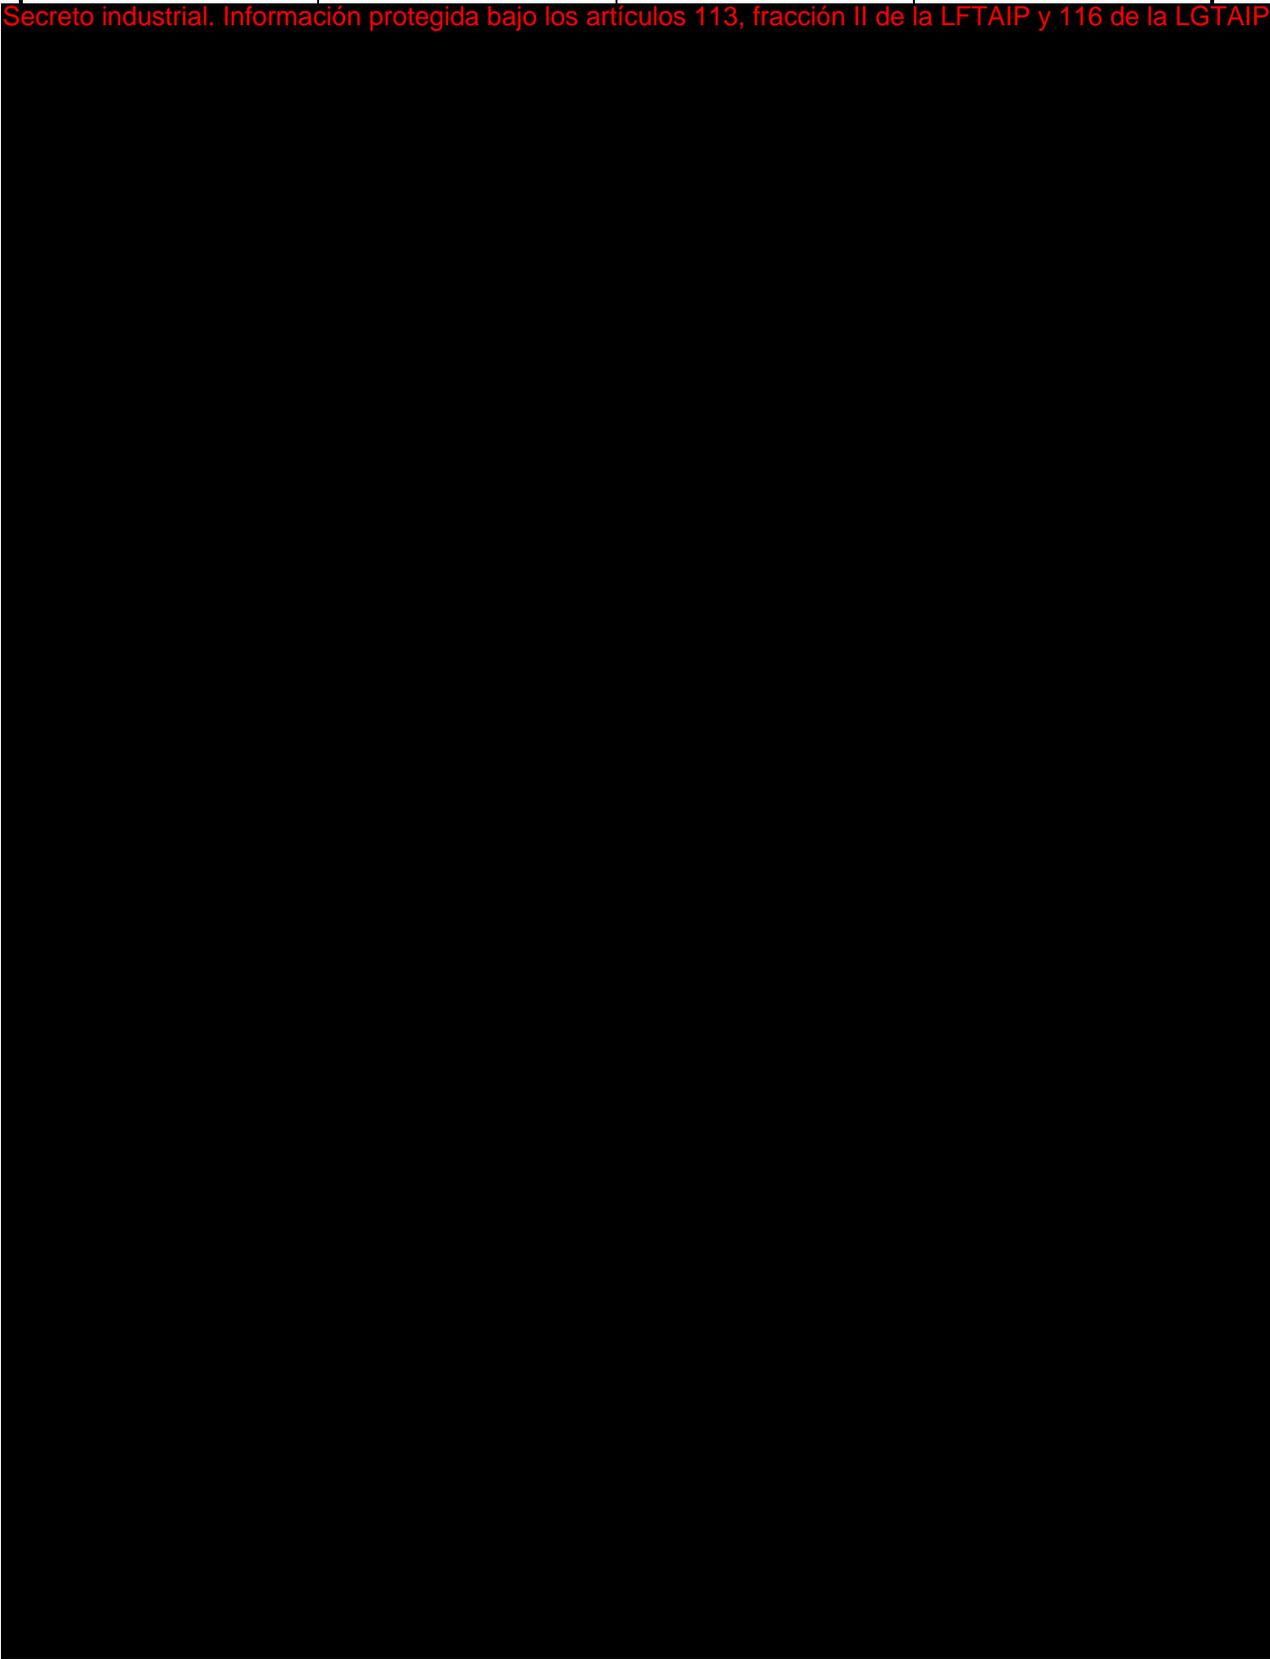


---

---

Revisión:	Fecha de elaboracion	Página:	No. de Procedimiento
-----------	----------------------	---------	----------------------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




---

---

Revisión:	Fecha de elaboracion	Página:	No. de Procedimiento
-----------	----------------------	---------	----------------------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

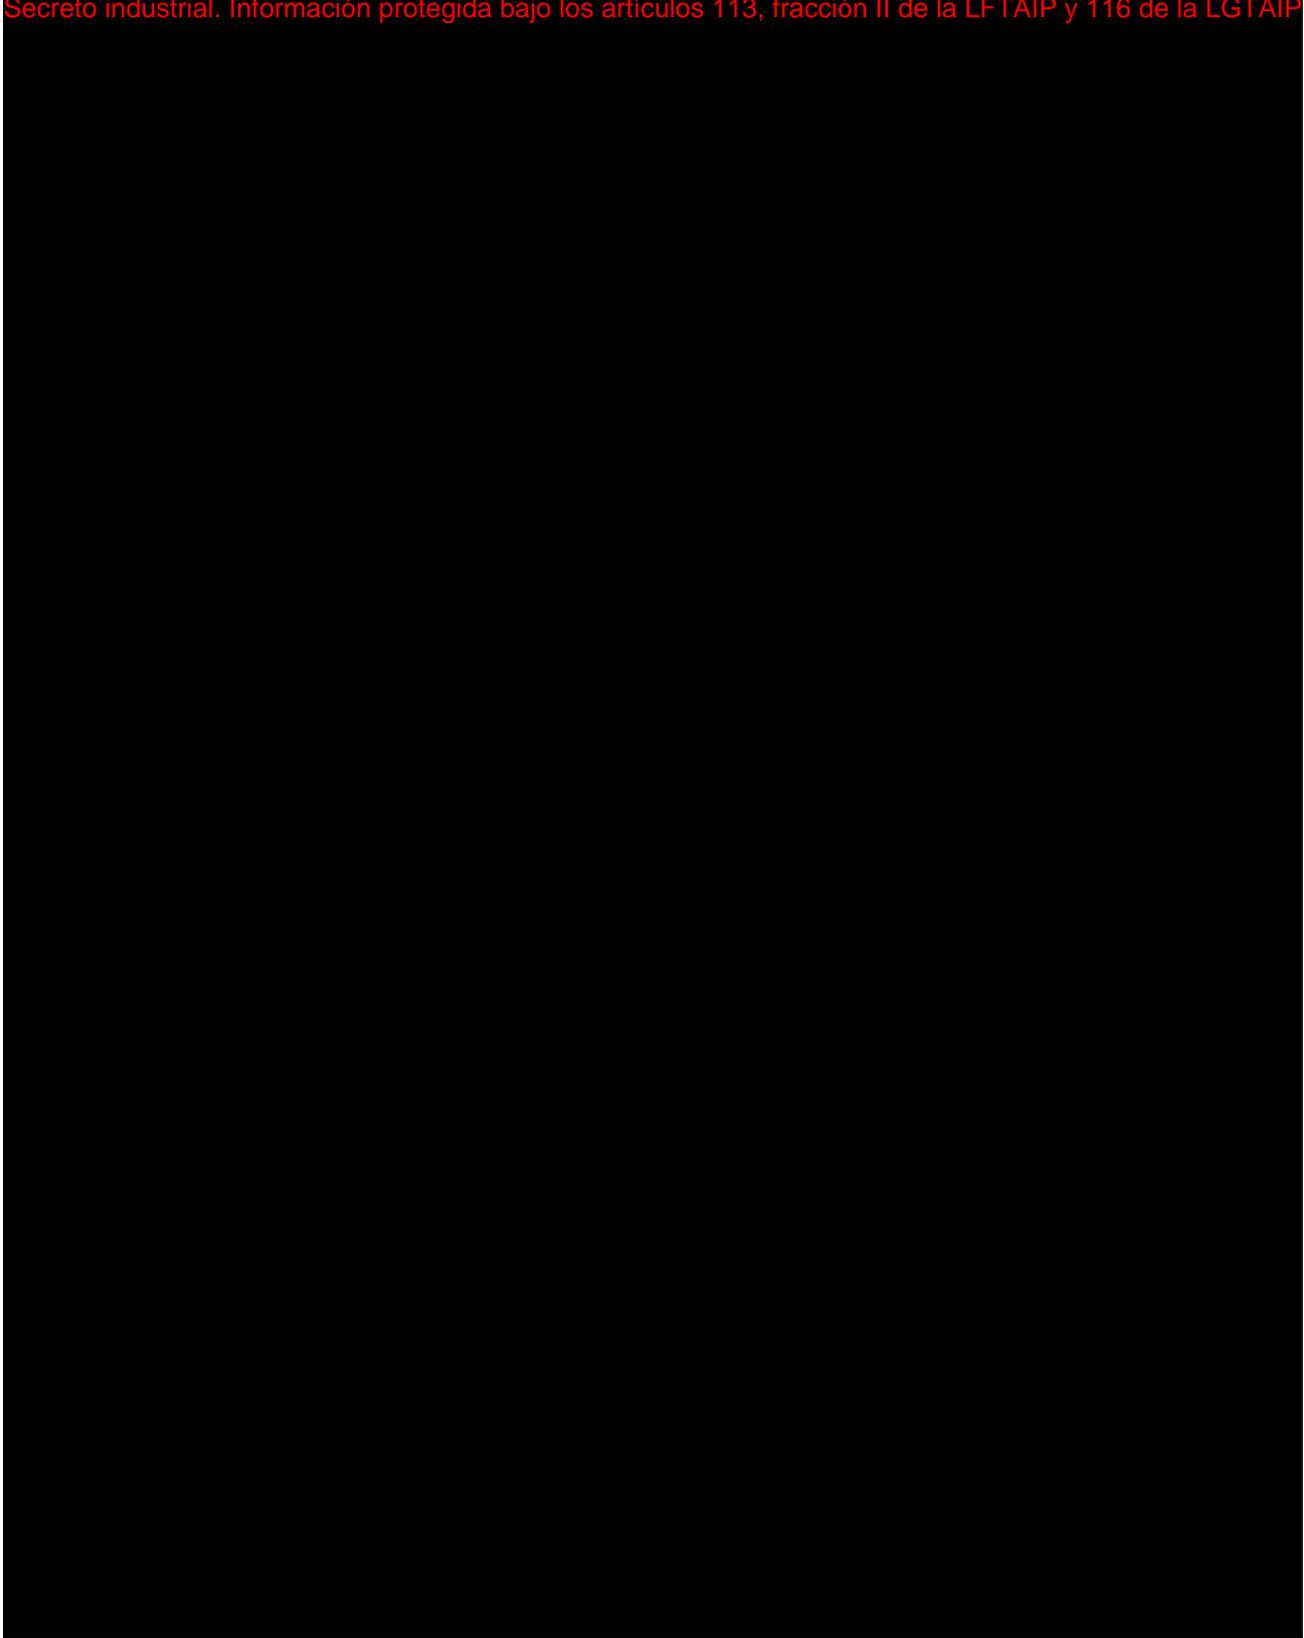


---

---

Revisión:	Fecha de elaboracion	Página:	No. de Procedimiento
-----------	----------------------	---------	----------------------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




---

---

Revisión:	Fecha de elaboracion	Página:	No. de Procedimiento
-----------	----------------------	---------	----------------------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




---

---

Revisión:	Fecha de elaboracion	Página:	No. de Procedimiento
-----------	----------------------	---------	----------------------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

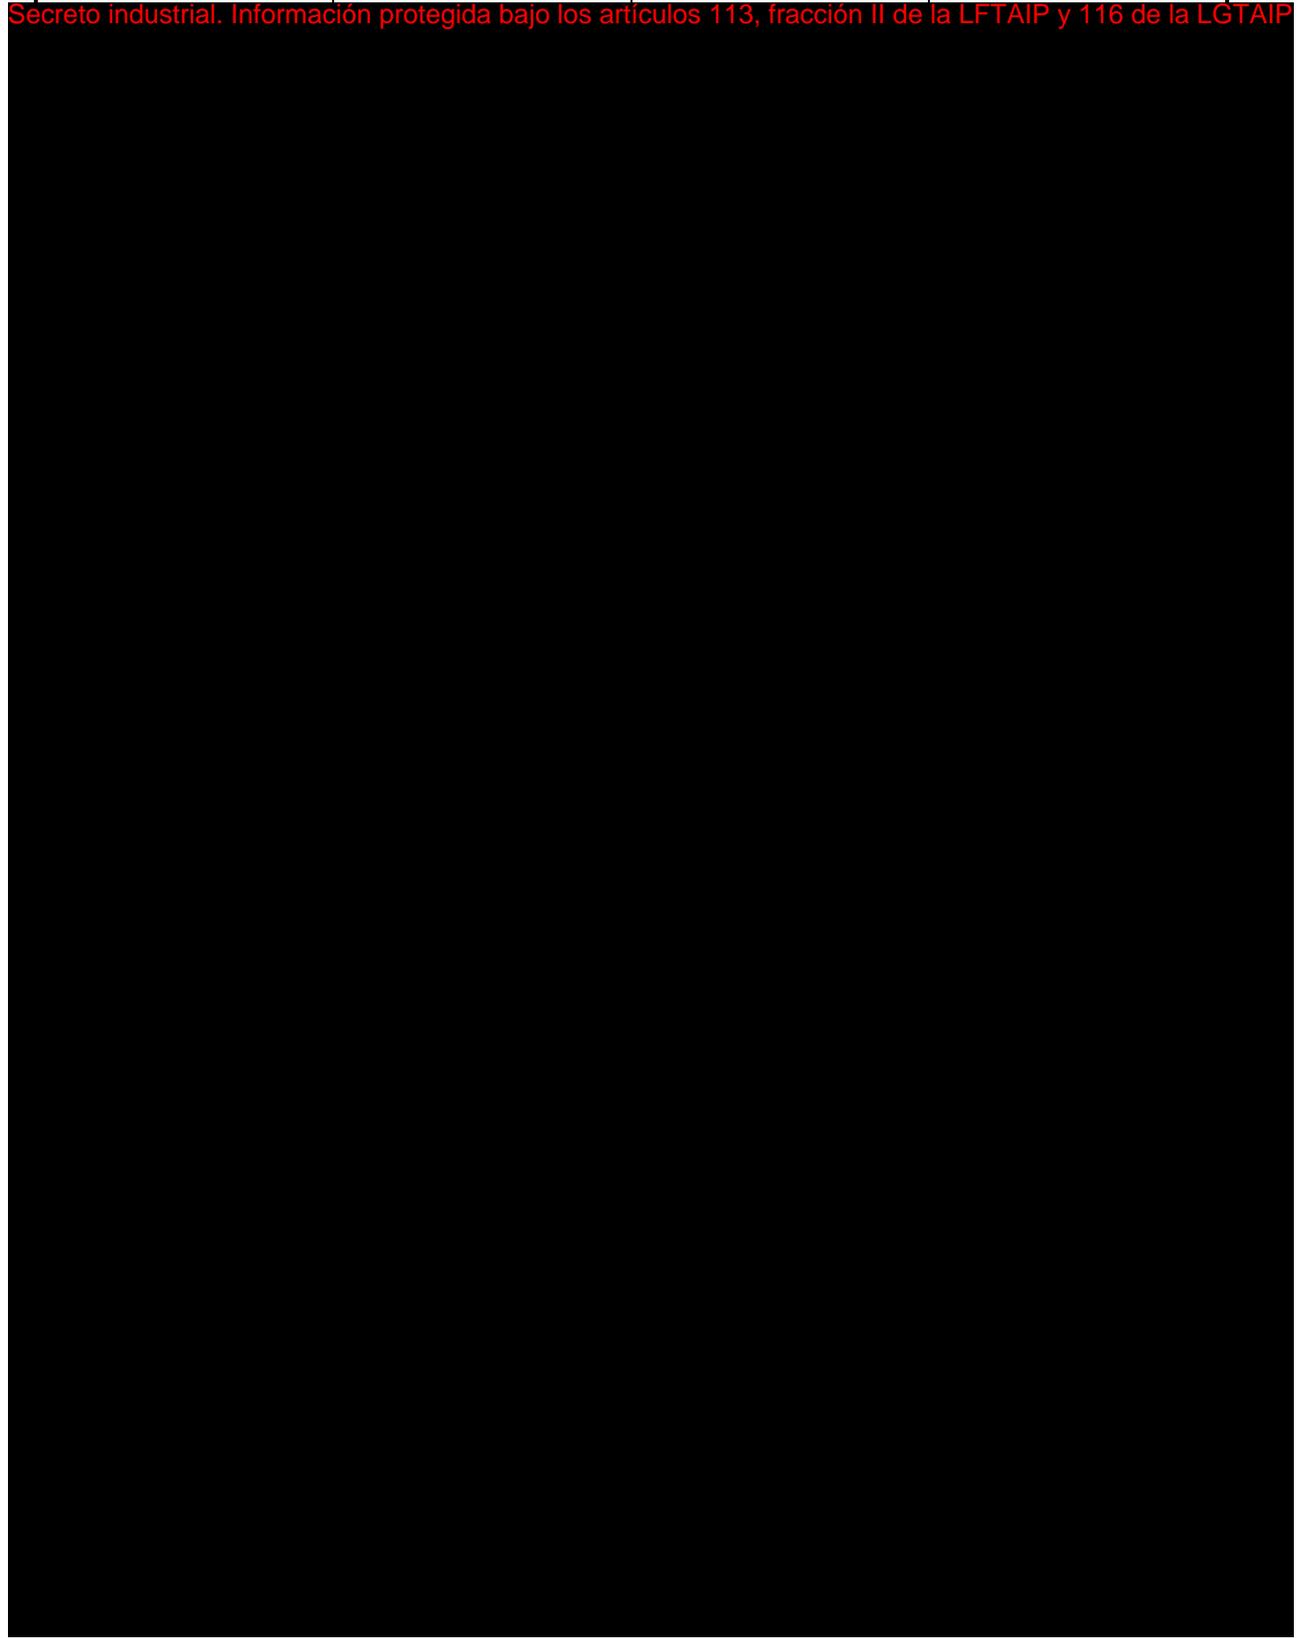


---

---

Revisión:	Fecha de elaboracion	Página:	No. de Procedimiento
-----------	----------------------	---------	----------------------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP





**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

**Unidad de Gestión Industrial**  
**Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**  
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1255/2021

Ciudad de México, a 30 de junio de 2021

**C. José Eduardo Estrada Ibarra**  
**Apoderado Legal de la empresa**  
**IGASAMEX San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.**

Domicilio, teléfono, correo electrónico del representante legal. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

## PRESENTE

Me refiero a su escrito sin número, sin fecha y sus anexos, ingresado el 02 de marzo de 2021, ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (**AGENCIA**), por medio del cual la empresa **IGASAMEX San José Iturbide, S. de R.L. de C.V. (REGULADO)**, presentó el Segundo Informe Semestral de cumplimiento al Programa de Implementación al Sistema de Administración (**INFORME**), en el proyecto denominado **Transporte de Gas Natural por medio de ducto (PROYECTO)**; en el trayecto que se desarrolló en el municipio de Chocholá en el estado de Yucatán, autorizado mediante el oficio número **ASEA/UGI/DGGPI/2299/2018** de fecha 29 de noviembre de 2018 con número de autorización **ASEA-IAS17096C/BD0218 (AUTORIZACIÓN)**, de acuerdo con lo previsto en las "*Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la Conformación, Implementación y Autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican*", y

## RESULTANDO

- I. Que el 14 de junio de 2018, la Comisión Reguladora de Energía (**COMISIÓN**), otorgó a **IGASAMEX San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.**, el Título de Permiso **G/21297/TRA/2018 (PERMISO)** con vigencia de 30 años a partir de la fecha de su otorgamiento, mediante la resolución número **RES/1345/2018**, para transportar gas natural descrito y contenido en el **PERMISO**.

Página 1 de 12





Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

**Unidad de Gestión Industrial**  
**Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**  
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1255/2021

Ciudad de México, a 30 de junio de 2021

- II. Que la **AGENCIA** emitió a favor del **REGULADO**, la autorización **ASEA-IAS17096C/BD0218** contenida en el oficio número **ASEA/UGI/DGGPI/2299/2018** de fecha 29 de noviembre de 2018, notificado el 30 de noviembre de 2018, para la implementación del Sistema de Administración en el **PROYECTO**.
- III. Que mediante el escrito sin número, sin fecha y sus anexos, ingresado a esta **AGENCIA**, el 08 de julio de 2020, el **REGULADO** presentó el *Primer Informe semestral de cumplimiento al Programa de Implementación al Sistema de Administración*.
- IV. Que mediante el escrito sin número, sin fecha y sus anexos, ingresado a esta **AGENCIA**, el 02 de marzo de 2021, el **REGULADO** presentó el *Segundo Informe semestral de cumplimiento al Programa de Implementación al Sistema de Administración*.

#### CONSIDERANDO

- I. Que de acuerdo con las actividades de transporte de gas natural a las que se dedica el **REGULADO**, estas corresponden para efectos de su evaluación al Sector Hidrocarburos, las cuales son competencia de esta **AGENCIA** de conformidad con la definición señalada en el artículo 3o fracción XI inciso c, de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
- II. Que el 13 de mayo de 2016, la **AGENCIA** publicó en el Diario Oficial de la Federación (**DOF**), las *"Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican"*; mismas que fueron modificadas mediante los acuerdos publicados en el **DOF** el 04 de julio de 2018 y el 04 de mayo de 2020, respectivamente, (**LINEAMIENTOS**).
- III. Que no se tiene por reconocida la personalidad jurídica del **C. José Eduardo Estrada Ibarra** como apoderado legal de la empresa **IGASAMEX San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.**, al no identificarse la presentación de la escritura pública número noventa y cuatro mil quinientos treinta y uno (94,531) de fecha 12 de marzo de 2020, pasada ante la fe del Lic. Marco Antonio Ruiz Aguirre, Titular de la Notaría doscientos veintinueve (229) de la Ciudad de México, a la que se refiere en el escrito sin número y sus anexos, ingresado el 02 de marzo de 2021.
- IV. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de los **LINEAMIENTOS**, se indica que, a partir de que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, el Regulado quedará obligado a la





Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

**Unidad de Gestión Industrial**  
**Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**  
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1255/2021

Ciudad de México, a 30 de junio de 2021

Implementación de todos los elementos que lo integran, con base en el Programa de Implementación presentado a la Agencia, así como a entregar los documentos a los que se refiere el **Apartado B del Anexo de los LINEAMIENTOS**.

- V. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de los **LINEAMIENTOS**, se indica que, para el seguimiento del Programa de Implementación, cada seis meses, a partir de la fecha en la que se haya notificado la Autorización del Sistema de Administración y hasta la conclusión del programa, los Regulados deberán ingresar en formato libre, a través del Área de Atención al Regulado de la Agencia (**AAR**), informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación; los cuales deberán ser presentados dentro de los primeros veinte días hábiles de cada periodo cumplido; el **REGULADO** presentó el informe de manera extemporánea.
- VI. Que, de la información presentada por parte del **REGULADO**, respecto al informe semestral para dar cumplimiento con el seguimiento del Programa de Implementación, contenido en el documento "*Segundo informe semestral de acuerdo al programa de implementación del SASISOPA*", no indica el periodo reportado, se previene lo siguiente:

**Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP**





**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE




**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**

**Unidad de Gestión Industrial  
Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**  
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1255/2021

Ciudad de México, a 30 de junio de 2021

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

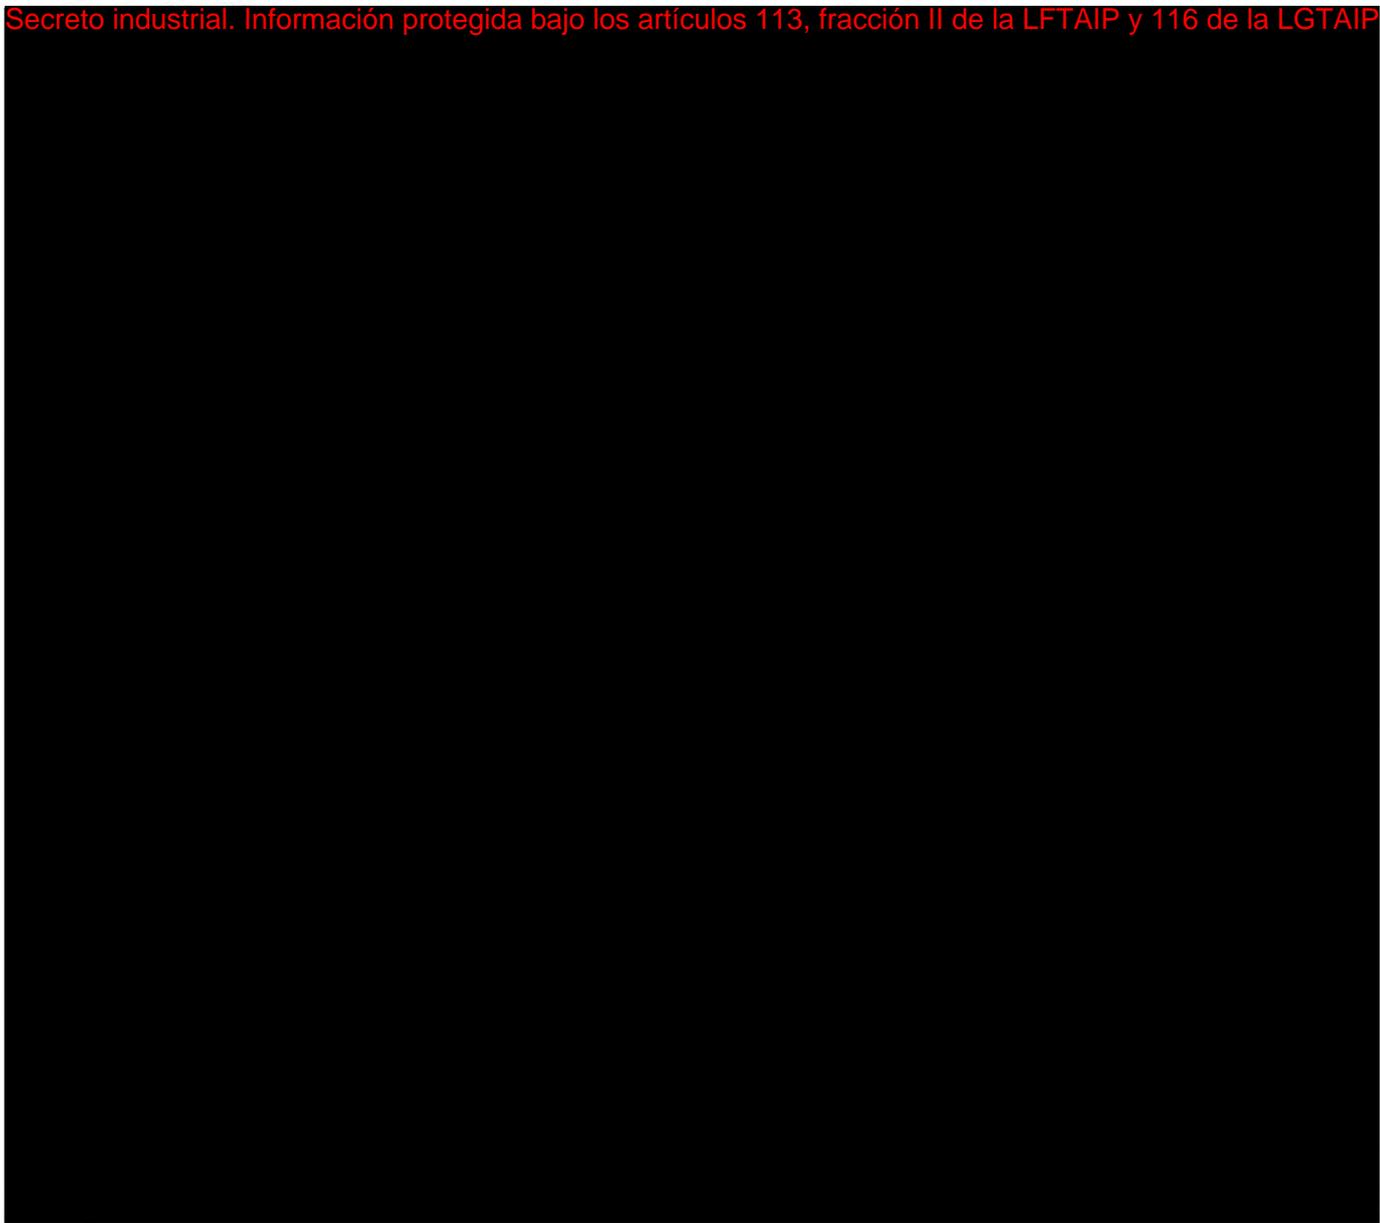



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE




Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

**Unidad de Gestión Industrial**  
**Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**  
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1255/2021

Ciudad de México, a 30 de junio de 2021

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

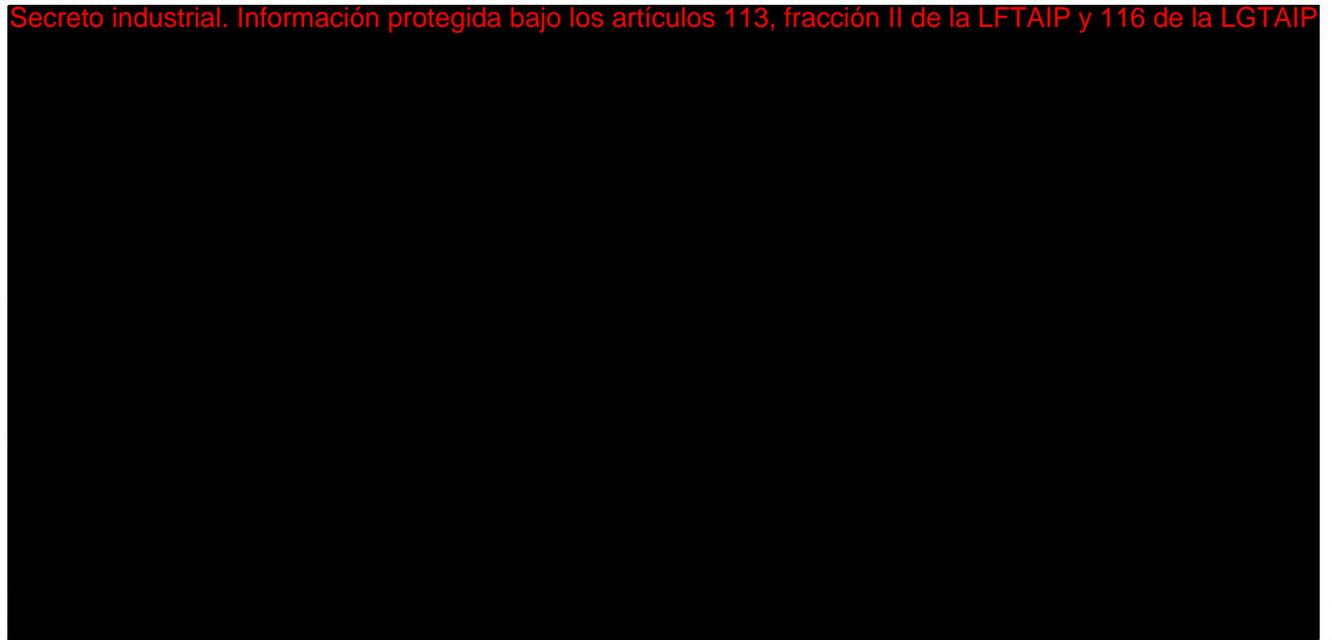

6. Conforme al Elemento I, **POLÍTICA**, numerales 1, 2 y 3 del Anexo III, se tienen las siguientes observaciones:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



7. Conforme al Elemento II, **IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS**, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Anexo III, se tienen las siguientes observaciones:

Página 5 de 12





**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE




Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

**Unidad de Gestión Industrial**  
**Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**  
Oficio No. ASEA/UGI/DCGPI/1255/2021


Ciudad de México, a 30 de junio de 2021

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

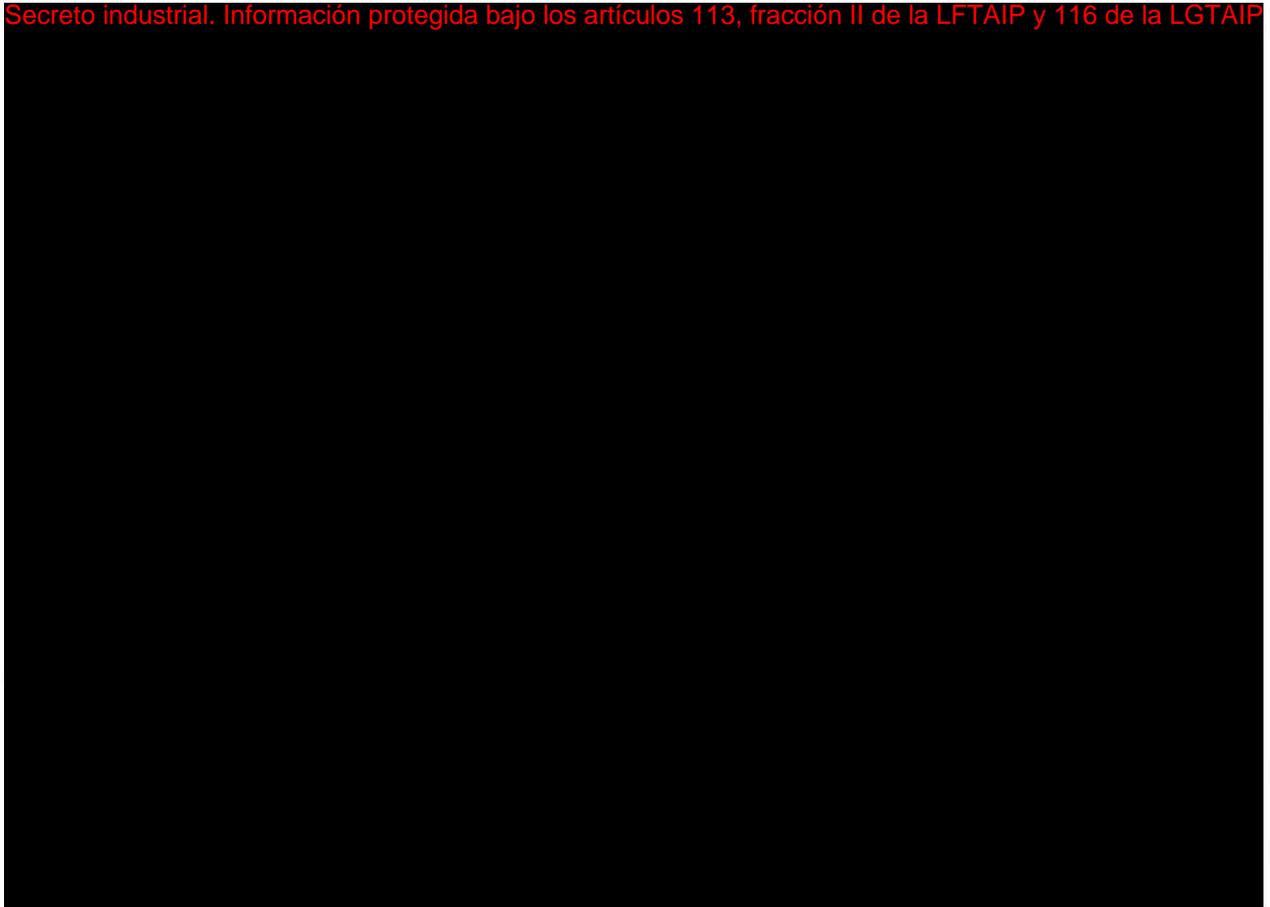

8. Conforme al Elemento III, REQUISITOS LEGALES, numerales 1, 2 y 3 del Anexo III, se tienen las siguientes observaciones:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP





**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE




Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

**Unidad de Gestión Industrial**  
**Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**  
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1255/2021

Ciudad de México, a 30 de junio de 2021

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

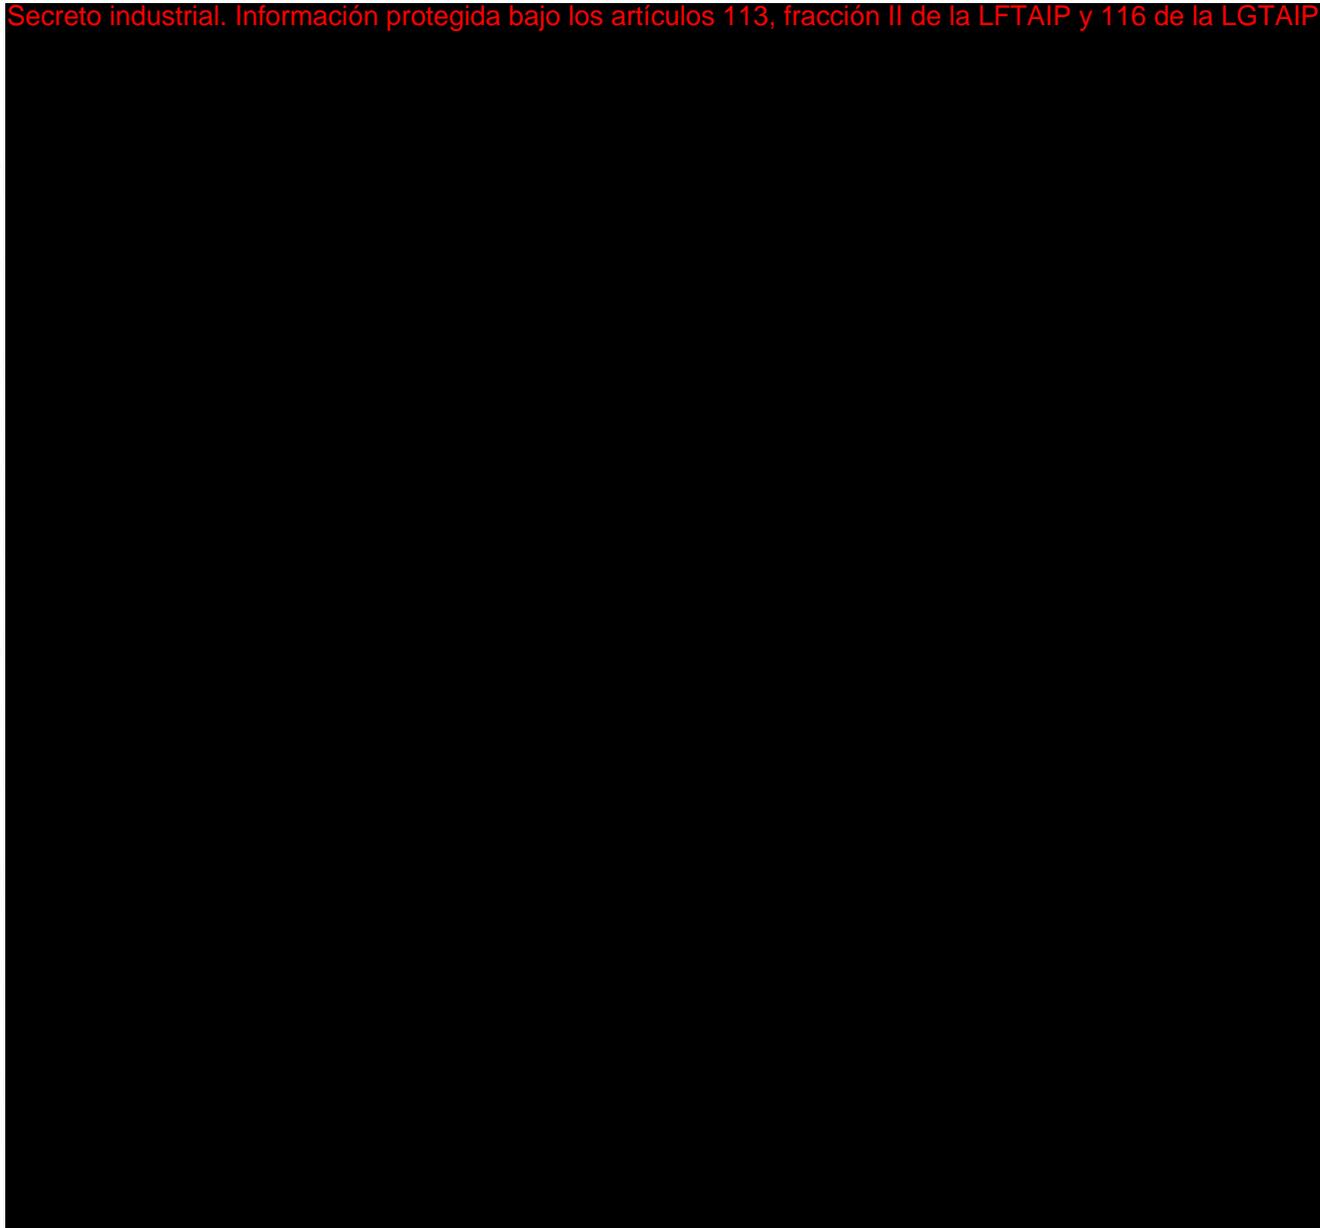



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

**Unidad de Gestión Industrial**  
**Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**  
Oficio No. ASEA/UGI/DCGPI/1255/2021

Ciudad de México, a 30 de junio de 2021

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

9. Conforme al **Elemento V, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD**, numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del **Anexo III**, se tienen las siguientes observaciones:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

10. Conforme al **Elemento IX, MEJORES PRACTICAS Y ESTANDARES**, numerales 1, 2 y 3 del **Anexo III**, se tienen las siguientes observaciones:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP






Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

**Unidad de Gestión Industrial**  
**Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**  
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1255/2021

Ciudad de México, a 30 de junio de 2021


11. Conforme al **Elemento X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS**, numerales **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9** del **Anexo III**, se tienen las siguientes observaciones:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

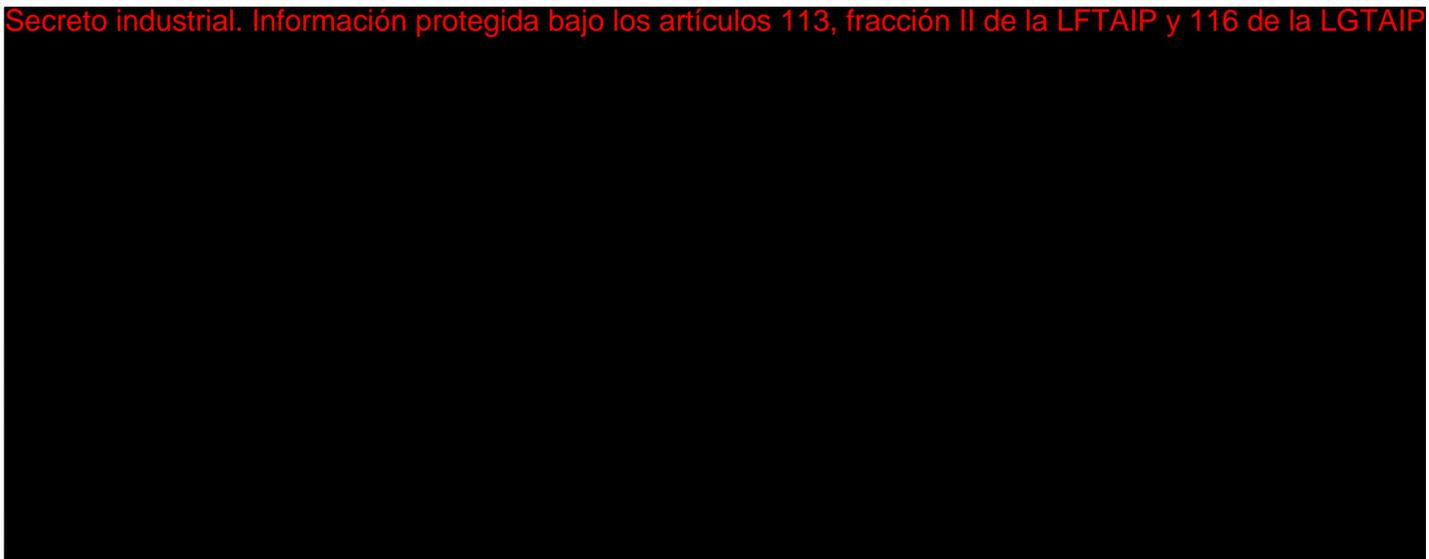


12. Conforme al **Elemento XI, INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD**, numerales **1, 2, 3 y 4** del **Anexo III**, se tienen las siguientes observaciones:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



13. Conforme al **Elemento XIII PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS** numerales **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9** del **Anexo III**, se tienen las siguientes observaciones:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP





Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

**Unidad de Gestión Industrial**  
**Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**  
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1255/2021

Ciudad de México, a 30 de junio de 2021

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

14. Conforme al Elemento XV. **AUDITORIAS**, numerales 1, 2, 3 y 4, del Anexo III, se tienen las siguientes observaciones:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

15. Conforme al Elemento XVI. **INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES**, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, del Anexo III, se tienen las siguientes observaciones:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

16. Conforme al Elemento XVIII. **INFORMES DE DESEMPEÑO**, numeral 1, del Anexo III, se tienen las siguientes observaciones:

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP





Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

**Unidad de Gestión Industrial**  
**Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**  
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1255/2021

Ciudad de México, a 30 de junio de 2021

**VII. Que, el REGULADO no presentó los documentos de evidencia de cumplimiento del Apartado B del Anexo IV de los LINEAMIENTOS, por lo que esta AGENCIA determina que NO CUMPLE.**

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1o, 2o., 3o. fracción XI, 4o., 5o. fracciones XVII y XXX, 12, 13 y 14 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 4 fracciones IV, XVIII y XIX, 9 fracción XXIV, 12 fracciones III y X, 17, 18 fracciones III, XVIII y XX, 28 fracciones I y XX y 29 fracciones I y XX del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 2 y 34 de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la Conformación, Implementación y Autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican; 1, 7, 27, 28, 29 y 33 del ACUERDO por el cual se modifican, adicionan y derogan diversos artículos de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican; 1o y 3o del ACUERDO por el que se delega en la Dirección General de Gestión de Procesos Industriales, las facultades que se indican; y lo dispuesto en el artículo PRIMERO del ACUERDO por el que se delega en las Direcciones Generales de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales; de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos; de Gestión de Transporte y Almacenamiento; y de Gestión Comercial, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la facultad que se indica; Primero del ACUERDO por el que se levanta la suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus Órganos Administrativos Desconcentrados, publicado en el DOF el 24 de agosto de 2020; Tercero, fracción IV del ACUERDO por el que se hace del conocimiento del público en general los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos administrativos desconcentrados, con las excepciones que en el mismo se indican, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2020; ACUERDO por el que se hace del conocimiento del público en general las medidas que se establecen para coadyuvar en la disminución de la propagación del coronavirus COVID-19, así como los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos administrativos desconcentrados, con las excepciones que en el mismo se indican, publicado en el DOF el 25 de enero de 2021, y demás que resulten aplicables, esta Dirección General;





Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

**Unidad de Gestión Industrial**  
**Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**  
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1255/2021

Ciudad de México, a 30 de junio de 2021

**ACUERDA**

**PRIMERO.** - Para que esta autoridad se encuentre en posibilidad de tener por presentado el **INFORME**; se **PREVIENE** al **REGULADO** para que, en un término no mayor de **veinte días hábiles**, contados a partir de que surta efectos la notificación, exhiba en versión digital ante esta **AGENCIA** la información y documentación subsanada, atendiendo las prevenciones descritas en los **CONSIDERANDOS VI y VII** del presente oficio, para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 27 y 29 de los **LINEAMIENTOS** y 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

**SEGUNDO.** -El presente oficio no exime al **REGULADO** del cumplimiento de los **LINEAMIENTOS**, y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

**TERCERO.** - En atención a lo ordenado por el artículo 3 fracción XIV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con el artículo 4 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, se le hace saber al **REGULADO** que el expediente administrativo al rubro citado, se encuentra disponible para su consulta en las oficinas de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos ubicadas en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No.4209, Colonia Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

**CUARTO.** - Para tener por reconocido al **C. José Eduardo Estrada Ibarra** como apoderado legal de la empresa **IGASAMEX San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.**, deberá presentar el instrumento público con el cual acredite dicha personalidad, y copia de la identificación oficial vigente.

**QUINTO.** - En términos de los artículos 19, 35 y demás aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, notifíquese el presente acuerdo al **REGULADO**.

**ATENTAMENTE**  
**El Director General de Gestión de Procesos Industriales**

**Ing. David Rivera Bello**

NEON / AGJ

Folio: 060305/03/21

Página 12 de 12



AGENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE  
PROTECCIÓN AL MEDIOAMBIENTE DEL  
SECTOR HIDROCARBUROS  
UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS  
INDUSTRIALES



ASUNTO: CONTENSTACION AL OFICIO  
NO. ASEA/UGI/DGGPI/1271/2021 QUE  
PREVIENE LA PRESENTACIÓN DEL  
SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE  
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE  
IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA  
PARA IGASAMEX SAN JOSE ITURBIDE  
(OXICA)

TÍTULO DE PERMISO: G/21297/TRA/2018

CURR: ASEA-IAS17096C

AUTORIZACION: ASEA-IAS17096CC/BD0218

**José Eduardo Estrada Ibarra**, en mi carácter de apoderado legal de **IGASAMEX SAN JOSE ITURBIDE S. DE R.L.DE C.V.** personalidad que tengo debidamente **acreditada**, señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en

Domicilio, teléfono, correo electrónico del representante legal. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP



expongo:

Por medio del presente escrito, con fundamento en los artículos 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican, Artículo 29 fracción II. Fecha de publicación en Diario Oficial de la Federación (DOF): 2016-05-13. Fecha de entrada en vigor: 2016-05-14; así como lo establecido en los artículos 15, 15-A, 17-A, 49, 50, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en este acto vengo a hacer las siguientes manifestaciones:

## I. ANTECEDENTES.

**PRIMERO.** – Que en fecha 13 de mayo de 2016, esta H. Agencia publicó en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican (DACG). La citada DACG establece que:

“... ”

**Artículo 27.** *A partir del inicio de las actividades propias del Proyecto, el Regulado quedará obligado a la Implementación de su Sistema de Administración, con base en el Programa de Implementación presentado a la Agencia y a entregar los documentos a los que se refiere el Apartado B del Anexo IV de los presentes lineamientos, en los tiempos señalados.*

**Artículo 28.** *El Regulado deberá cumplir de manera permanente, durante todas las Etapas de Desarrollo del Proyecto, incluyendo*

*desmantelamiento y abandono, con las acciones definidas en el Anexo III, de los presentes lineamientos.*

**Artículo 29.** *A partir del inicio de operaciones de cada Proyecto, el Regulado deberá presentar a la Agencia los siguientes documentos:*

*Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación.  
(...)"*

**SEGUNDO.** - El **15 de mayo del 2017** está H. Agencia asignó a mi mandante la Clave Única de Registro de Regulado (CURR) **ASEA-IAS17096C** y, en misma fecha, entregó la Constancia de Registro de la Conformación de su Sistema de Administración.

**TERCERO.** – En el escrito de fecha 29 de noviembre del 2018 está H. Agencia, notifico a mi mandate el oficio de la referencia, a través del cual fue autorizado su Sistema de Administración a implementar en el **Proyecto, ubicado en el Municipio de Chocoma en el Estado de Yucatán**. En dicha autorización se establece en su **Término Quinto**, parte conducente, que:

***"... A partir de notificado el presente resolutive del PROYECTO, y de conformidad con el artículo 29 de los LINEAMIENTOS, el REGULADO deberá presentar a la AGENCIA los siguientes documentos:***

***I. Informes semestrales de cumplimiento del programa de implementación autorizado (...)***

La presentación de los informes de y/o reportes de seguimiento señalados en las fracciones que anteceden, deberán sujetarse por lo previsto por los Trámites:

***ASEA-00-026 Informes semestrales de cumplimiento al Programa de implementación del Sistema de Administración, ..."***


**CUARTO:** En fecha 08 de abril del 2021 se ingresó a esta H. Agencia el cumplimiento de obligación establecido para su programa de implementación.

**QUINTO.** - El día 30 de julio del 2021 recibimos el oficio número **NO. ASEA/UGI/DGGPI/1128/2021** mediante el cual se nos previno con la finalidad de complementar el primer informe semestral, en cumplimiento al Programa de Implementación presentado a la Agencia.


Conforme al orden establecido en el oficio señalado, se acude ante esta H Agencia para proceder a desahogar:

Requerimiento:	Ruta de ubicación de la información que se presenta para desahogar el requerimiento:	Acciones de las que consta el Desahogo:
----------------	--	---


Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

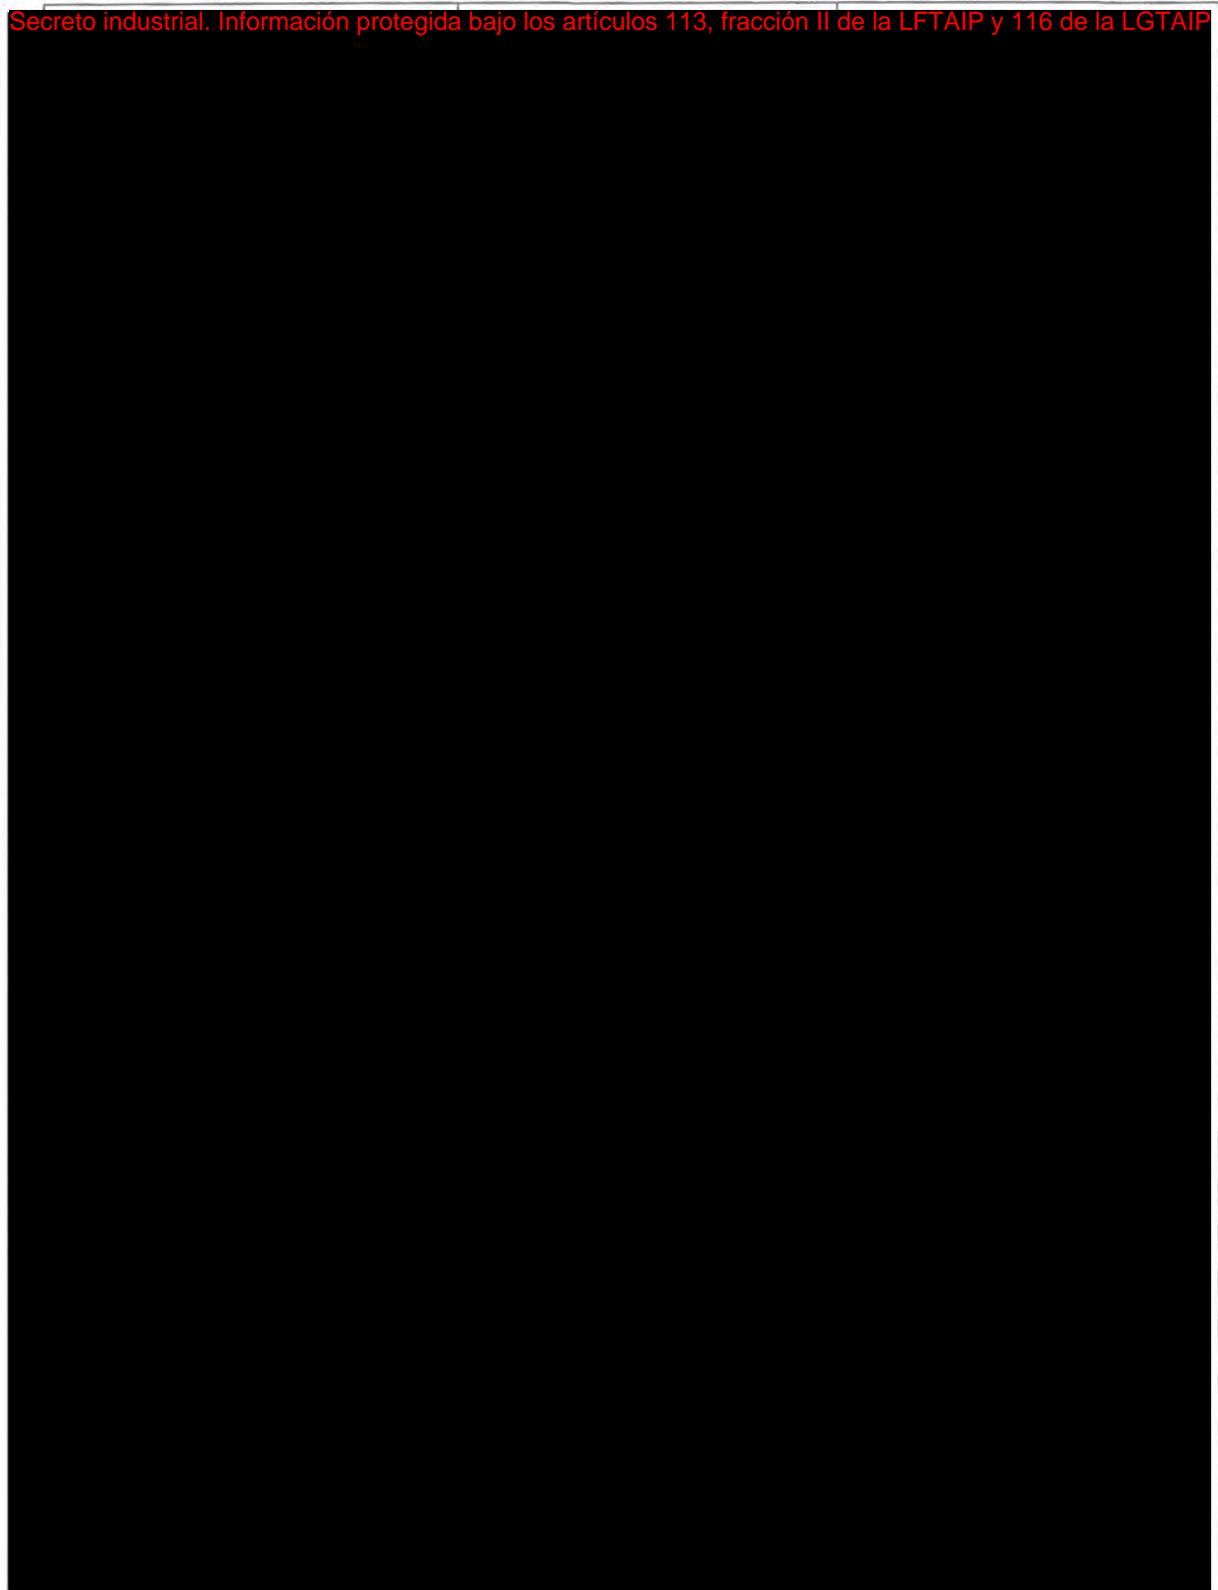


--	--	--

[Faded text in first column]	[Faded text in second column]	[Faded text in third column]
------------------------------	-------------------------------	------------------------------


Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

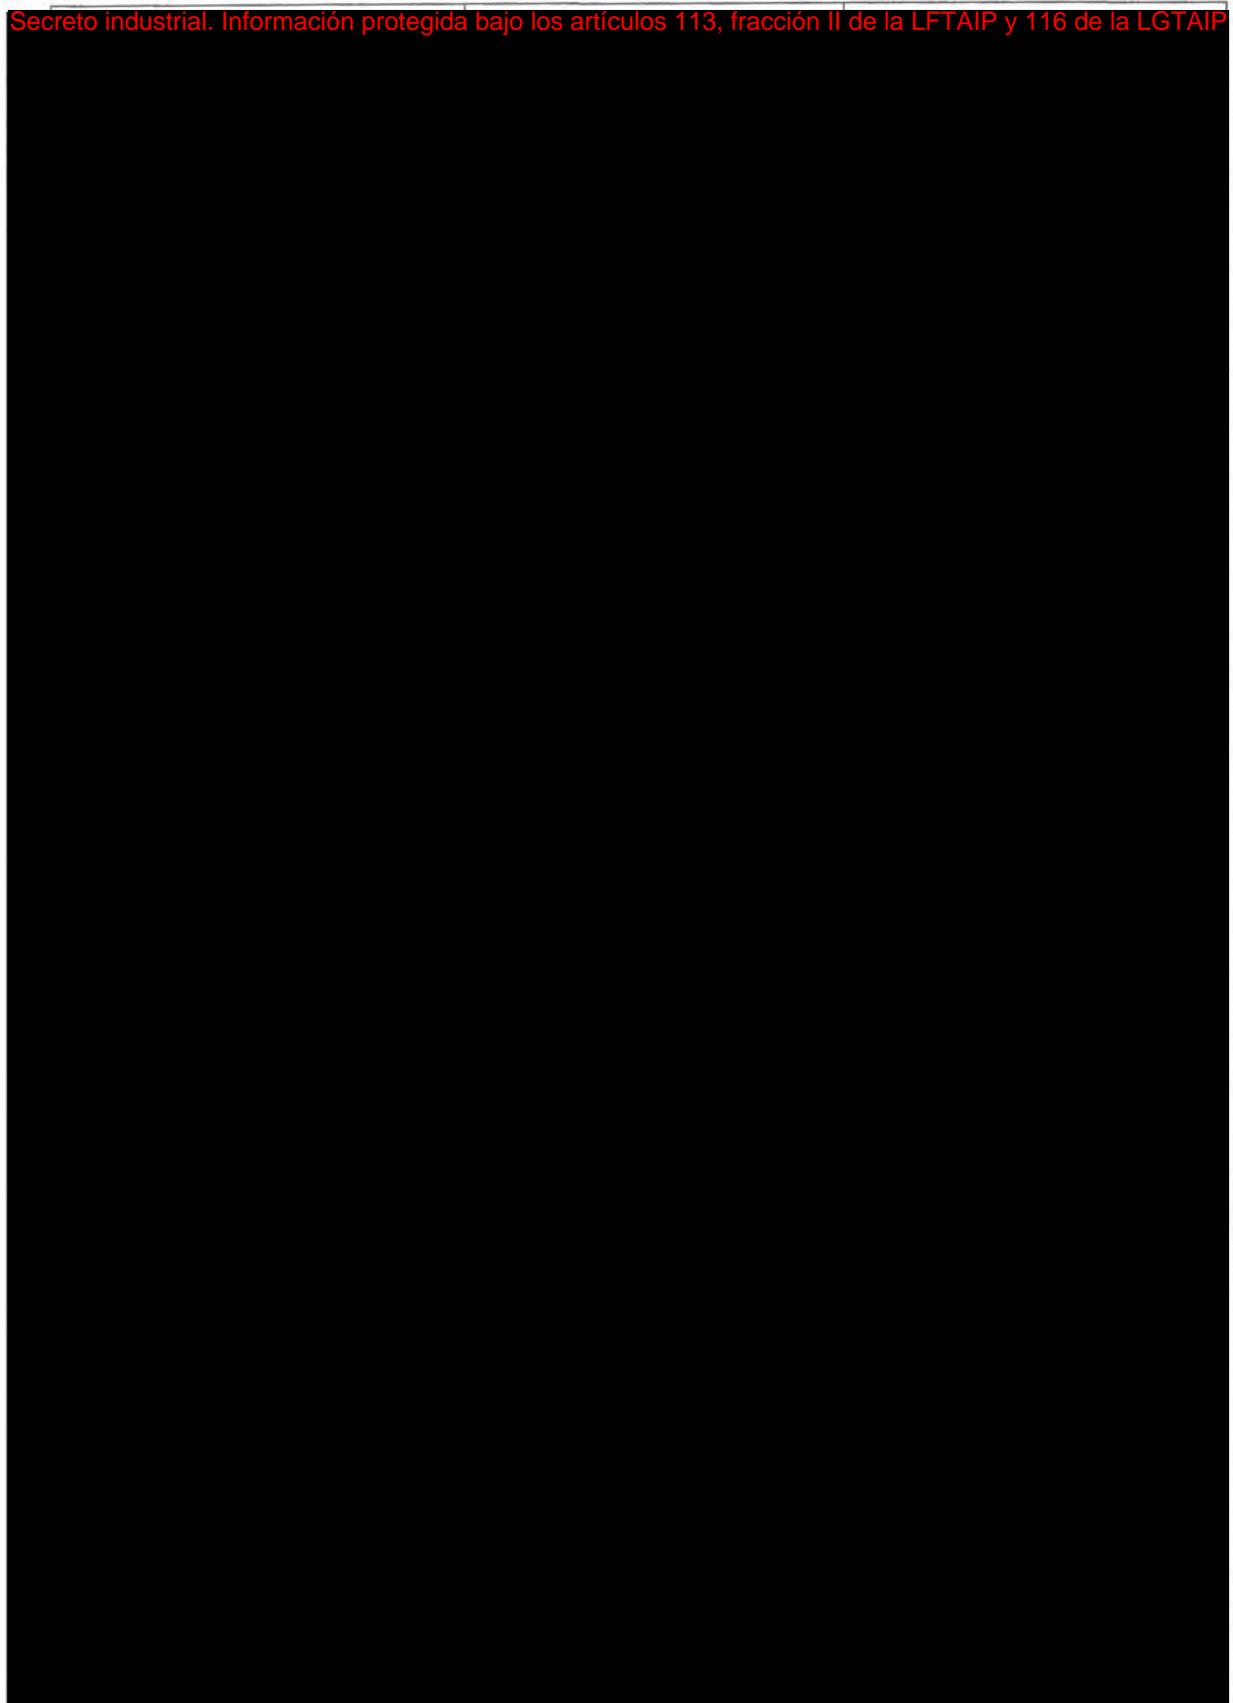


Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




--	--	--

<p>El presente es un documento de carácter confidencial y su contenido no debe ser divulgado a terceros sin el consentimiento expreso de la Secretaría de Economía.</p>	<p>Este documento contiene información de carácter confidencial y su divulgación a terceros sin el consentimiento expreso de la Secretaría de Economía puede causar daños a la competitividad y al desarrollo económico del país.</p>	<p>Se prohíbe expresamente la reproducción, distribución o uso no autorizado de esta información. Cualquier violación de esta política de confidencialidad será perseguida legalmente.</p>
---	---	--


Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

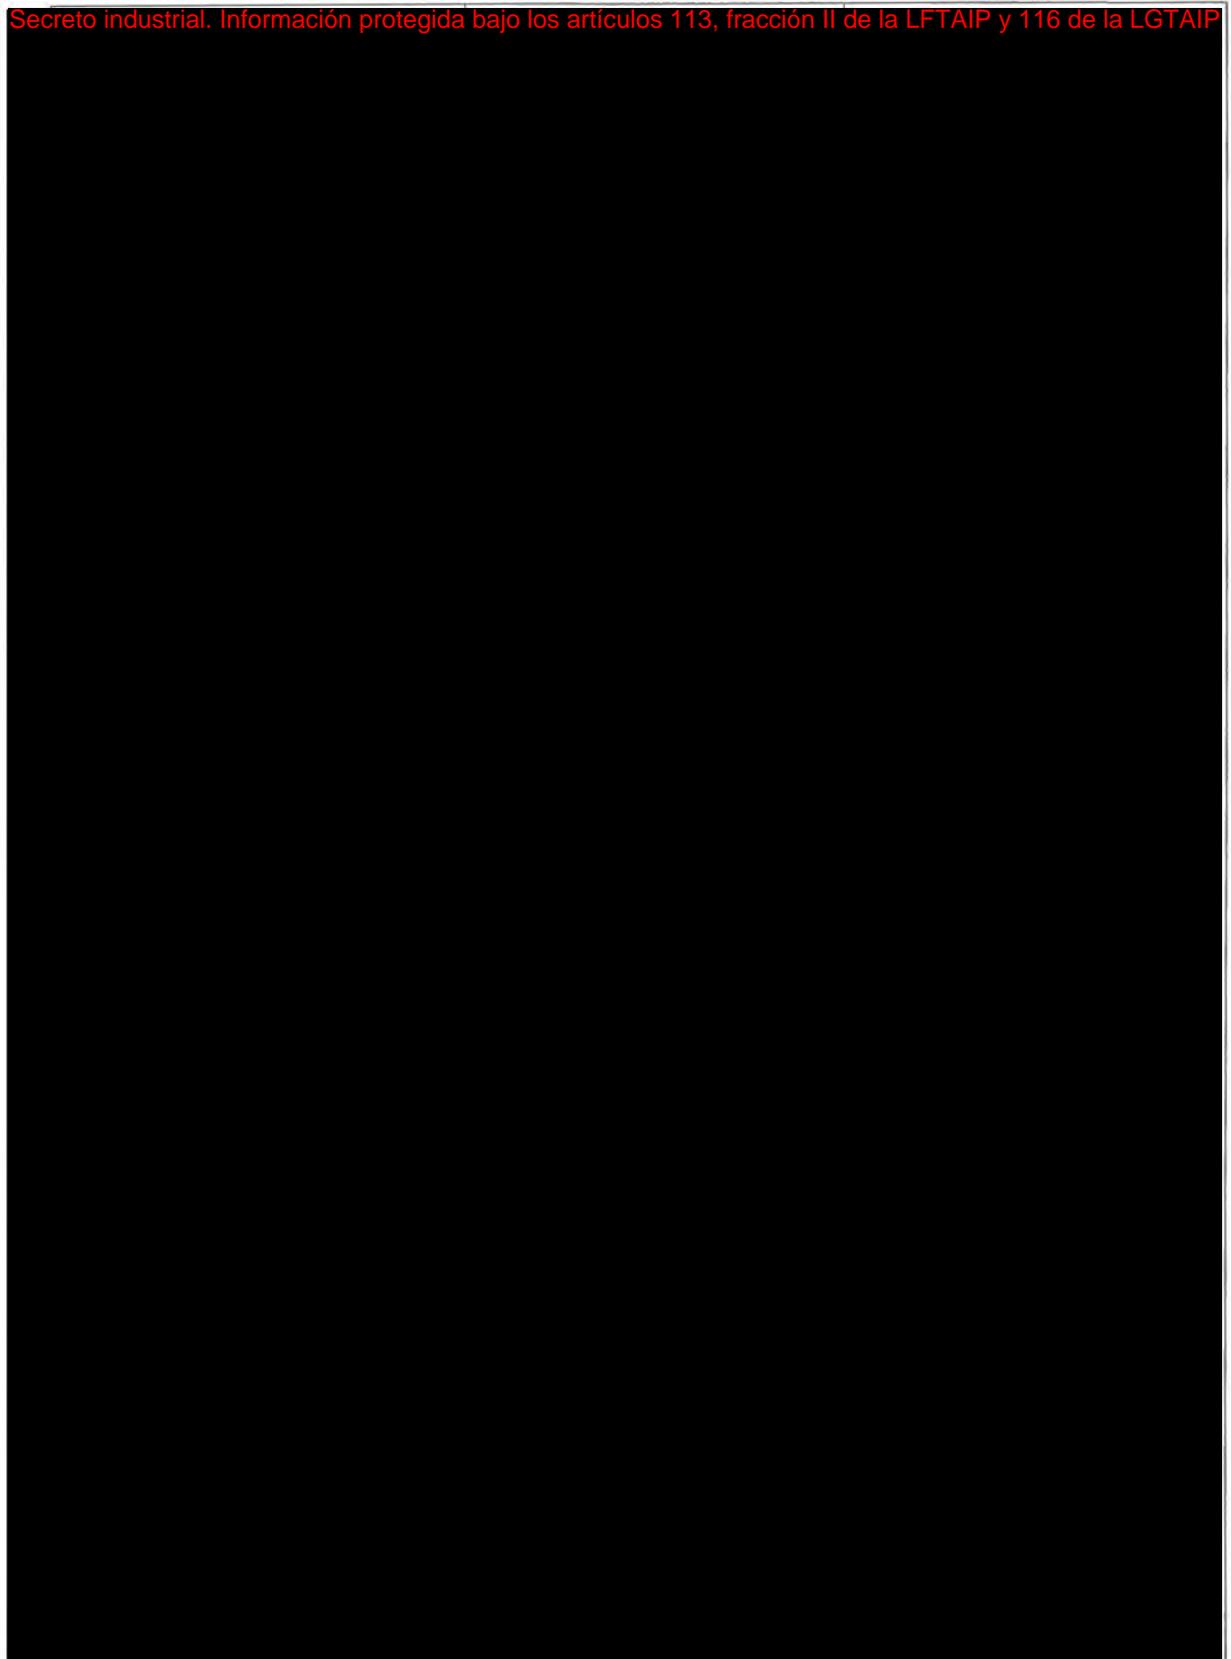

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

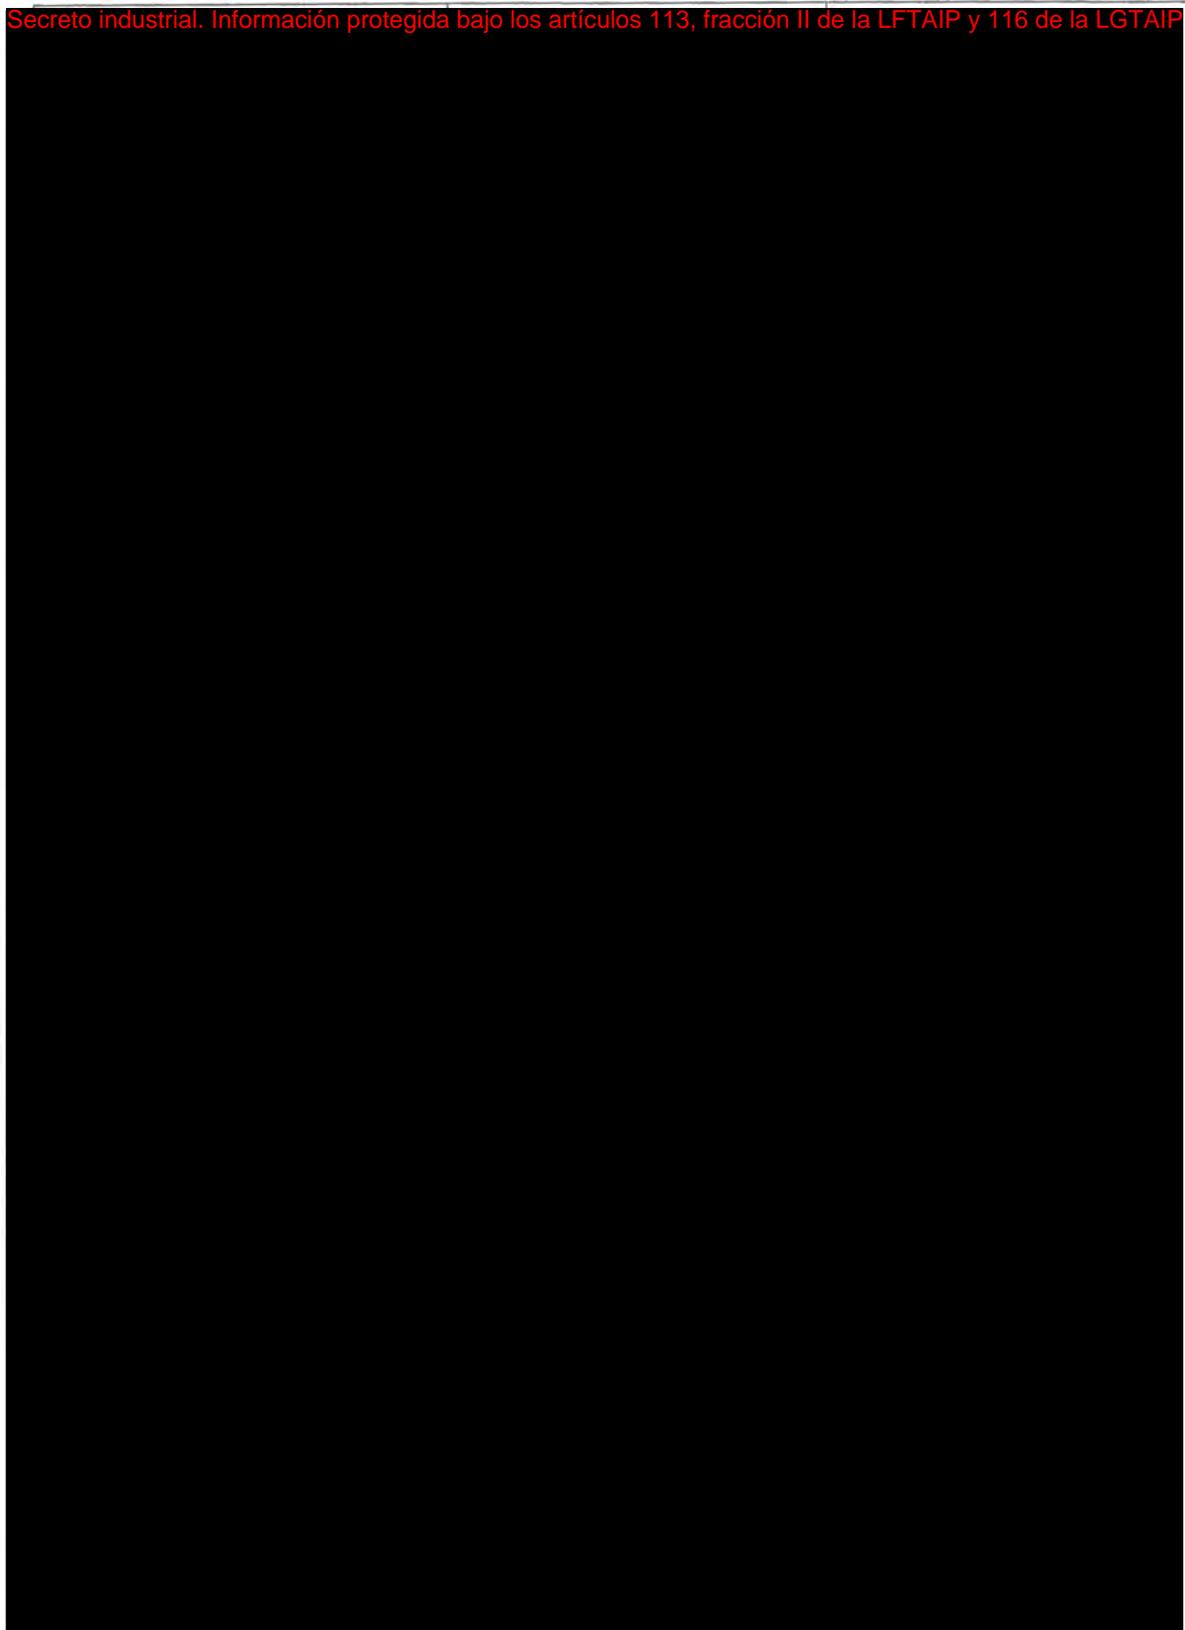


--	--	--

--	--	--


Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

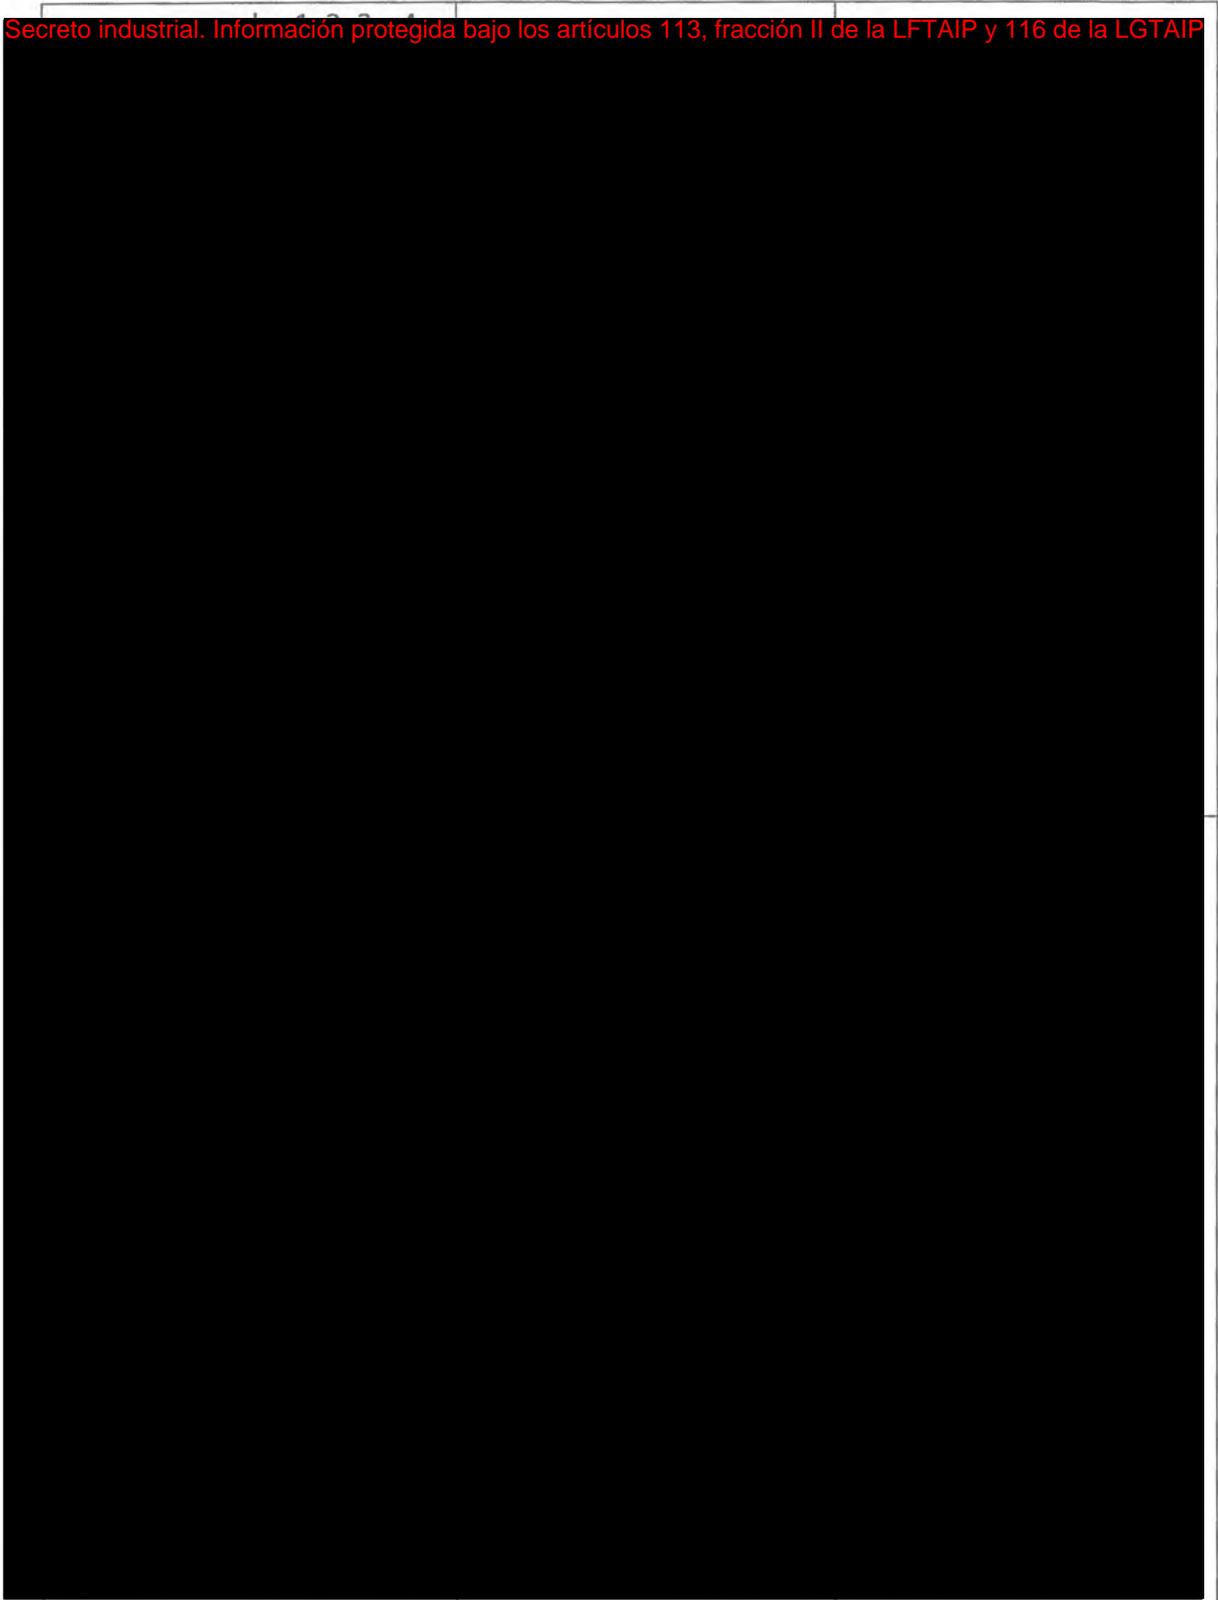


--	--	--


Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP





Por lo anteriormente expuesto, a usted **C. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS INDUSTRIALES.**

**PRIMERO.** – Tenerme por presentado en términos del presente escrito y con la personalidad con la que comparezco, por señalado el domicilio y medio alternativo para oír y recibir notificaciones y por autorizadas a las personas indicadas.

**SEGUNDO.** –Tener a mi representada por desahogado el requerimiento en tiempo y forma, así como, en su momento dar por cumplida la presente obligación.

**PROTESTO LO NECESARIO**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, vertical and diagonal strokes, positioned above a horizontal line.

**José Eduardo Estrada Ibarra  
APODERADO LEGAL**

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: OXICA

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de julio de 2020

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo contemplado en el Anexo III de la DACI de SASOPIA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASCEA-14517096G. Destacando que lo contemplado en el ANEXO 1, se concluyó en dicha CSAR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetas a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																															
Periodo de Implementación	1												2																																																	
Año	2019												2020																																																	
Mes	Diciembre			Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre																									
Semana	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	Responsables	Observaciones	Duración de la actividad	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / AÑO	% Avance
I. POLITICA	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado: Igsamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.  
 Proveedor: Oylea

Nombre de persona física, información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación  
 Fecha de inicio de implementación: 23 de julio de 2018  
 Fecha de cierre de implementación: 17 de julio de 2020

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo contemplado en el Anexo III de la DAGG de SASGPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASGA-1421-2006, destacando que lo contemplado en el Anexo III se desarrolló en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetas a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	Responsables	Observaciones	Duración de la actividad	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance	Periodo de Implementación																																																			
														2018													2019													2020																									
														Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																
I POLITICA	8													[Redacted]																																																			
	9													[Redacted]																																																			
	10													[Redacted]																																																			
	11													[Redacted]																																																			
	12													[Redacted]																																																			
	13													[Redacted]																																																			
	14													[Redacted]																																																			
	15													[Redacted]																																																			

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.  
 Proceso: Oxic

Nombre de persona física, información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-Jul-18  
 Fecha de cierre de implementación: 17-Jul-20

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOP, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASIA-4A317096C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																											
Periodo de Implementación	1		2																																																											
Año	2018											2019											2020																																							
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																									
Semana	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGO  Analizar el nivel de riesgo de la etapa de diseño conceptual	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: P-SIG-PP-01 Programa de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACS de SASGCPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.  
Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																	
Periodo de Implementación	1		2																																																	
Año	2018							2019							2020																																					
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																						
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGO	20	<p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 24px;">Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP</p>										

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																	
Periodo de Implementación	1		2																																																	
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre										
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGO												
	22											
	23											
	24											
	25											
	26											
	27											
	28											
	29											

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SABSOFA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetas a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapas	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Periodo de Implementación	1		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Año	2019												2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

# Programa de Implementación

Regulado: **Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
 Fecha de inicio de implementación: **23 de julio de 2018**  
 Fecha de cierre de implementación: **17 de julio de 2020**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACO de SASISPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-AS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetas a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	1												2																							
	Diseño						Construcción						Operación y Mantenimiento																							
Periodo de Implementación	Año																																			
	2018												2019												2020											
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio												
Semana	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6												

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (Semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance
III. REQUISITOS LEGALES												
	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oficina

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de julio de 2020

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASSOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURP: AS5A-14517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURP.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																																									
Periodo de implementación	1																								2																																															
AÑO	2015												2019												2020																																															
Mes	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio		
Semana	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance
III. REQUISITOS LEGALES												
	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											
	13											
	14											
	15											

Considerar los permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites que correspondan a las actividades reguladas y otros requisitos a los que se encuentren sujetos, cooperativas, de asociaciones y clientes y las que apliquen en las diferentes etapas del proyecto.

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oxica

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de julio de 2020

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASOFA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA317096C, descaucando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																					
	1												2																							
Periodo de Implementación	1																								2											
Año	2018												2019												2020											
Mes	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio					
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (Semana)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance
III. REQUISITOS LEGALES												
	15											
	17											
	18											
	19											

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oxica

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Clave del documento: P-SIG-PI-01 Programa de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de julio de 2020

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASOFA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASFA-AS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.  
Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																													
Periodo de implementación	1												2																																															
Año	2018												2019												2020																																			
Mes	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio					
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (Semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance
Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP												
III. REQUISITOS LEGALES												
	20											
	21											
	22											
	23											

#

#

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de julio de 2020

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SAGSOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-AS37096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 3 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción		Operación y Mantenimiento																																															
	Periodo de Implementación																																																			
Año	1														2																																					
	2018														2019														2020																							
Semana	Julio	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul															
		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance
------------	-----	----------------	-----------------------------	------------	---------------	------------------------------------	--------------	-----------	-----------------	-----------------	--------------	----------

III. REQUISITOS LEGALES

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Provincia: Oaxaca

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo II de la DACO de SASSOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-AS17056C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se concluyó en dicho CURR.  
Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																	
Periodo de implementación	1		2																																	
Año	2018												2019												2020											
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio					
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance	
IV. METAS, OBJETIVOS E INDICACIONES	1	[Redacted]											
	2	[Redacted]											
	3	[Redacted]											
	4	[Redacted]											
	5	[Redacted]											

*[Handwritten signatures]*

# Programa de Implementación

Regulado: **Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.**

Proyecto: **Oxica**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: **PSIG-PI-01 Programa de implementación**

Fecha de inicio de implementación: **23-jul-18**

Fecha de cierre de implementación: **17-jul-20**

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACS de SASSOPSA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASTA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se constituyó en dicha CURR.  
Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

	Etapa <b>Diseño</b>	Etapa <b>Construcción</b>	Etapa <b>Operación y Mantenimiento</b>																					
Periodo de implementación	1		2																					
Año	2018						2019						2020											
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
IV. METAS, OBJETIVOS E INDICACIONES												
	6											
	7											

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Orica

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																											
Periodo de Implementación	1		2																																																											
Año	2018												2019												2020																																					
Mes	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																									
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
<b>V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD</b>  Establecer las funciones, responsabilidades y el ámbito de autoridad y ámbito de competencia para la implementación, evaluar los riesgos y operación del Sistema de Administración, del cumplimiento de los planes y objetivos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente y de los resultados en caso de los eventos de trabajo y niveles jerárquicos de su organización, incluyendo contratos, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, verificar que las actividades impliquen riesgos para la población y las instalaciones o impactos al medio ambiente.	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oxica

Nombre de persona física, información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Nota: Este Programa de implementación busca desarrollarlo considerado en el Anexo III de la DACG de SASOFA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR, ASEA-AS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se concluyó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetas a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																	
Periodo de implementación	1												2																							
Año	2018												2019												2020											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio											
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25											

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD	7											
	8											
	9											

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

*[Handwritten signatures]*

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oxica

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS1709MC, destacando que lo considerado en el ANEXO I se concluyó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																	
Periodo de Implementación	1		2																																	
Año	2018												2019												2020											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio											
Semana	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25											

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD	10											
	11											
	12											
	13											
	14											

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Provisiones que el personal de la organización, así como el personal de los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, cumpla con los aspectos de seguridad industrial, seguridad Operativa y protección al medio ambiente considerados en los riesgos de comportamiento y ética de la organización.

  
Elaboró: Seydy Martínez  
Coordinador de CSyMA

  
Revisó: Angel Blas Pale Domínguez  
Coordinador de CSyMA

  
Revisó: Angel Blas Pale Domínguez  
Coordinador de CSyMA

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.  
 Proyecto: Oxtla

Nombre de persona física, información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave de documento: FSIIG-PP01 Programa de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de julio de 2020

Secreto industrial, información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de las DAZG de SASOOPSA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-14317996C, destacando que lo considerado en el ANEXO 3 se concluyó en fecha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapas	Diseño		Construcción		Operación y Mantenimiento	
	1	2	3	4	5	6
Período de implementación	2018				2019	
Año	2018				2019	
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Semana	30	31	1	2	3	4

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance	2018																																																			
														Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre															
VI. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO														[Redacted content]																																																			

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIIP y 116 de la LGTAIP

Algunas de las competencias del personal de la planta, así como de la personal de los centros de servicios y prestadores de servicios y proveedores, siempre que se requiera de sus actividades específicas para la producción de los productos o proyectos al medio ambiente en cumplimiento de los planes de desarrollo del Proyecto, con base en el plan y sus actividades de cumplimiento, identificación, monitoreo y mejoramiento continuo.

# Programa de Implementación

Regulado: **Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.**  
 Proyecto: **Oxica**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Fecha de inicio de implementación: **23 de julio de 2018**

Fecha de cierre de implementación: **17 de julio de 2020**

**Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIIP y 116 de la LGTAIP**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de las DACG de SASOIPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASGA-MSL7596C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se sancionó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetas a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapas	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																																									
	1												2																																																											
Período de Implementación	1																								2																																															
Año	2018																								2019																								2020																							
Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avanza
VI. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	1												
	2												

**Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIIP y 116 de la LGTAIP**

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Nombre de persona física: Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: P-310-1-01 Programa de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Nota: Este Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACS de SASSOVA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-44517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetas a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																	
Periodo de implementación	1		2																																																	
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
VII. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA		<p>Elaborarse por: Contratación, Contratos, y Operación</p> <p>1. Comunicar y difundir en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y gestión al medio ambiente, considerando los intereses sociales y funciones de la organización y a contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores los resultados de la operación del Sistema de Administración.</p> <p>2. Contribuir al sector de la organización a) La política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y gestión al medio ambiente. b) Los funciones, responsabilidades, autoridad y estructura de puestos y todo el personal de la organización: de contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios.</p> <p>3. Los riesgos propios del Proyecto:</p> <p>3.1 En Aspectos Ambientales significativos.</p> <p>3.2 En resultados legales, administrativos y otros requisitos aplicables al Proyecto.</p> <p>3.3 El cumplimiento de obligaciones y metas.</p> <p>3.4 Los resultados de las actividades operativas y eventos.</p> <p>3.5 Los resultados de la evaluación del Sistema sobre la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y gestión al medio ambiente.</p> <p>3.6 La gestión de resultados y las acciones que se desprenden de ésta.</p>										
		<p>1. Promover la participación y consulta de los involucrados en el Sistema de Administración en todos sus niveles y funciones, incluyendo contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios.</p> <p>2. Promover la participación y consulta del personal, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, al ser el resultado efectivo de los actos y actividades inherentes al trabajo.</p> <p>3. En la identificación y evaluación de riesgos y Aspectos Ambientales.</p> <p>4. En la investigación de incidentes y accidentes.</p> <p>5. En la Comisión de seguridad e higiene.</p> <p>6. En la selección y uso de equipo de protección personal (EPP).</p> <p>7. En otros eventos y acciones.</p>										

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

#

#

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.  
 Proyecto: Oriza

Nombre de persona física: Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DAFI de SASDOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: AGEA-AS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se concluyó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetas a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																	
Periodo de Implementación	I		II																																																	
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																											
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
VII. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA												
Dar atención, respuesta y seguimiento a solicitudes, requerimientos de información, dudas y sugerencias, casos problemáticos externos, relacionados con el Sistema de Administración a su campo												

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Orica

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo II de la DACO de SASBOP, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASIA-14517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 3 se concluyó en dicha CURR.  
La fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapas	Diseño		Construcción													Operación y Mantenimiento																							
	1													2																									
Periodo de Implementación	2018													2019													2020												
Año	2018													2019													2020												
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio							
Semana	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
VIII. Control de documentos y registros	1											
	2											
	3											
	4											

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oxica

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASOIPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA317096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
	Periodo de implementación												2																																							
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
VIII. Control de documentos y registros												

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oxica

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Nota: Este Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DAGG de SAS-SOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASJA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se concluyó en dicha CURR.  
Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
	Periodo de implementación																																																			
	1												2																																							
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
------------	-----	----------------	------------	---------------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	----------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES	1											
	2											
	3											
	4											

Definición: (controlar) operar, mantener e implementar las instalaciones, procesos, sistemas de seguridad y todo aquello relativo al proyecto, utilizando normas, códigos, estándares u otras regulaciones, especificaciones y procedimientos aceptados a nivel internacional, incluyendo negociación o desarrollo de estándares de ingeniería, requisitos, especificaciones, procedimientos de otros países, institutos, asociaciones o empresas.

*[Handwritten signatures]*

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oxica

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACS de SASISOP, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASGA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetas a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																					
	1												2																							
	2018												2019												2020											
Año	2018												2019												2020											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio				
Semana	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES	5	[Redacted]										

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

*[Handwritten signatures]*

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oxica

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Secretos industriales. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DAG de SASISOP, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR. ASEA-IA517056C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.  
La fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento
Periodo de implementación	1		
Año	2018		
Mes	2019		
Semana	2020		

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES												

Secretos industriales. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Asignar que el equipo y los instrumentos, así como los refacciones y partes de repuesto que se utilizan durante la ejecución del proyecto sean diseñados, fabricados, mantenidos, probados e instalados, cuando se requiera, conforme a normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y aceptadas a nivel internacional. Lo anterior, puede incluir requisitos de buenas prácticas, prácticas y actividades provenientes de otros países, institutos, asociaciones o empresas.

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.  
 Proveedor: Oxica

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de Implementación  
 Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18  
 Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DAG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR, ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se concluyó en dicha CURR.  
 Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetas a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
Periodo de Implementación	1												2																																							
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES	9											
	10											
	11											

# Programa de Implementación

Regulado: **Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.**

Proyecto: **Oxica**

Clave del documento: **PSIG-PI-01 Programa de implementación**

Fecha de inicio de implementación: **23-jul-18**

Fecha de cierre de implementación: **17-jul-20**

Nota: Este Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo II de la DACS de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR. ASFA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se concluyó en dicha CURR. Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento
	1	2	3
Período de implementación	2018	2019	2020
Año	2018	2019	2020
Mes	Diciembre	Enero	Febrero
Semana	30	31	1

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES												

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oxica

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Progma de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DAG de SASOFA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																						
Período de Implementación	1		2																						
Año	2018							2019							2020										
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Semana	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
<b>K. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS</b>												
	1											
	2											
	3											
	4											

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Ejecutar las actividades de Seguridad Industrial, Operativa y de generación al medio ambiente en la construcción, en caso de ser necesario, en la operación, mantenimiento, reparación, inspección, partes programadas y no programadas, en operación, mantenimiento, inspección y pruebas, entre otras, según el proyecto con base en el planeamiento técnico y práctico, según de trabajo documental, considerando los resultados del proceso de evaluación de riesgos y riesgo y control de contaminación. No requisitos legados aplicables.

*[Handwritten signatures in blue ink]*

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Orlon

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Nombre del documento: FICHA DE PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASOFA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-44517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se concluyó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																	
Período de Implementación	1		2																																																	
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS	5											
	6											
	7											
	8											
	9											

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.  
 Proyecto: Oxica

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación  
 Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18  
 Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SAGDOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASIA-14317095C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapas	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																	
Periodo de Implementación	1		2																																																	
Año	2018							2019							2020																																					
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS	10	Participación por										
	11	Contar con un mecanismo para la supervisión y autorización de la ejecución de trabajos de alto riesgo que estañe en análisis y verificación de condiciones de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente en trabajos de construcción, montaje, operación, mantenimiento, reparaciones y desarrollo de instalaciones, para actividades rutinarias y no rutinarias.										

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Handwritten signature and initials.

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Orica

Nombre de persona física: Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-Jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-Jul-20

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DAGS de SASOFA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-44317095C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetas a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																													
Periodo de Implementación	1											2																																																				
Año	2018											2019											2020																																									
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																																
Semana	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS												
	12			Realizar un análisis de seguridad de los trabajos. El análisis debe identificar tanto por el personal interno como por los contratistas subcontratistas, prestaciones de servicio o proveedores que participen en la planeación, programación y ejecución de los trabajos, utilizando un proceso Homologado.								
	13											
	14											
	15			Administrar, coordinar y comunicar cambios organizacionales de índole, estructural, metodológico, organizacional, en las actividades, variables del proceso, tecnológicas, instalaciones y equipos, procedimientos organizacionales y de personal (desarrollo organizacional) considerando el fundamento técnico del cambio, los impactos en los recursos humanos, Operativos y generar el medio ambiente, instalaciones o procedimientos, periodo de tiempo necesario para el cambio, recursos para su ejecución, considerando actualizaciones necesarias en la documentación de la información del proceso y la capacitación del personal.								
	17											

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Orica

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación  
 Fecha de inicio de implementación: 23-Jul-18  
 Fecha de cierre de implementación: 17-Jul-20

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASOFA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASGA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se concluyó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																					
Periodo de Implementación	1												2																							
Año	2018												2019												2020											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio				
Semana	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
K. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS	18											
	19											
	20											
	21											
	22											
	23											
	24											
	25											

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oxica

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DAGG de SASOFA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASZA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se concluyó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetas a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																	
Periodo de Implementación	1		2																																																	
Año	2018					2019												2020																																		
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
------------	-----	----------------	------------	---------------	------------------------------------	--------------	-----------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	----------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

<b>K. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS</b>												
Mantener y preservar qué el personal, incluyendo contratistas, debe empalmar, garantizar de verificación y proporcionar reportar actos y condiciones inseguras y peligrosos (trabajo u operaciones, cuando sean peligrosos o involucrados en riesgos inherentes de accidentes o incidentes)												
Registrar, atender y emitir recomendaciones por actos y condiciones inseguras reportadas, trabajo u operaciones, detección por riesgo de incidentes o accidentes.												





# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.  
 Proyecto: Oxica

Nombre de persona física, información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: P-SIS-1-101-Programa de implementación  
 Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18  
 Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Fecha de elaboración: 12 de marzo de 2018  
 Revisión: 3  
 Fecha de revisión: 2 de agosto de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASOCPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASIA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.  
 La fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapas	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																															
	1												2																																																	
Periodo de Implementación																																																														
Año	2018												2019												2020																																					
Mes	Diciembre			Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio				
Semana	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
<p><b>XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.</b></p> <p>Establecer mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueren de calidad, controlados, transportados, almacenados e instalados, de acuerdo al servicio para el cual serán usados.</p>												

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: **Cyias**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIIP y 116 de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Progrma de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Nota: Este Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																	
Periodo de Implementación	1		2																																																	
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
------------	-----	----------------	------------	---------------	------------------------------------	--------------	-----------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	----------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIIP y 116 de la LGTAIP

XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

Realizar el mantenimiento, inspecciones y pruebas, según la recomendaciones de fabricantes, y coordinadas con los ingenieros/asistentes de ingeniería aplicables y aplicando criterios de aceptación o rechazo.

*[Handwritten signatures]*

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Nombre de persona física: Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-Jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-Jul-20

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-14317096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																	
Período de Implementación	1		2																																																	
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.	13											
	14											
	15	Establecer un programa de auditorías de la integridad mecánica.										
	16											

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

N

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.  
 Proyecto: Oxica

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación  
 Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18  
 Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CJRR: ASFA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CJRR.  
 Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																	
Periodo de implementación	1		2																																																	
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
------------	-----	----------------	------------	---------------	------------------------------------	--------------	-----------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	----------

**Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP**

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V  
 Proyecto: Oxica

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nombre de persona física, información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación  
 Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18  
 Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACS de SASSOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
	Período de Implementación												2																																							
	1												2																																							
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
<b>III. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS</b>												
<p>Se requieren por el desempeño:</p> <p>Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección ambiental en las comunidades, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios en todos los Escanos de Desarrollo del Proyecto.</p> <p>Establecer en los contratos o en cualquier acuerdo de voluntad que celebre con los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, siempre que su actividad implique riesgo para la población o las instalaciones o equipos al medio ambiente, que todos estos concuerden con el Sistema de Administración que cumple con los requisitos establecidos por la Agencia en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente o se genere el Sistema de Administración.</p> <p>Seleccionar a contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios considerando su desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección del medio ambiente, evaluando entre otros:</p> <p>1) El historial de incidentes y accidentes.</p> <p>2) Los indicadores de desempeño de Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente.</p> <p>3) La capacitación del personal que permita garantizar las actividades y administrar la Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente.</p> <p>4) La experiencia en la materia, en cuanto de su capacidad técnica.</p> <p>5) Que la empresa cumpla con la legislación aplicable.</p> <p>6) Los términos de Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente para la asignación de las comunidades subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, por escrito y acordados de acuerdo.</p> <p>Incluir en el contrato o cualquier otro acuerdo de voluntad que celebre, las funciones y responsabilidades del personal de la empresa contratista, subcontratista, proveedor y prestador de servicios para la administración de la Seguridad Industrial, Operativa y protección del medio ambiente, si correspondiere, en la materia y control de los riesgos al personal y personal, a la comunidad y al medio ambiente.</p> <p>Actualizar el programa de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente del territorio, subcontratista, proveedor y prestador de servicios, de acuerdo con la información de los accidentes ocurridos en el territorio y sus causas.</p> <p>Mantener los registros de incidentes del personal contratista, subcontratista, proveedor y prestador de servicios, de acuerdo con las actividades que desarrollen.</p>	1											
	2											

*[Handwritten signature]*



# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oxica

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR-ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetas a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																													
Periodo de Implementación	1		2																																																													
Año	2018												2019												2020																																							
Mes	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul																																
Semana	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
------------	-----	----------------	------------	---------------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	----------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Preparar y operar los mecanismos de respuesta para los escenarios de emergencia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente que se presenten durante los diferentes Etapas de Desarrollo del proyecto.

*[Handwritten signature]*

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oxica

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 3 se concluyó en dicho CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
	1		1												1																																					
	2018		2019												2020																																					
Año	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																																
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad	Periodicidad	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	6											
	7											
	8											
	9											
	10											

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.  
 Proyecto: Oxica

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación  
 Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18  
 Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Nota: Este Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR-ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.  
 Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetas a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapas	Diseño		Construcción		Operación y Mantenimiento																																															
	1														2																																					
Periodo de implementación	2018														2019														2020																							
Año	2018														2019														2020																							
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	11											
	12			Contar con los recursos necesarios para atender a favor frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el plan de contingencia y el más probable.								
	13											
	14			Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que puedan presentarse durante los diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto.								
	15			Contar con un sistema de operación a emergencias donde la organización realice sus actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta y control de una posible emergencia.								
	17											

*[Handwritten signatures and initials]*

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: OXICA

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Nota: Este Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo II de la DAG de SASISOP, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASIA-1A517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetas a la fecha de autorización del Sistema de Administración.



REQUISITOS	NO.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance	Periodo de implementación																																																			
													2018													2019													2020																									
													Año																																																			
													Mes																																																			
													Semana																																																			
XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	18	Ejecutar y evaluar actividades operativas de respuesta para los diversos casos de emergencias posibles, incluyendo el plan de acción de esta fase, dando seguimiento y cumplimiento a las acciones de mayor relevancia.			18								[Detailed weekly progress grid for 2018-2020]																																																			
													[Detailed weekly progress grid for 2018-2020]																																																			
Disponer de equipos, recursos y sistemas de respuesta a emergencias y actividades paralizadas, así como el plan de acción de esta fase, dando seguimiento y cumplimiento a las acciones de mayor relevancia.	20	Acciones de respuesta a emergencias y actividades paralizadas, así como el plan de acción de esta fase, dando seguimiento y cumplimiento a las acciones de mayor relevancia.			20								[Detailed weekly progress grid for 2018-2020]																																																			
													[Detailed weekly progress grid for 2018-2020]																																																			

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación  
 Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18  
 Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISQPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se concluyó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																	
Periodo de Implementación	1		2																																																	
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	21	Selección de personal...										
	22	Operación y mantenimiento...										
	23	Revisión periódica periódica de los equipos y sistemas de emergencia.										

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.  
 Proyecto: Oxica  
 Responsable del Sistema de Administración: José Eduardo Estrada Ibarra  
 Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación  
 Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18  
 Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISCPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 3 se concluyó en dicha CURR.  
 Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																	
Periodo de implementación	1		2																																																	
Año	2018												2019												2020																											
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																				
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
------------	-----	----------------	------------	---------------	------------------------------------	--------------	-----------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	----------

**Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP**

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oxica

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Progrma de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-Jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-Jul-20

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo contemplado en el Anexo III de la DACG de SASISCPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo contemplado en el ANEXO I se concluyó en dicha CURR.  
Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa  
Periodo de Implementación  
Año  
Mes  
Semana

Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																					
1												2																																							
2018												2019												2020																											
Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre															
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
------------	-----	----------------	------------	---------------	------------------------------------	--------------	-----------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	----------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

XIV. Monitoreo, Verificación y Evaluación.

	1											
	2											
	3											
	4											
	5											

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.  
 Proyecto: Oxica

Nombre de persona física, información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación  
 Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18  
 Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SAGSOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASZA-AS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.  
 Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa  
 Período de Implementación  
 Año  
 Mes  
 Semana

Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																									
1														2																																									
2018														2019																												2020													
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																			
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
XIV. Monitoreo, Verificación y Evaluación.												
participación de los empleados												

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: OXICA

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASOIPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CLRR: ASEA-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CLRR.  
Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapas  
Periodo de Implementación  
Año  
Mes  
Semana

Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																							
1														2																							
2018												2019												2020													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
------------	-----	----------------	------------	---------------	------------------------------------	--------------	-----------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	----------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

XIV. Monitoreo, Verificación y Evaluación.												


Elaboró: Seydy Martínez Hernández  
Coordinador de CSyMA

Revisó: Angel Elias Pale Domínguez  
Coordinador de CSyMA

Autorizó: Saul Ortiz Reyes  
Coordinador de CSyMA

# Programa de Implementación

Regulado: **Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.**  
 Proyecto: **Oxita**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: **PSIG-PI-01 Programa de implementación**  
 Fecha de inicio de implementación: **23-jul-18**  
 Fecha de cierre de implementación: **17-jul-20**

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SAS/SOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se condujo en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño			Construcción												Operación y Mantenimiento																																														
	1			2																																																										
	2018												2019												2020																																					
Año	2018												2019												2020																																					
Mes	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																									
Semana	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
<b>XV. AUDITORÍAS</b>												
	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIIP y 116 de la LGTAIP


# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: **[Redacted]**

**[Redacted]**

Clave del documento: **1-SIS-1601** Programa de implementación  
 Fecha de inicio de implementación: **23-jul-18**  
 Fecha de cierre de implementación: **17-jul-20**

**[Redacted]**

Nota: Este Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACO de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEH-HAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se condujo en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.



REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	N Avance	Periodo de Implementación																																																														
													2018													2019													2020																																				
													Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio														
													Semana	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

**Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP**

XV. AUDITORIAS

**[Redacted Content]**

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

División: Civil

Nombre de persona física: Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación hasta desarrollarlo lo considerado en el Anexo III de la DACG de SAS/SOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-AS1709AC, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetas a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																															
	1												2																																																	
Periodo de Implementación	2018												2019												2020																																					
Año	2018												2019												2020																																					
Mes	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre																												
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
------------	-----	----------------	------------	---------------	------------------------------------	--------------	-----------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	----------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIIP y 116 de la LGTAIP

**XVII. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES:**

Registrar, investigar, analizar, identificar las causas, dar seguimiento hasta el cumplimiento de las recomendaciones y comunicar los incidentes y accidentes que ocurran durante cualquiera de las etapas de su Proyecto, considerando las actividades del propio Pagador así como la de sus contratistas o subcontratistas.

Asignar personal competente para realizar la investigación de los incidentes y accidentes.

Integrar grupos de investigación de incidentes y accidentes que incluyan al personal relacionado con el evento, así como contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio cuando sea necesario.

Aplicar Metodología de Uso y reconocimiento nacional o internacional para realizar la investigación de incidentes o accidentes, hasta la identificación de las causas que son origen del evento.

Identificar en cada investigación de incidente o accidente que realice las causas que dieron origen al evento.

Establecer las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes para favorecer que éstos no se repitan.

Cumplir las recomendaciones, acciones correctivas y acciones preventivas que se deriven de la investigación del incidente o accidentes.

Comunicar los resultados de la investigación y del cumplimiento de recomendaciones, acciones correctivas y preventivas al personal que participa en el Proyecto, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, que por sus actividades pueden tener relación con el evento.

Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y recomendaciones emitidas.

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oxíca

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-Jul-18  
 Fecha de cierre de implementación: 17-Jul-20

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASGA-HAS1709SC, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																	
Periodo de Implementación	1												2																							
Año	2018												2019												2020											
Mes	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul					
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES:												
	5											
	7	Implementar y aplicar un mecanismo para favorecer la apertura y cultura de reporte de incidentes y accidentes.										
	8											
	9	Comenzar a la Agencia los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución del proyecto.										

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIIP y 116 de la LGTAIP

*[Handwritten signatures and initials]*

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proveído: Ovilas

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Secretario industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Clave del documento: 1-SIS-1001 Programa de implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Nota: Este Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DMCG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-INS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																	
	1												2																																			
Periodo de implementación	2018																								2019												2020											
Año																																																
Mes																																																
Semana																																																

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (comenzar)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
------------	-----	----------------	------------	---------------	-------------------------------------	--------------	-----------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	----------

XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES:	Secretario industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP											
	[Redacted content]											

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: **[REDACTED]**

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Clave del documento: P50-PI-01 Programa de Implementación  
 Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18  
 Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SAISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-MS1709C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapas	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																															
	Periodo de implementación 1												2																																																	
Año	2018												2019												2020																																					
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																										
Semana	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
------------	-----	----------------	------------	---------------	------------------------------------	--------------	-----------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	----------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

XVII. REVISIÓN DE RESULTADOS	1											
	2											
	3											
	4											
	5											

# Programa de Implementación

Regulado: Igesamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Nombre de persona física, información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Proyecto:

Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23-jul-18

Fecha de cierre de implementación: 17-jul-20

Secreto industrial, información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo B de la DACG de SASIOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CLBB: ASEA14517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se construyó en dicha CLBB.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapas	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																					
	1												2																							
Periodo de Implementación	2018												2019												2020											
Año	2018												2019												2020											
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio					
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Responsables	% Avance
------------	-----	----------------	------------	---------------	------------------------------------	--------------	-----------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	----------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

XVII. REVISIÓN DE RESULTADOS												
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oxyca

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de julio de 2020

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo II de la DACS de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR; ASSE-IAS17096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetas a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																													
Periodo de Implementación	1												2																																																			
Año	2018												2019												2020																																							
Mes	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																													
Semana	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance
<b>XVIII. INFORME DE DESEMPEÑO</b>												
	1											
	2	Elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes de la organización.										
	3											
	4	Presentar los resultados de la evaluación del desempeño a las autoridades competentes.										
	5	Determinar las causas de periodicidad para mejorar la evaluación del desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.										
	6											

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.  
 Proyecto: Oxica

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP  
 Clave del documento: PSIS-PI-01 Programa de Implementación  
 Fecha de inicio de implementación: 23 de julio de 2018  
 Fecha de cierre de implementación: 17 de julio de 2020

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DMCG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA317096C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se constató en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño	Construcción	Operación y Mantenimiento																																																																																		
Periodo de Implementación	1											2																																																																									
Año	2018											2019											2020																																																														
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																																																						
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance
<small>Establecer las acciones a tomar para mejorar la adherencia y efectividad del Sistema de Administración</small>	7											
	8											
	9											
	10											

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

# Programa de Implementación

Regulado: Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Oxica

Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 23 de julio de 2018

Fecha de cierre de implementación: 17 de julio de 2020

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SAS/SOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-IA517096C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapas	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																							
	1												2																																									
Periodo de Implementación	2018																								2019												2020																	
Año																																																						
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																							
Semana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	Observaciones	Duración de la actividad (semanas)	Periodicidad	Ubicación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance
	11											
	12											

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP


**Igasamex San Jose Iturbide, S. de R.L. de C.V. (Oxica)**

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Página: 1 de 1

**Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y  
Protección al Medio Ambiente**

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



**Jose Eduardo Estrada Ibarra**  
**Representante Legal**

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

	Revisión: 14

**TABLA DE CONTENIDO**

- 1.0 Propósito
- 2.0 Alcance
- 3.0 Referencia
- 4.0 Responsabilidades
- 5.0 Procedimiento
- 6.0 Definiciones
- 7.0 Registros de Calidad
- 8.0 Anexos

**DISTRIBUCIÓN**

Electrónicamente mediante el repositorio de información

<p><b>HISTORIA DE REVISIÓN</b>                  Cuando este documento sea modificado o editado, llenar la columna de revisión siguiente y brevemente Describir los cambios hechos en un párrafo corto debajo de la tabla</p>	
	15
	16


Nombres y firmas de las personas físicas. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

---

---

Revisión:	Fecha de elaboración	Página:	No. de Procedimiento
-----------	----------------------	---------	----------------------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




---

---

Revisión:	Fecha de elaboración	Página:	No. de Procedimiento
-----------	----------------------	---------	----------------------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

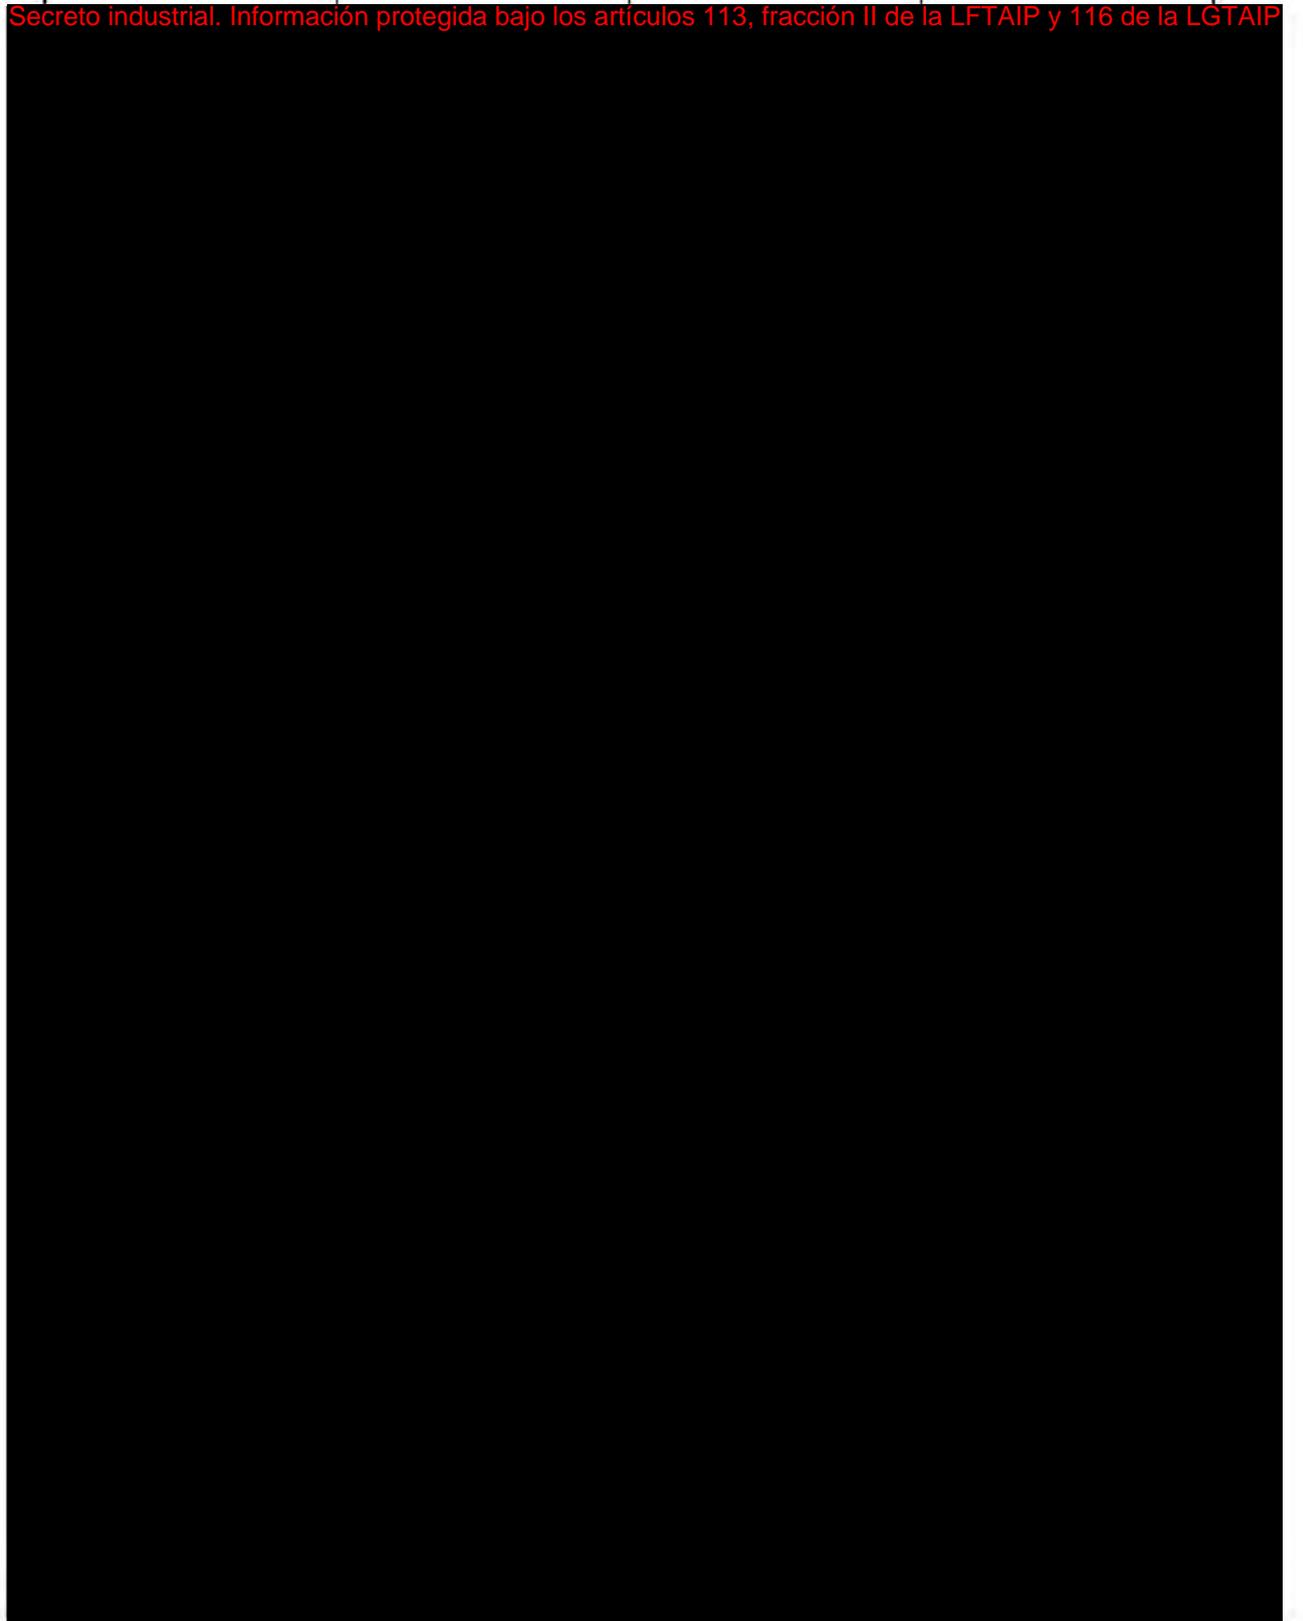


---

---

Revisión:	Fecha de elaboración	Página:	No. de Procedimiento
-----------	----------------------	---------	----------------------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

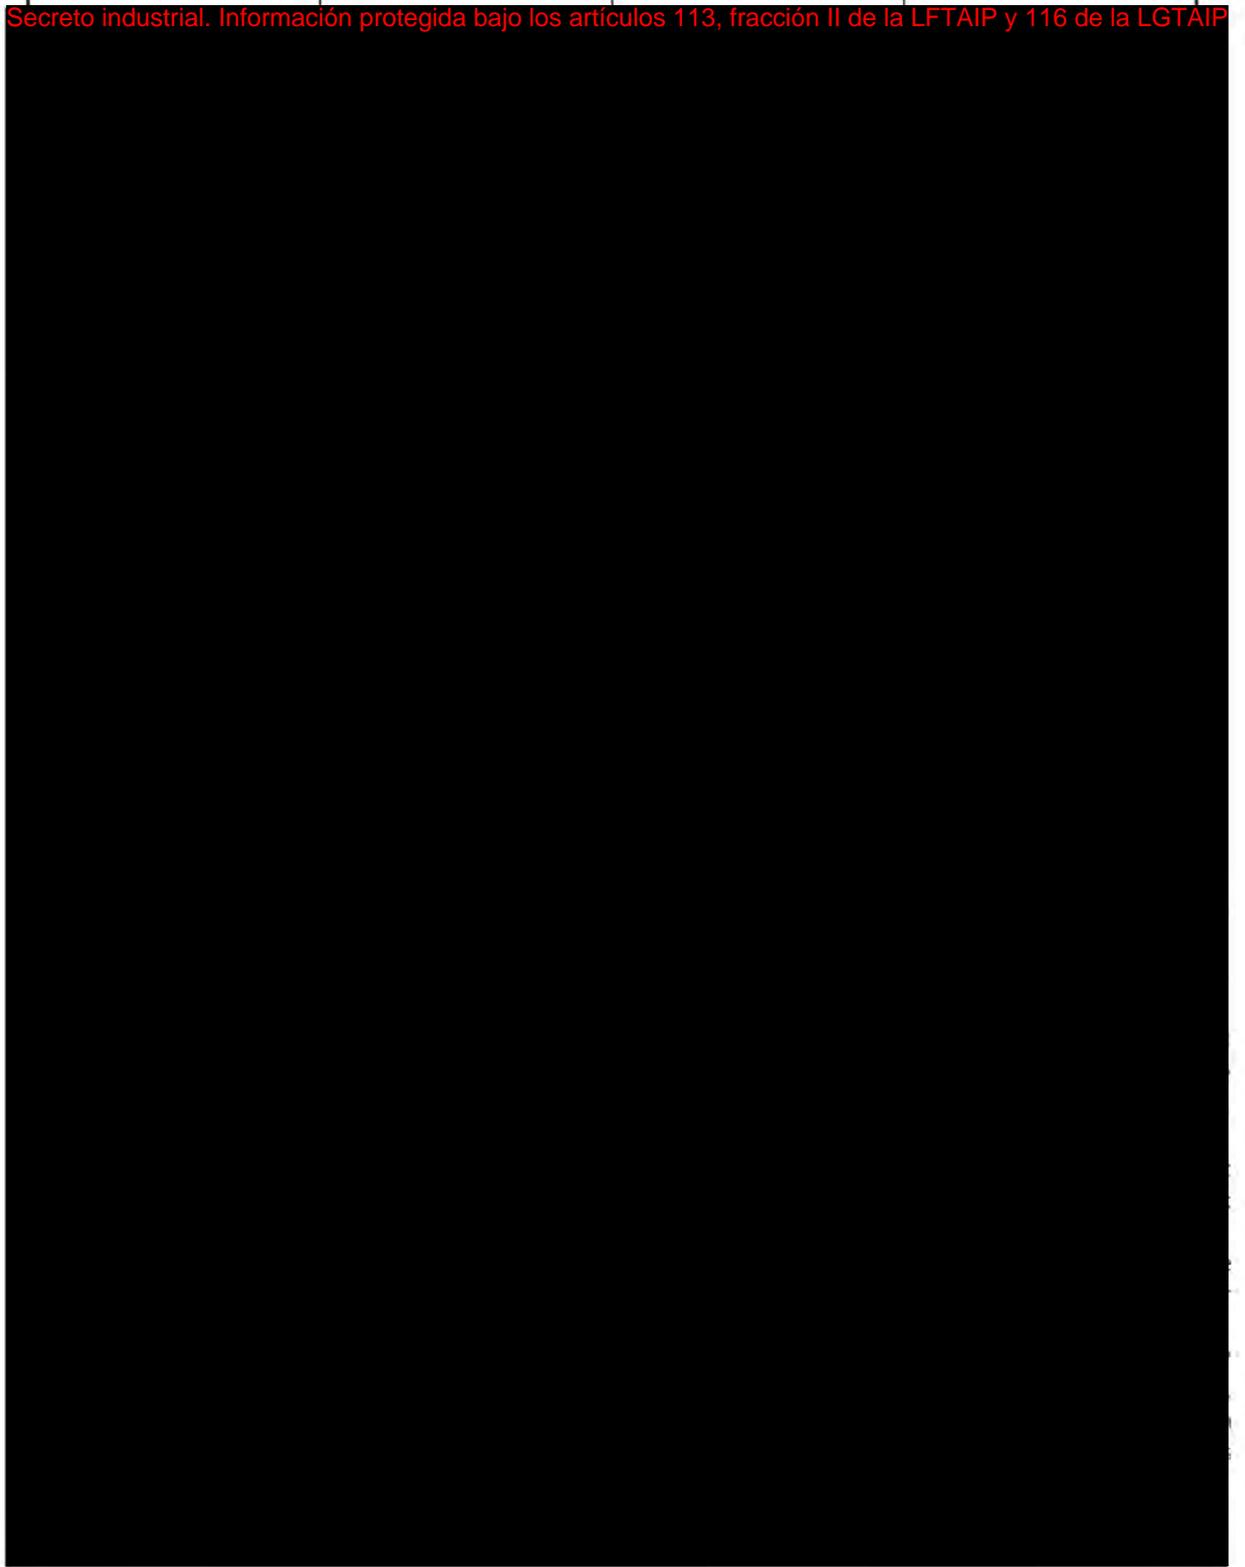


---

---

Revisión:	Fecha de elaboración	Página:	No. de Procedimiento
-----------	----------------------	---------	----------------------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP




---

---

Revisión:	Fecha de elaboración	Página:	No. de Procedimiento
-----------	----------------------	---------	----------------------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

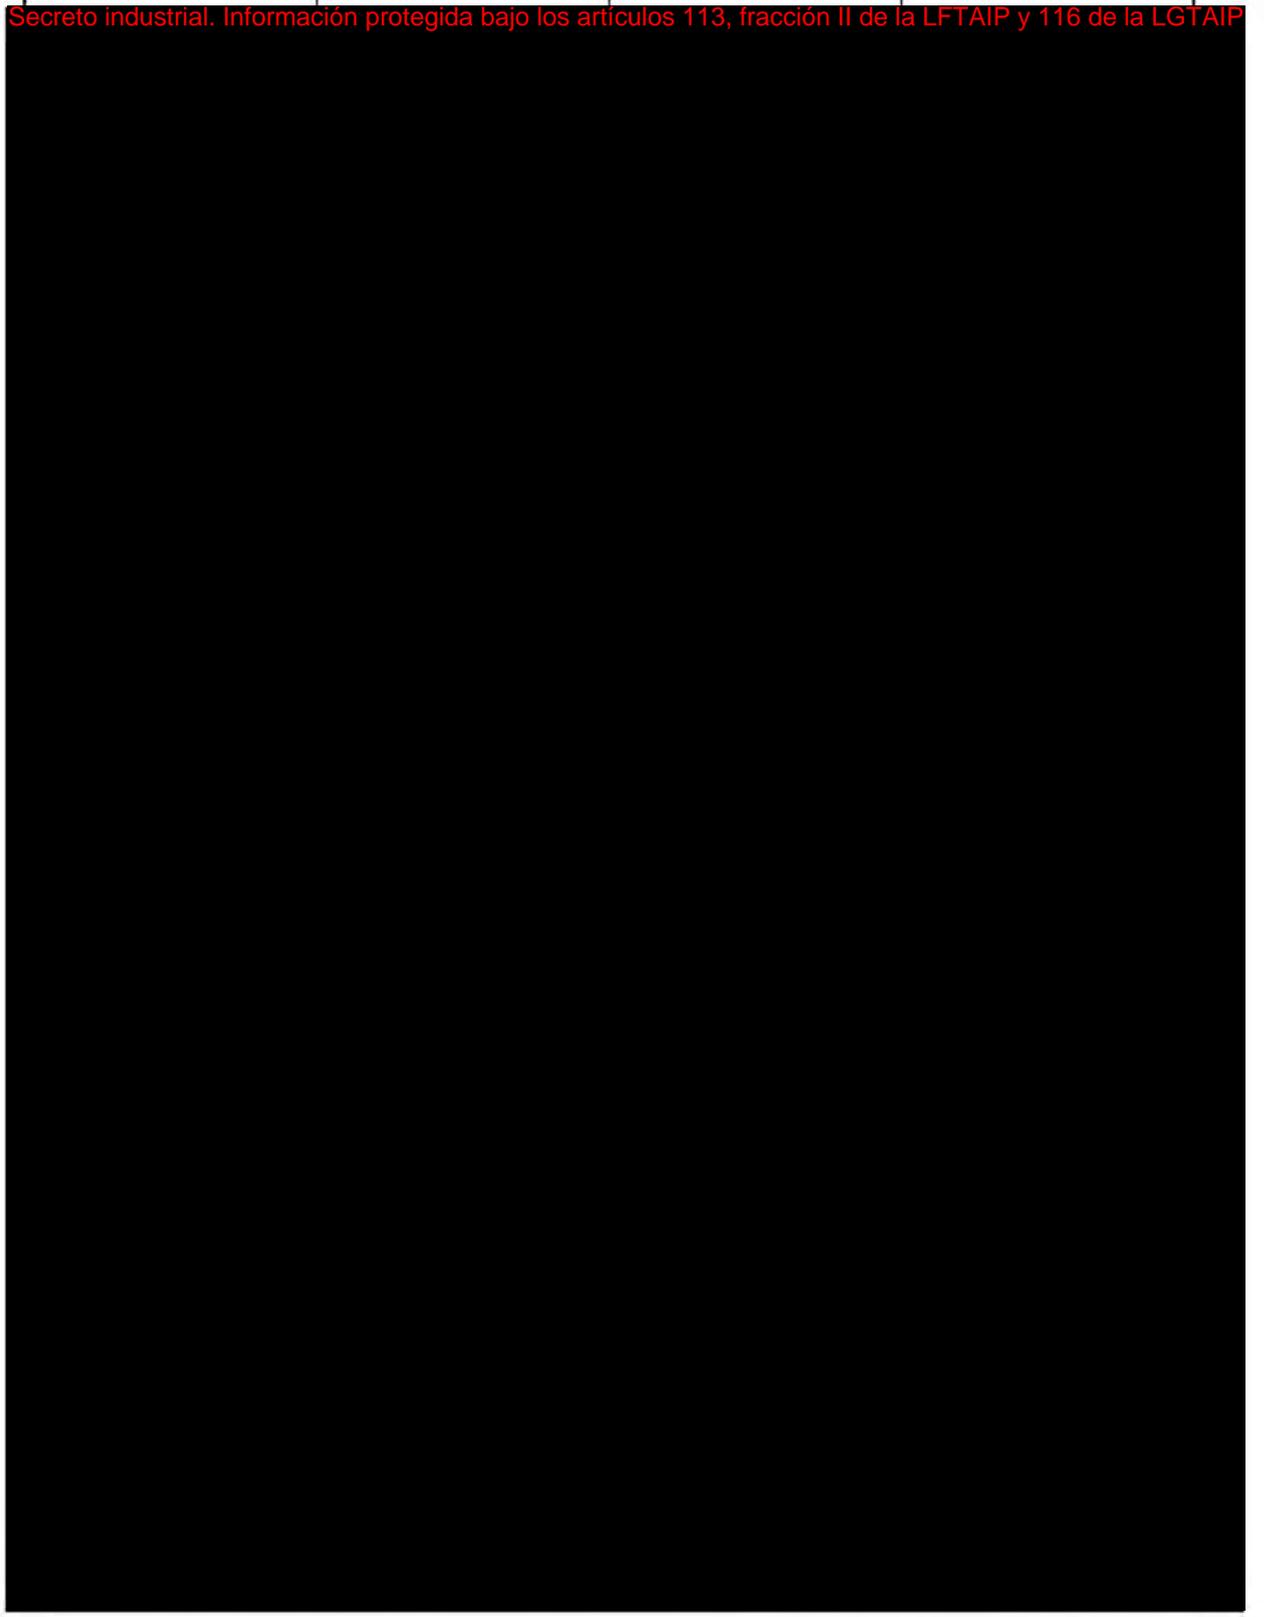


---

---

Revisión:	Fecha de elaboración	Página:	No. de Procedimiento
-----------	----------------------	---------	----------------------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

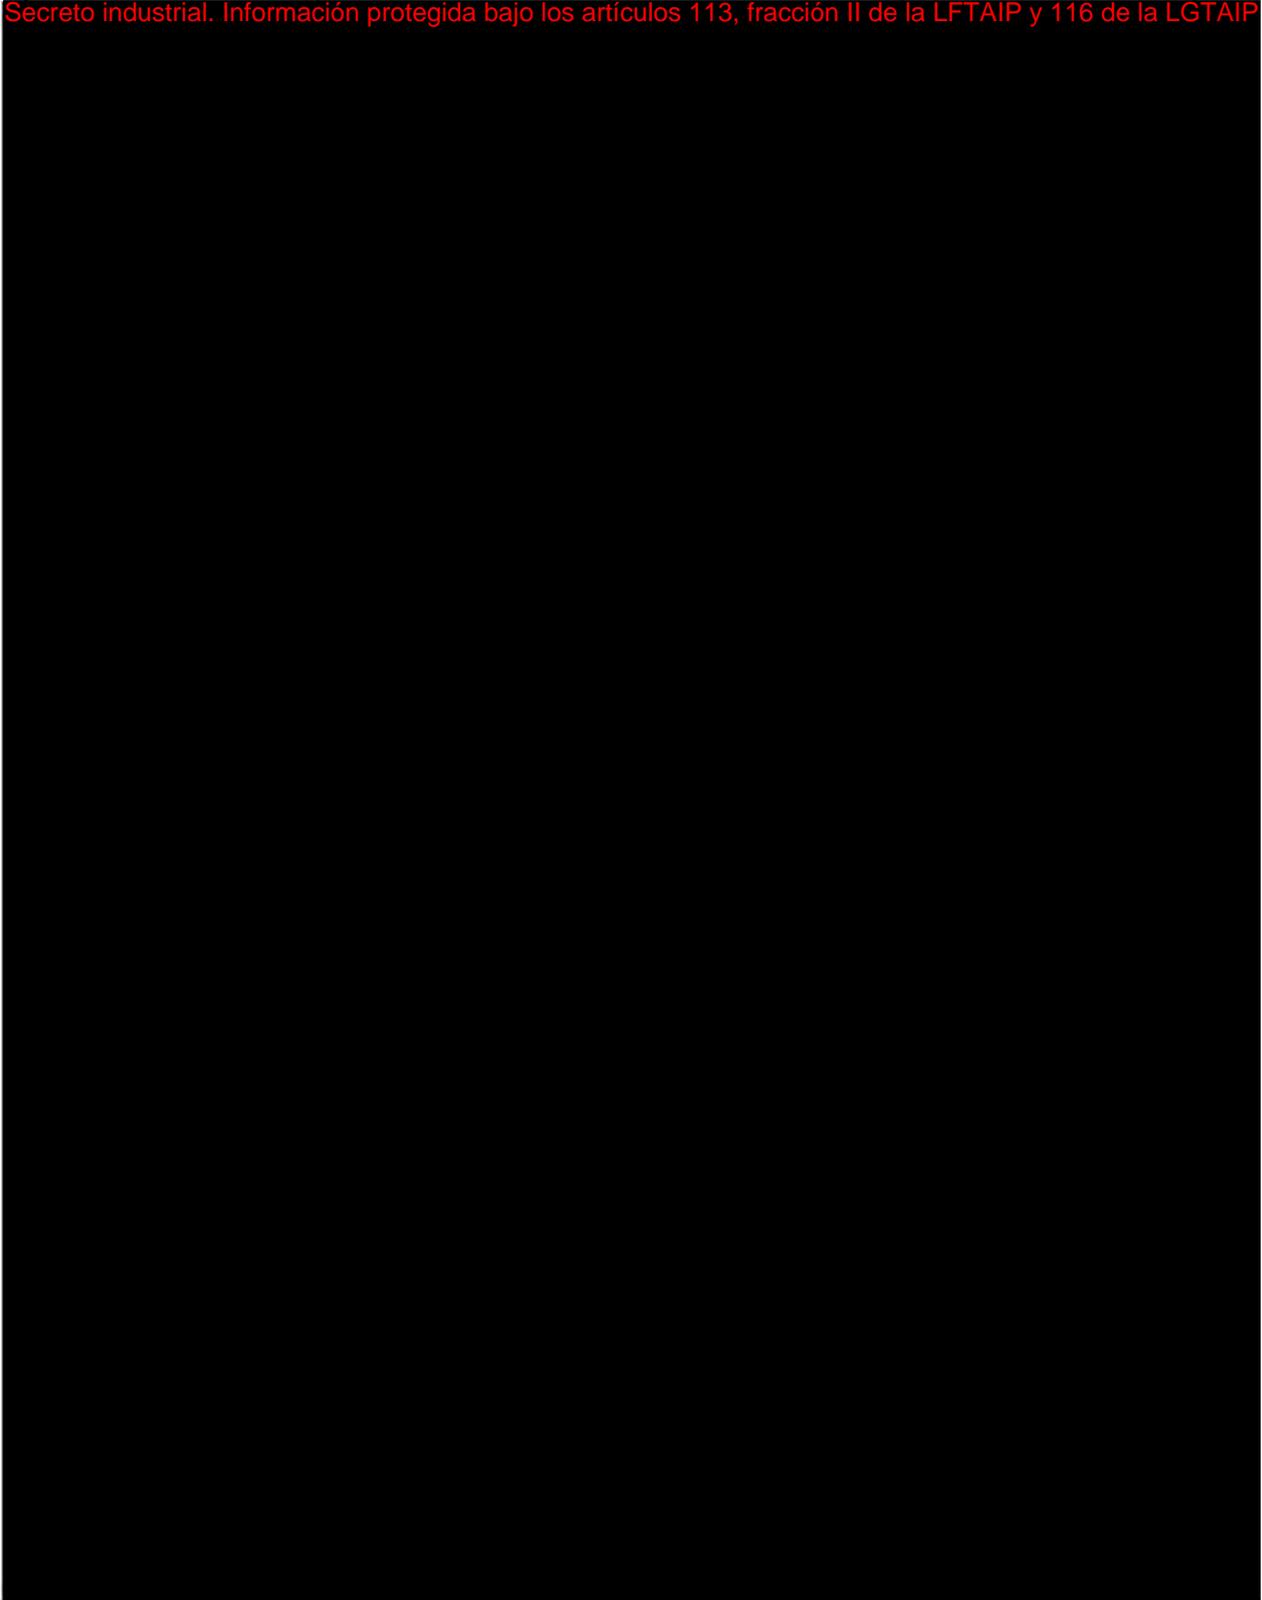


---

---

Revisión:	Fecha de elaboración	Página:	No. de Procedimiento
-----------	----------------------	---------	----------------------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

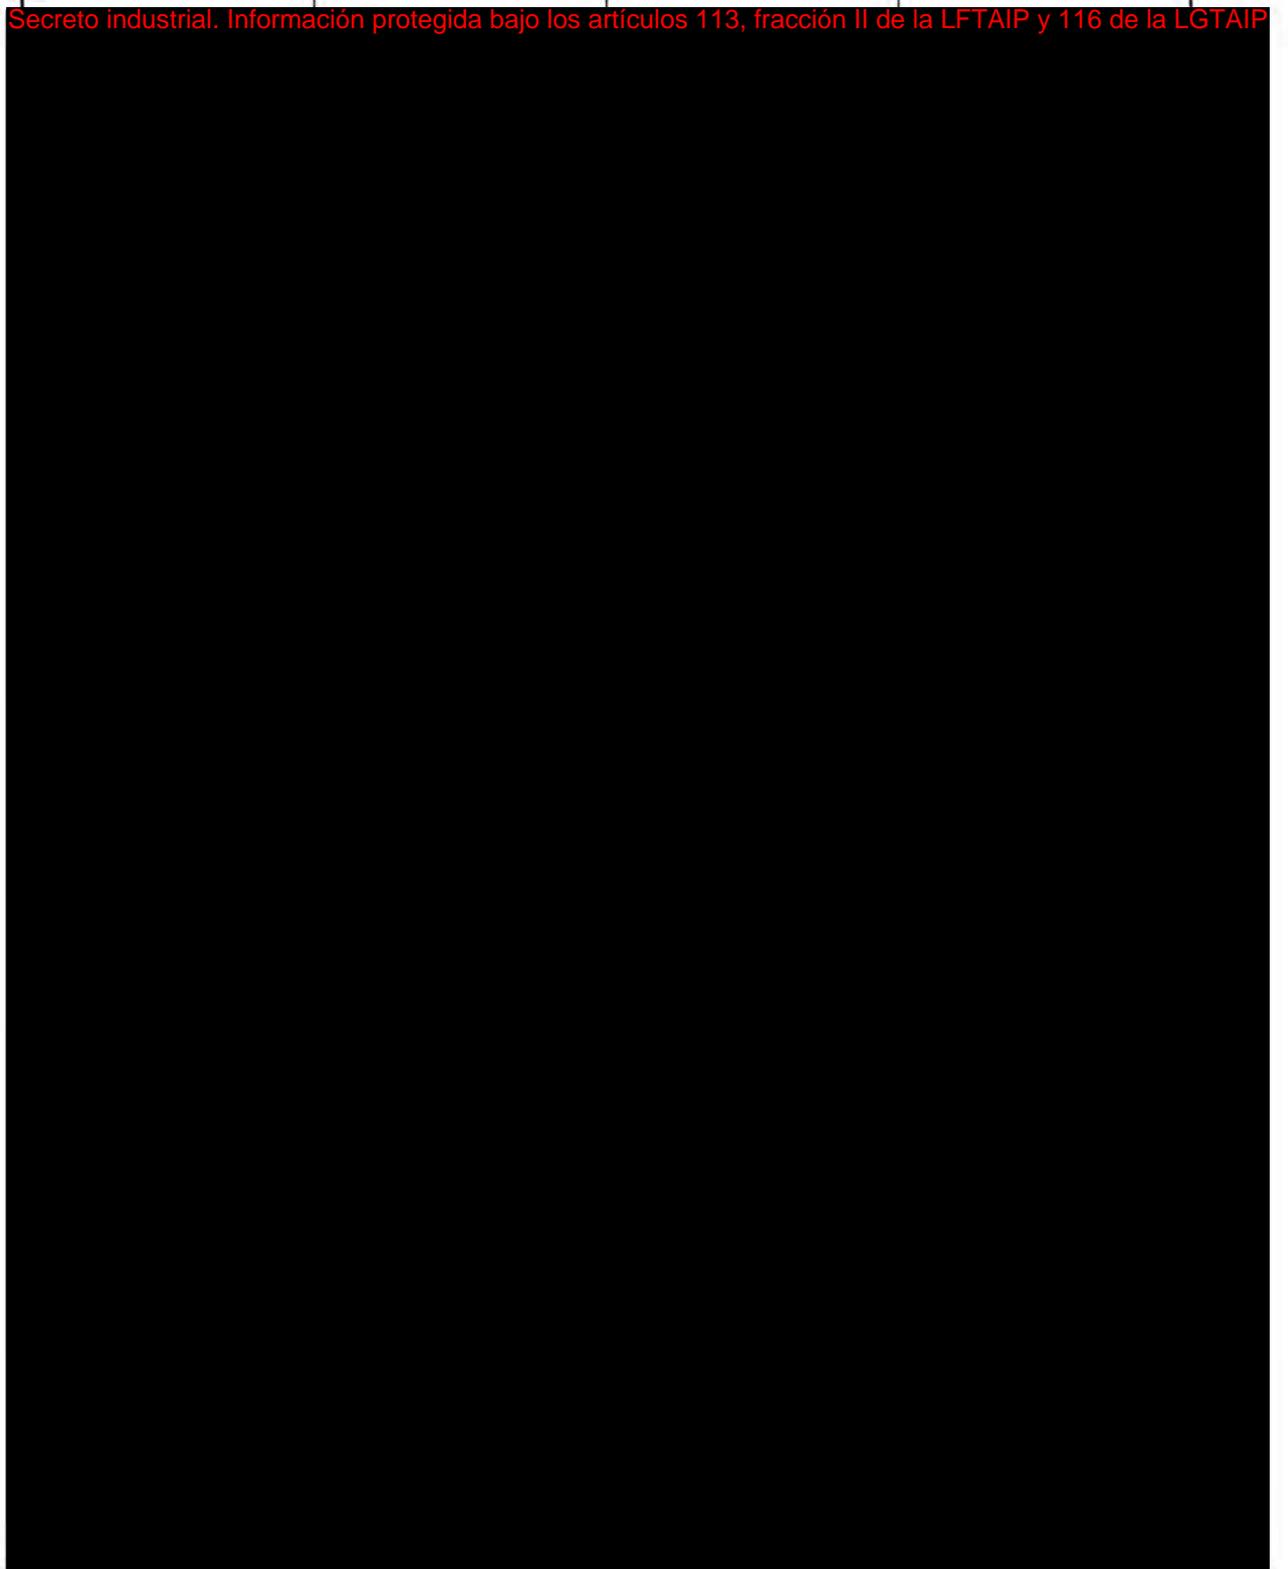


---

---

Revisión:	Fecha de elaboración	Página:	No. de Procedimiento
-----------	----------------------	---------	----------------------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

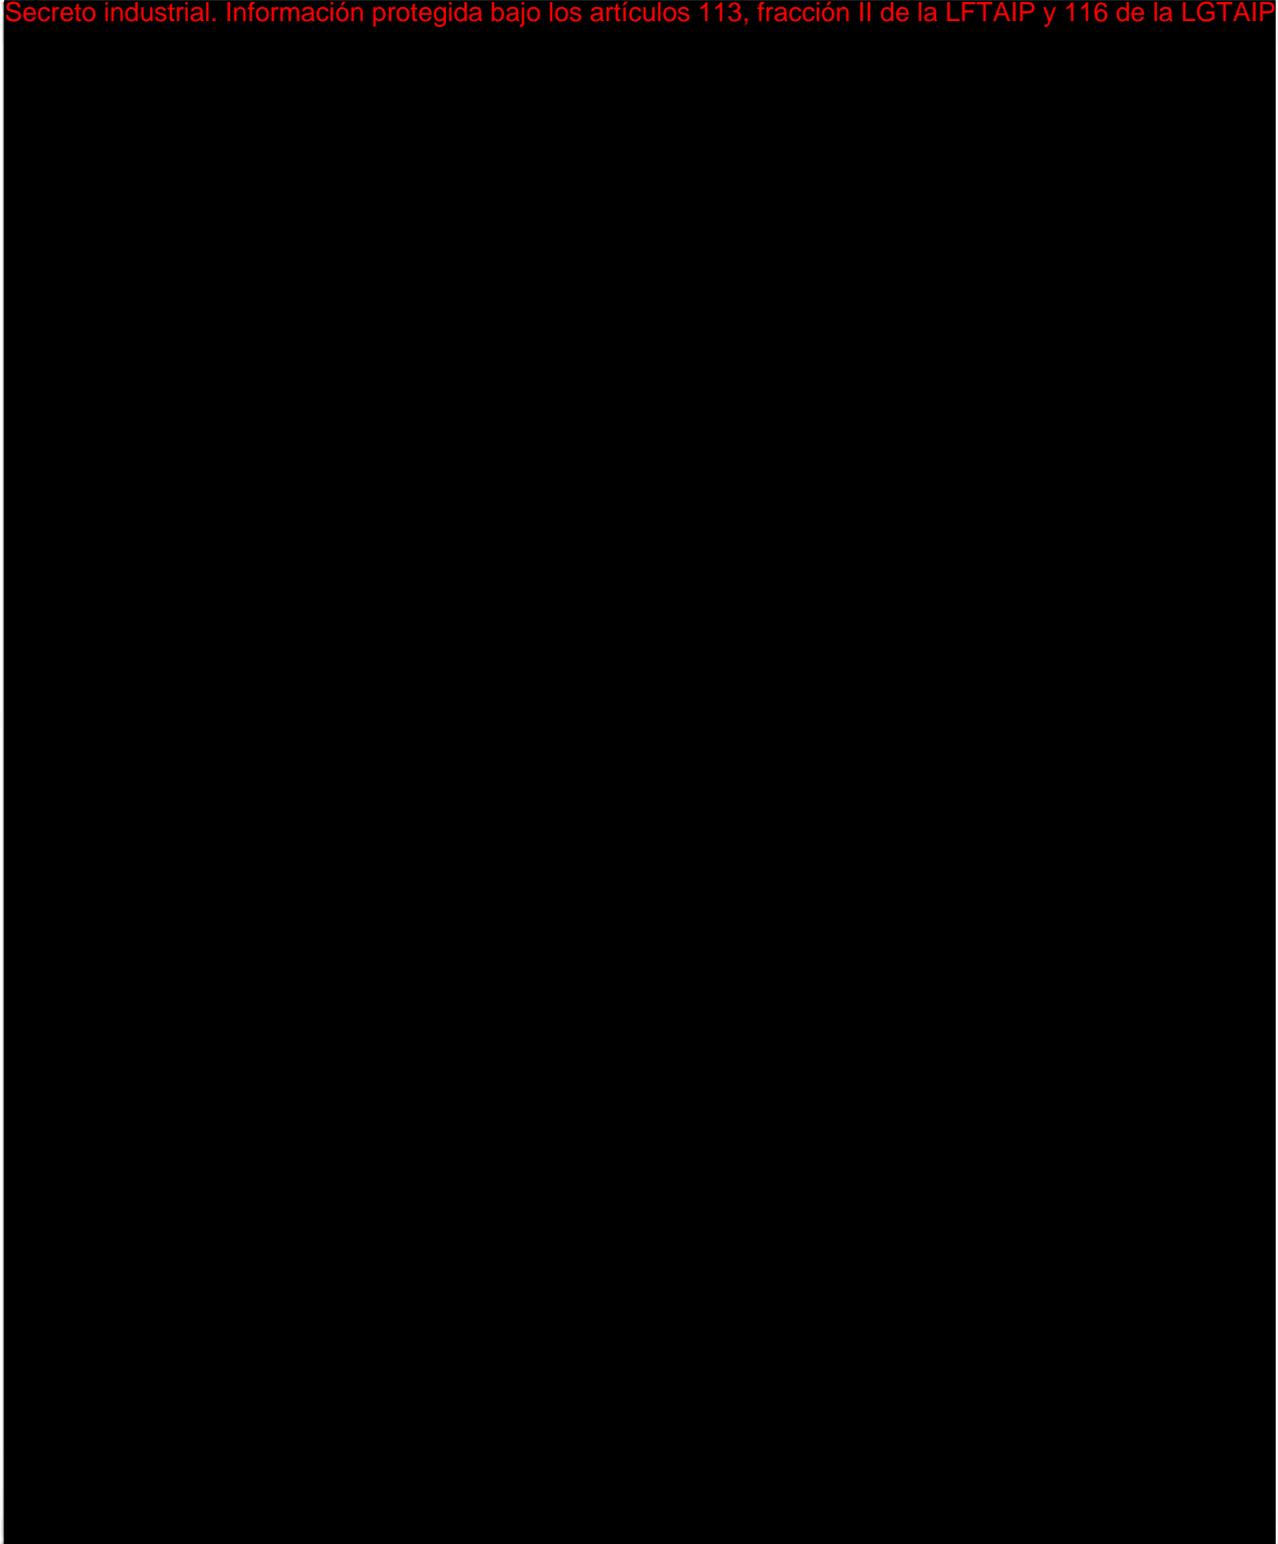

---

---

Revisión:	Fecha de elaboración	Página:	No. de Procedimiento
-----------	----------------------	---------	----------------------

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

